

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES ET EXCRETA



BURKINA FASO
Unité-Progrès-Justice

DECEMBRE 2023

RAPPORT BILAN

PROGRAMME NATIONAL
D'ASSAINISSEMENT DES
EAUX USÉES ET EXCRETA
(PN-AEUE)

PRODUIT PAR :
DGAEUE



+226 25 32 42 07



environnement.gov.bf



dga.meabf@gmail.com

SOMMAIRE

RESUME EXECUTIF	11
1 INTRODUCTION	14
2 METHODOLOGIE	14
3 PRESENTATION DU PN-AEUE	16
3.1 Objectifs	16
3.2 Rappel des points clés de la session à mi-parcours de 2023	16
3.3 Etat de mise en œuvre des recommandations de la session précédente	17
4 BILAN ANNUEL DES REALISATIONS PHYSIQUES DE 2023	18
4.1 Objectif opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	18
Produit 1.1.2 : La Défécation à l'Air Libre est abandonnée dans les villages	18
Produit 1.1.3 : La population en milieu rural adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement	23
a) Formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les institutions et ménages	23
b) Sensibilisation de masse	25
c) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)	26
d) Sensibilisation/communication de masse : PHA dans les écoles et centres de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint	29
4.2 Objectif Opérationnel 2 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain	33
4.2.1. Action 2.1 : Éradication de la Défécation à l'Air Libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain	33
Produit : 2.1.1 : La Défécation à l'Air Libre est abandonnée dans les secteurs urbains	33
Produit 2.1.2 : La population en milieu urbain adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.	36
a) Formation et coordination	36
b) Sensibilisation de masse	37
c) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)	38
d) Sensibilisation de proximité : PHA dans les écoles et centres de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint	39
4.3 Objectif Opérationnel 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu rural conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)	40
Produit 3.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur.	40
Produit 3.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	47
Produit 3.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu rural	55
4.4 Objectif Opérationnel 4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu urbain conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)	60

4.4.1. Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement	60
Produit 4.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	60
Produit 4.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	62
Produit 4.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu urbain	66
Produit 4.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	70
Produit 4.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu urbain	73
4.5 Objectif Opérationnel 5 : Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	74
4.5.1 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	74
Produit 5.1.1 : La chaîne de valeur de l'assainissement est structurée et développée	74
Produit 5.1.2 : Le développement du service de l'assainissement collectif et semi-collectif est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	77
Produit 5.1.3 : Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal	79
4.6 Objectif Opérationnel 6 : Améliorer les connaissances dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta	79
4.6.1 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta	79
Produit 6.1.1 : La recherche orientée et appliquée à l'assainissement est promue à travers des thématiques pertinentes	79
Produit 6.1.2 : Les produits de la recherche améliorent les technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et excréta	79
Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et les comportements en matière d'assainissement	79
Au cours de l'année 2023, on note, dans la région du sahel, la poursuite des activités de mise en œuvre de l'ATPC en situation d'urgence dans les périphéries de la ville de Dori par deux acteurs sous le financement de l'UNICEF, et de la commune de Arbinda par SERACOM. Aussi l'approche ATPE qui sera réalisée dans les écoles de Dori et de Gorom-Gorom est en perspective.	
4.7 Objectif Opérationnel 7 : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.	79
4.7.1 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	80
Produit 7.1.1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées	80
Produit 7.1.3 : Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages	82
Produit 7.1.4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance	83
Produit 7.1.5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance	86

5	BILAN FINANCIER	92
5.1	Action 1.1 : Éradication de la Défécation à l'Air Libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	92
5.2	Action 2.1 : Éradication de la Défécation à l'Air Libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain	95
5.3	Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement	96
5.4	Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement	110
5.5	Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	114
5.6	Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta	115
5.7	Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	116
6	SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES	118
7	analyse des performances et evolution des indicateurs	122
7.1	Assainissement en milieu rural	122
7.2	Assainissement en milieu urbain	132
7.3	Assainissement national	134
7.4	Situation des indicateurs de performance du PN-AEUE	135
8	PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS	137
8.1	Principaux freins	137
9	RECOMMANDATIONS	139
10	CONCLUSION	140
	ANNEXES	141

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Récapitulatif des résultats au 30 juin 2023	16
Tableau 2 : Mise en œuvre des recommandations	17
Tableau 3 : Récapitulatif des taux d'exécution physiques et financiers par action	18
Tableau 4 : situation de l'ATPC dans les villages	19
Tableau 5 : Evaluation de la mise en œuvre de l'ATPC	21
Tableau 6 : formation, ciblage et coordination sur l'ATPC	22
Tableau 7 : Formation et coordination	23
Tableau 8 : Activités de sensibilisations de masse	25
Tableau 9 : Sensibilisation dans les ménages	26
Tableau 10 : Sensibilisation de proximité dans les institutions : évaluation	29
Tableau 11 : Sensibilisation/communication de masse : synthèse des institutions.	30
Tableau 12 : Activités de fin de Défécation à l'Air Libre en milieu urbain	34
Tableau 13 : Formation et vulgarisation de la stratégie FDAL	35
Tableau 14 : Formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans institutions et ménages	36
Tableau 15 : Activités de sensibilisations de masse	37
Tableau 16 : Sensibilisation dans les ménages	38
Tableau 17 : Sensibilisation/communication de masse dans les institutions	39
Tableau 18 : Opérations pré-réalisation de latrines familiales	41
Tableau 19 : Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu rural	42
Tableau 20 : Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural	43
Tableau 21 : Situation des latrines semi-finies	44
Tableau 22 : Situation de réalisations et de réhabilitations latrines familiales	45
Tableau 23 : Situation de réalisation de puisards et de fosses septiques	46
Tableau 24 : opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques	47
Tableau 25 : Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines dans les écoles et centres de formation	48
Tableau 26 : Situation des réalisations et réhabilitations des latrines dans les écoles	50
Tableau 27 : Situation physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé	51
Tableau 28 : Situation des réalisations et réhabilitations physiques des latrines dans les lieux publics	53
Tableau 29 : Situation des réalisations des ouvrages d'AEUE dans les ménages à cause des PDI	54
Tableau 30 : Situation des réalisations des latrines dans les sites d'accueil des PDI	54
Tableau 31 : Formation et suivi	56
Tableau 32 : latrines suivies dans le cadre de leur gestion	57
Tableau 33 : Actions menées dans le cadre de l'intercommunalité	59
Tableau 34 : Opérations pré-réalisation de latrines familiales	60
Tableau 35 : Réalisations de latrines familiales en milieu urbain	61
Tableau 36 : Opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques	62
Tableau 37 : Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles et centres de formation	63
Tableau 38 : Réalisations de latrines dans les centres de santé	64
Tableau 39 : Réalisations de latrines dans les lieux publics	65
Tableau 40 : Réalisations de latrines familiales en milieu urbain	67
Tableau 41 : Réalisations de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu urbain	69
Tableau 42 : Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles et centres de formation	70
Tableau 43 : Réalisations de latrines dans les lieux publics et centres de santé	72
Tableau 44 : Actions menées dans le cadre de l'intercommunalité	73
Tableau 45 : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges	75

Tableau 46 : Développement du service d'assainissement collectif et semi-collectif	77
Tableau 47 : Extension du réseau collectif	78
Tableau 48 : Sanithons et nuits de l'assainissement	80
Tableau 49 : Ressources financières mobilisées	81
Tableau 50 : Efforts des ménages	82
Tableau 51 : Exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural	83
Tableau 52 : Situation de l'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu urbain par l'ONEA	84
Tableau 53 : Voyages d'études et partage d'expérience réalisés	86
Tableau 54 : Autres formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur	87
Tableau 55 : Cadres de concertation communale	90
Tableau 56 : Taux d'exécution financier des activités d'éradication de la DAL en milieu rural (produit1+2)	92
Tableau 57 : Taux d'exécution financier des activités de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural (produit3)	93
Tableau 58 : Taux d'exécution financier global de l'Action 1	94
Tableau 59 : Taux d'exécution financier de l'Action 2	95
Tableau 60 : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblés, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 en milieu rural (en millions de FCFA)	96
Tableau 61 : Situation de l'exécution financier des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)	97
Tableau 62 : Situation financière de la réalisation des puisards et fosses septiques	99
Tableau 63 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles	100
Tableau 64 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les centres de santé	102
Tableau 65 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les lieux publics	104
Tableau 66 : Taux d'exécution financier des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines, puisards et fosses septique)	106
Tableau 67 : Situation de l'exécution financière du produits 3 (en millions de FCFA)	108
Tableau 68 : Taux d'exécution financier de l'action 3	109
Tableau 69 : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblés, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 (en millions de FCFA)	110
Tableau 70 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales (réalisations et réhabilitations), puisards et fosses septiques	111
Tableau 71 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles, centre de santé et lieux publics en milieu urbain	112
Tableau 72 : Exécutions financières de l'action 4	113
Tableau 73 : Exécutions financières de l'action 5	114
Tableau 74 : Exécution financière des actions de la recherche	115
Tableau 75 : Exécution financière de l'action	116
Tableau 76 : Exécution financière globale du PN-AEUE	117
Tableau 77 : Suivi des procédures de dévolution des marchés publics : mode de passation des marchés	118
Tableau 78 : Evolution du taux d'accès à l'assainissement familial en milieu rural par région	123
Tableau 79 : Proportion des latrines par acteur	127
Tableau 80 : Situation de l'état de Fin de Défécation à l'Air Libre	128
Tableau 81 : Taux d'équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural	129
Tableau 82 : Situation de l'accessibilité des latrines aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)	130
Tableau 83 : synthèse des réalisations en milieu rural	131
Tableau 84 : Taux d'accès 2023 par région en milieu urbain	132
Tableau 85 : Récapitulatif des réalisations physiques en assainissement en milieu urbain	133
Tableau 86 : Récapitulatif des réalisations sur le plan national	134

Tableau 87 : Indicateurs de performance du PN-AEUE	135
Tableau 88 : Difficultés et propositions de solutions	137
Tableau 89 : Evolution du taux d'accès par province	141
Tableau 90: liste indicative des structures intervenants dans la mise en œuvre du PN-AEUE	144

LISTES DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS

Figure 1 : Taux d'accès à l'assainissement familial en 2023 par région	122
Figure 2 : évolution du taux d'accès et population additionnelle desservie	123
Figure 3 : Situation de disponibilité de dispositif de lavage des mains (DLM)	124
Figure 4 : Situation de la pratique de lavage des mains par les ménages	125
Figure 5 : situation de l'entretien des latrines dans les ménages	126
Figure 6: Evolution du taux d'accès en milieu urbain	133
Figure 7: Taux globaux de l'assainissement	134
Figure 8: Evolution du taux d'accès national	135

SIGLES ET ABREVIATIONS

ABS	: Appui Budgétaire Sectoriel
ACF	: Association Chant de Femme
ADAE	: Association pour le Développement des Adductions d'Eau
AEP	: Approvisionnement en Eau Potable
AEPA	: Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
AEPHA	: Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement
AEUE	: Assainissement des Eaux Usées et Excreta
AFDH	: Approche Fondée sur les Droits Humains
AMOC	: Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communale
ATPC	: Assainissement Total Piloté par la Communauté
ATPL	: Assainissement Total Porté par les Leaders
ASBC	: Agents de Santé à Base Communautaire
BD	: Base de Données
BPO	: Budget Programme par Objectifs
CADEPAC	: Cellule d'Appui à la Décentralisation et à la Participation Citoyenne
CAP	: Connaissances Attitudes et Pratiques
CCEA	: Cadre de Concertation sur l'Eau et l'Assainissement
CMP	: Cadre de Mesure de Performance
CNP	: Comité National de Pilotage
CRP	: Comité Régional de Pilotage
CSPS	: Centre de Santé et de Promotion Sociale
CSD	: Cadre Sectoriel de Dialogue
CUCA	: Cadre Unifié de Coordination de l'Assainissement
CUI	: Cadre Unifié d'Intervention
DAL	: Défécation à l'Air Libre
DAO	: Dossier d'Appel d'Offres
DGAUE	: Direction Générale de l'Assainissement
DGESS	: Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectoriels
DGEP	: Direction Générale de l'Eau Potable
DISE	: Dispositif Intégré de Suivi Evaluation
DPEA	: Direction Provinciale de l'Eau et de l'Assainissement
DREA	: Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement
ENA	: Enquête Nationale sur l'accès des ménages aux ouvrages d'Assainissement familiale
ECOSAN	: Ecological Sanitation (Assainissement Ecologique)
FDAL	: Fin de la Défécation à l'Air Libre
GBV	: Gestion des Boues de Vidange
GEIS	: Groupe Eau et Ingénierie Sociale
GTEA	: Groupe Thématique Eau et Assainissement
IEC	: Information-Education-Communication
IMS	: Intermediation Sociale
INOA	: Inventaire National des Ouvrages d'Assainissement en milieu rural
INSD	: Institut National de la Statistique et de la Démographie
LSF	: Latrines Semi Finies
MEA	: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement
MOC	: Maitrise d'Ouvrage Communal
OCADES	: Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité
ODD	: Objectifs du Développement Durable

OMD	: Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONEA	: Office National de l'Eau et de l'Assainissement
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
PCD-AEPA	: Plan Communal de Développement Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
PEA/GIZ	: Programme Eau et Assainissement de la Coopération Internationale Allemande
PGEA	: Programme Gouvernance Eau et Assainissement
PHA	: Promotion de l'Hygiène et de l'Assainissement
PHA-BID-UEMOA	: Programme d'Hydraulique et Assainissement financement BID-UEMOA
PN-AEPA	: Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement
PN-AEUE	: Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta
PNDES	: Plan National de Développement Economique et Sociale
PNGT	: Programme National de Gestion des Terroirs
PPS	: Programme Pilotage et Soutien
PTF	: Partenaire Technique et Financier
RGPH	: Recensement Général de la Population et de l'Habitat
SAMOC	: Service Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communal
SNE	: Stratégie Nationale de l'Eau
STEP	: Station d'Epuration
STBV	: Station de Traitement des Boues de Vidange
TCM	: Toilette à Chasse Manuelle
TIC	: Technologie de l'Information et de la Communication
UNICEF	: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
VIP	: Ventilated Improved Pit (Latrines Améliorées à fosses ventilées)
WHH	: Welt Hunger Hilfe

Au 31 décembre 2023, le bilan d'exécution des activités du Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta (PN-AEUE) se résume ainsi qu'il suit :

1. BILAN PHYSIQUE

Dans l'ensemble, le taux d'exécution physique global du programme au 31 décembre 2023 est de **57,7%**. Ces efforts supplémentaires de 2023, ont permis d'augmenter le taux d'accès global à l'assainissement qui est passé de **27,5% à 28%** soit un pas **progressif de 0,5%**. Ce résultat a pu voir le jour grâce à la contribution du milieu rural qui a fait passer le taux d'accès en milieu rural de **21,9% à 22,7%** **soit un pas significatif et progressif de 0,8 points pourcentage**. Le milieu urbain a contribué à réduire à la baisse le taux global car le taux d'accès en milieu urbain est passé de 40,8% à 40,5% **soit un pas régressif de 0,3 points pourcentage**.

Les détails par action se présentent comme suit :

❖ **Action 1 : Eradication de la Défécation à l'Air Libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural**

Pour l'année 2023, 198 villages ont été déclenchés, 178 villages déclarés FDAL et 82 villages ont été certifiés.

Au total 3 381 villages ont été déclenchés depuis la mise en œuvre de l'ATPC dont 992 déclarés FDAL et 517 certifiés FDAL. Ce qui permet d'obtenir un taux de certification de 5,8% et un taux de déclaration FDAL de 11,1%.

En ce qui concerne les sensibilisations de masse, 416 émissions sur divers thèmes de l'hygiène et de l'assainissement ont été réalisées sur le territoire national. Concernant les sensibilisations de proximité dans les ménages, les lieux institutionnels et publics, **439 929** personnes ont été touchées dont **214 824 femmes touchés soit un taux 48,8%** de femmes et filles.

Pour cette action, le taux d'exécution physique est de 69,0% et le taux d'exécution financier de 90,5%.

❖ **Action 2 : Eradication de la Défécation à l'Air Libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain**

Les activités menées au titre de cette action se résument essentiellement à la formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les institutions et ménages, des activités de sensibilisation de masse (3 émissions) et a des sensibilisations/communications de masse dans les institutions qui ont permis de toucher 19 945 personnes dont 8 560 femmes.

En somme le taux d'exécution physique de cette action est estimé à 69,5% pour un taux d'exécution financière de 100%.

❖ **Action 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural**

Le bilan des réalisations se présente comme suit :

- 22 104 latrines familiales finies ont réalisées au cours de l'année 2023 avec 21 758 nouvelles réalisations et 346 réhabilitations.

- de manière globale, 16 338 nouvelles latrines (y compris les semi-finies ont été réalisées) sur une programmation de 33 661 soit un taux de réalisation de 48,5%. Cependant, 10 363 autres ont été réalisées en hors-programmation, ce qui donne un total annuel de 26 701 latrines ;
- 346 latrines familiales réhabilitées dont 05 issues de la programmation soit un taux de réalisation de 4,7% ;
-
- 1783 puisards réalisés dont 109 issus d'une programmation de 551 soit un taux d'exécution de 19,8% ;
- 1 100 latrines institutionnelles et publiques dont 437 issues d'une programmation de 884 latrines soit un taux d'exécution de 49,4%. De plus, 58 latrines institutionnelles et publiques ont été réhabilitées, ce qui donne un total de 1158.
-

Ces réalisations ont permis d'obtenir un taux d'exécution physique de 52,7 % et un taux d'exécution financière de 40,6%.

❖ **Action 4 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain**

Le bilan des réalisations se présente comme suit :

- 7 063 latrines familiales sur une programmation de 26000 soit un taux de réalisation de 27,2%;
- 4277 puisards domestiques sur une programmation de 18 200, soit un taux de réalisation de 23,5% ;
- 162 latrines institutionnelles et publiques sur une programmation de 367, soit un taux de 44,1%.

Ces réalisations ont permis d'aboutir à un taux d'exécution physique de l'action 4 de 41,9% avec un taux d'exécution financier de 24,1%.

❖ **Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale**

L'identification et l'organisation des vidangeurs ont été les principales activités menées par les acteurs. Ainsi 385 vidangeurs manuels et 13 nouveaux vidangeurs mécaniques ont été identifiés dans les régions du Centre, du Centre-Sud et des Hauts-Bassins. Aussi, le concept de la Filière de l'Assainissement Autonome élaboré est en cours de validation et permettra à l'ONEA de disposer d'un document de gestion précisant les normes techniques et opérationnelles pour la mise en œuvre de la chaîne de valeurs de l'assainissement autonome.

Les stations de traitement des boues de vidange dans les villes de Ouaga et de Bobo-Dioulasso ont permis de collecter et traiter **501 043 m³** de boues de vidange contre **407 122** en 2022 soit une hausse de 23%.

Le taux d'exécution physique de l'action 5 est de 44,2% avec un taux d'exécution financier de 4,6%.

❖ **Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excreta**

Dans le cadre du développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excreta un rapport d'étude sur la caractérisation des boues traitées au niveau des STBV est en attente de validation. Cependant, les résultats de l'étude sont disponibles et le produit a été testé sur deux spéculations (coton et maïs) sur des sites pilotes et les résultats sont satisfaisants.

Le taux d'exécution financier de cette action est estimé à 80%.

❖ **Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur**

La situation des ressources mobilisées est la suivante :

- 843,474 millions ont été transférés à 29 communes pour la promotion de l'assainissement en milieu rural.
- Les rapports (annuels, semestriels, trimestriels) de mise en œuvre du programme ont été élaborés et validés à travers les différents cadres de concertation.

Le taux d'exécution physique de cette action est de 74,1% avec un taux financier est de 63,8%.

2. BILAN FINANCIER

Le taux d'exécution financier base liquidation du PN-AEUE au 31 décembre 2023 est de 38,4 % soit 5 853,45 millions de FCFA liquidés sur 15 244,36 millions de FCFA programmés. En rappel, le taux d'exécution base engagement est de 53,9% soit 8 217,58 millions de FCFA engagés.

1 INTRODUCTION

Le Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta (PN-AEUE) adopté par Arrêté ministériel n° 2017-041/MEA/CAB du 23 mars 2017 constitue le cadre programmatique de toutes les interventions en matière d'assainissement des eaux usées et excreta à l'horizon 2030 au Burkina Faso. L'objectif stratégique du PN-AEUE est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excreta. Il comporte sept (07) actions réparties sur cinq (05) axes. La mise en œuvre du programme est assurée par plusieurs acteurs : les structures étatiques telles que sont : le Ministère l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement (MEEA), le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (MSHP), le Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), le Ministère de l'Urbanisme, des Affaires Foncières et de l'Habitat (MUAFH), le Ministère de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS), l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les associations et ONG, le secteur privé. Le pilotage et la coordination sont assurés par la Direction Générale de l'Assainissement des eaux usées et excreta (DGAEUE). Le programme est évalué par des sessions de dialogue de gestion et supervisé par un Groupe thématique national (GTN) et le Cadre Sectoriel de Dialogue des Programmes de la Politique Sectorielle Environnement, Eau et Assainissement.

Le présent rapport fait le bilan de la mise en œuvre du PN-AEUE au 31 décembre de l'année 2023. Il fait ressortir des informations relatives à l'avancement de la mise en œuvre des activités sur les investissements structurants tels que définis dans le Plan Opérationnel 2016-2025 élaboré en cohérence avec le PNDES. Il est établi sur la base des rapports-bilans annuels des Directions Régionales de l'eau et de l'Assainissement (DREA), de la DGAEUE, du rapport de programmation physique et financière révisée 2023 et du Budget Programme du MEEA.

2 METHODOLOGIE

Le rapport bilan annuel du PN-AEUE est le fruit de la synthèse des activités menées par les différents acteurs dans le domaine de l'assainissement durant l'année en cours. Son élaboration s'appuie sur une approche méthodologique qui peut être décomposée en étapes successives :

- la révision des canevas des rapports bilans régionaux et leur transmission aux directions régionales de l'eau et de l'assainissement pour remplissage ;
- la centralisation des rapports bilans régionaux validés par les Groupes Thématiques Régionaux (GTR) ;
- la synthèse, le traitement et l'analyse des rapports bilan régionaux du PN-AEUE;
- la rédaction de la version provisoire du rapport bilan national annuel ;
- la relecture du rapport provisoire pour son assurance-qualité avant sa transmission aux membres du comité de revue.

Les échéances des différentes étapes sont fonction de la feuille de route pour l'organisation des travaux et la tenue des cadres de concertation et de pilotage du sous-secteur Eau et Assainissement, élaborée par la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) sur la période considérée.

Spécifiquement pour le calcul des différents taux physiques, la méthode du Taux Global de Réalisation des Objectifs (TGRO) du Ministère en charge de la Fonction Publique a été

adoptée. Elle consiste en une moyenne arithmétique des taux d'exécution physique des activités, des produits, des actions, des programmes et du sous-secteur. Le taux de réalisation annuel calculé sur la base de la programmation physique révisée permet d'apprécier le niveau d'atteinte de l'objectif annuel.

Taux de réalisation annuel (%)

✓ **Taux de réalisation physique annuel d'une activité**

$$\text{Taux de réalisation (activité)} = \frac{\text{réalisation physique annuelle}}{\text{programmation physique annuelle révisée}} \times 100$$

✓ **Taux de réalisation physique annuel de l'action/programme/sous-secteur**

$$\text{Taux de réalisation annuel (action/programme/sous – secteur)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Tx}_{\text{activité}_i}$$

Où :

n représente le nombre d'activités programmées au cours de l'année au titre de l'action/programme/sous-secteur ;

$\text{Tx}_{\text{activité}_i}$ représente le taux de réalisation annuel de l'activité i de l'action/programme/sous-secteur.

Pour l'exécution financière, la méthode suivante a été suivie :

Le taux d'exécution financière global

○ **Taux d'exécution financière d'une activité**

$$\begin{aligned} \text{Taux d'exécution financière (activité)} \\ = \frac{(\text{réalisation financière annuelle (engagé visé)})}{(\text{programmation financière annuelle révisée})} \times 100 \end{aligned}$$

○ **Taux d'exécution financière de l'action/programme/sous-secteur**

$$\begin{aligned} \text{Taux d'exécution financière (action/programme/sous – secteur)} \\ = \frac{\sum_{i=1}^n \text{réalisation financière annuelle (engagé visé)}}{\sum_{i=1}^n \text{programmation financière annuelle révisée}} \times 100 \end{aligned}$$

Avec n le nombre d'activités programmées au cours de l'année au titre de l'action/programme/sous-secteur.

Le rapport comporte deux (02) parties : la première partie traite des performances physiques annuelles des différentes actions du PN-AEUE et la seconde, des performances financières annuelles.

3 PRESENTATION DU PN-AEUE

3.1 Objectifs

L'objectif stratégique du PN-AEUE est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta. Ses objectifs spécifiques sont les suivants :

- éradiquer la Défécation à l'Air Libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement;
- assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;
- optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;
- développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta en soutien à l'amélioration de l'offre technologique et des pratiques ;
- renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

L'objectif stratégique sera atteint à travers les actions, objectifs opérationnels et résultats.

3.2 Rappel des points clés de la session à mi-parcours de 2023

Tableau 1 : Récapitulatif des résultats au 30 juin 2023

Désignation	Programmations physiques révisées au 30 juin 2023	Réalisations physiques au 30 juin 2023	Programmations financières révisées au 30 juin 2023 (en millions)	Montant engagé au 30 juin 2023 (en millions)
Latrines familiales neuves	61 272	18 149	7 309,026	3 840,452
Latrines familiales réhabilitées	107	107	7,9	3,7
Latrines écoles neuves	718	175	2 702,002	909,381
Latrines écoles réhabilitées	126	88	139,614	103,114
Latrines CSPS neuves	208	73	1 220,789	234,570
Latrines CSPS réhabilitées	53	12	32,560	9,8
Latrines publiques neuves	480	170	1 413,720	207,603
Latrines publiques réhabilitées	37	15	22,490	0,990
Puisards domestiques neufs	18 751	3 179	377,764	58,504

Source : Rapports-bilans à mi-parcours et de programmation révisée du PN-AEUE 2023

En rappel le taux d'accès national à l'assainissement au 31 décembre 2022 était de 27,5%.

3.3 Etat de mise en œuvre des recommandations de la session précédente

Tableau 2 : Mise en œuvre des recommandations

N ^o	Recommandations	Échéance	Responsable	État de mise en œuvre	Observation/comm entaire
1	Améliorer le mécanisme de collecte des données en invitant les acteurs de mise en œuvre à communiquer suffisamment avec les structures étatiques afin de fournir toutes les données provenant des activités qu'ils mettent en œuvre	Décembre 2023	MEEA	Réalisée	A travers les cadres de concertation
2	Exiger de toute ONG/association la présentation d'une convention signée avec l'Etat avant d'autoriser son intervention	Décembre 2023	MEEA	Réalisée	Tenue de la première session du cadre de concertation MEEA-ONG/AD, dénommée Journée sectorielle de concertation (JSC) le 14 décembre 2023
3	Renseigner les données financières en invitant les partenaires de mise en œuvre à communiquer les données financières provenant de leurs activités exécutées	Décembre 2023	MEEA	Réalisée	A travers les cadres de concertation
4	Organiser courant 2023 la mise en place d'un plan d'action pour l'achèvement des latrines semi-finies ;	Décembre 2023	MEEA	Réalisée	Tenue du 1 ^{er} atelier semestriel de concertation MEEA-UNICEF du 30 au 31 août 2023
5	Organiser un atelier avec les acteurs non étatiques du MEEA sur la mise en œuvre efficace de leurs activités.	Décembre 2023	MEEA	Réalisée	Tenue de la première session du cadre de concertation MEEA-ONG/AD, dénommée Journée sectorielle de concertation (JSC) le 14 décembre 2023

Tableau 3 : Récapitulatif des taux d'exécution physiques et financiers par action

Actions mises en œuvre en région	Taux d'exécution physique	Montant prévu en millions	Montant réalisé (engagé visé)	Taux d'exécution financier (engagé visé)	Montant réalisé (liquidé)	Taux d'exécution financier (liquidé)
Action 1	69,0	1 055,023	978,724	92,8	954,535	90,5
Action 2	69,5	32,558	38,588	118,5	38,588	100
Action 3	52,7	8 616,259	3 671,606	42,6	3 498,888	40,6
Action 4	41,9	4 850,089	3 292,934	67,9	1 168,993	24,1
Action 5	44,2	424,012	24,012	5,7	19,322	4,6
Action 6	-	19,000	19,000	100,0	15,200	80,0
Action 7	74,1	247,421	192,718	77,9	157,924	63,8
Total programme	57,7	15 244,361	8 217,582	53,9	5 853,450	38,4

Source : DGAEUE

Ce tableau fait le résumé de l'état d'exécution des activités du PN-AEUE au 31 décembre 2023. Au regard du tableau, on note un bilan moyen des activités d'assainissement pour l'année 2023

4.1 Objectif opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

4.1.1. Action 1.1 : Éradication de la Défécation à l'Air Libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

Produit 1.1.2 : La Défécation à l'Air Libre est abandonnée dans les villages

La mise en œuvre de l'ATPC dans les différentes régions a permis d'obtenir les résultats contenus dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 4 : situation de l'ATPC dans les villages

Régions	Nombre de villages	Villages déclenchés				Déclaration FDAL de villages				Certification de villages				Nombre de déclenchements institutionnels
		Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	
Boucle du Mouhoun	985	41	28	0	68,29	41	10	0	24,4	0	9	0	-	0
Casca des	291	0	1	0	-	13	0	0	0	0	0	0	-	13
Centre	188	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0
Centre-Est	753	10	5	0	50,00	2	1	0	50,0	0	0	0	-	0
Centre-Nord	965	65	81	16	100,00	48	15	0	31,3	45	0	0	0	2
Centre-Ouest	595	0	15	15	-	104	86	2	80,8	48	51	21	62,5	1
Centre-Sud	541	11	3	0	27,27	0	0	0	-	0	0	0	-	0
Est	846	0	25	25	-	0	21	0	-	0	21	0	-	2
Hauts-Bassins	483	4	0	0	0,00	5	0	0	0	4	0	0	0	0
Nord	914	272	20	20	0,00	272	0		0	272	0	0	0	0
Plateau	581	17	11	11	0,00	78	42	1	52,6	17	1	0	5,9	1

Régions	Nombre de villages	Villages déclenchés				Déclaration FDAL de villages				Certification de villages				Nombre de déclenchements institutionnels
		Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d) = (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d) = (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d) = (b-c)/a*100	
Central														
Sahel	701	20	0	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	-	0
Sud-Ouest	1066	4	9	5	100,00	3	3	0	100	0	0	0	-	0
Total national	8909	444	198	92	23,87	586	178	3	29,9	386	82	21	15,8	19

Source : *Rapports bilan régionaux*

La situation de l'ATPC au niveau national montre que sur les 8909 villages que compte le pays, **198** villages ont été déclenchés dont **92** en hors programmation sur une prévision de 444. On compte **178** villages déclarés FDAL avec 3 en hors programmation soit un taux de réalisation de 29,9 %. Pour la certification, 82 villages avec 21 en hors programmation ont confirmé leur statut (Certification FDAL) soit un taux de réalisation de 15,8%.

Les régions du Centre-Ouest, du Plateau Central et de l'Est enregistrent les plus grands nombres de villages déclarés FDAL avec respectivement 86, 42 et 21 villages déclarés FDAL en fin 2023. Quant à la certification FDAL, les régions du Centre-Ouest et de l'Est enregistrent plus de villages certifiés soient respectivement 51 et 21 villages.

Le bilan montre qu'un nombre important de villages est resté au stade de déclenchement ou de déclaration FDAL en fin 2023. De ce fait, il est important que des actions de suivi et de communication pour le changement de comportement soient maintenues dans ces villages jusqu'à l'aboutissement à la certification FDAL.

Au total 19 déclenchements institutionnels ont été organisés dont 13 dans la région des Cascades. Les régions du Centre-Nord et de l'Est ont tenu chacune 2 déclenchements institutionnels pendant que celles du Plateau Central et du Centre-Ouest en ont organisé 1 chacune. Ces déclenchements institutionnels sont d'une grande importance dans la prise de conscience des acteurs institutionnels et renforcent leur collaboration et engagement dans la mise en œuvre des activités planifiées dans le cadre de la FDAL.

Tableau 5: Evaluation de la mise en œuvre de l'ATPC

Régions	Nombre de villages (a)	Cumul de villages déclenchés (b)	Cumul de villages déclarés FDAL (c)	Cumul de villages certifiés FDAL (e)	Taux de déclaration FDAL (d=c/a)	Taux de certification FDAL (f=e/a)
Boucle du Mouhoun	985	313	29	10	2,9	1,0
Cascades	291	169	3	1	1,0	0,0
Centre	188	44	0	0	0,0	0,0
Centre-Est	753	556	18	4	2,4	0,5
Centre-Nord	965	308	55	8	5,7	0,8
Centre-Ouest	595	378	320	237	53,8	39,8
Centre-Sud	541	198	29	22	5,4	4,1
Est	846	498	295	176	34,9	20,8
Hauts-Bassins	483	224	0	0	0,0	0,0
Nord	914	235	67	15	7,3	1,6
Plateau Central	581	171	53	1	9,1	0,2
Sahel	701	201	115	39	16,4	5,6
Sud-Ouest	1 066	86	8	5	0,8	0,5
Total national	8 909	3 381	992	517	11,1	5,8

Source : *INO2023*

Au Burkina Faso en fin 2023, on compte 3381 villages déclenchés dont 992 déclarés FDAL, soit un taux de déclaration FDAL de 11,1%. Sur ces villages déclarés FDAL, 517 ont obtenus le statut de villages certifiés FDAL soit un taux de certification FDAL de 5,8%.

Tableau 6 : formation, ciblage et coordination sur l'ATPC

Régions	Nombre de facilitateurs formés				Nombre d'acteurs formés sur l'AFDH et les stratégies de ciblage des ménages vulnérables dans le cadre de la mise en œuvre de l'ATPC				Nombre de rencontres de coordination de l'ATPC tenues				Nombre de rapports de suivi de l'ATPC rédigés			
	Prévis ion (a)	Réalisat ion (b)	Hors- program mation (c)	Taux (d)= (b- c)/a* 100	Prévis ion (a)	Réalisat ion (b)	Hors- progr ammat ion (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0	Prévis ion (a)	Réalisat ion (b)	Hors- programm ation (c)	Taux (d)= (b- c)/a *100	Prévis ion (a)	Réalis ation (b)	Hors- programm ation (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0
Boucle du Mouhoun	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Cascades	0	0	0	-	0	0	0	-	2	2	0	100	0	0	0	-
Centre	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1	1	-	0	0	0	-
Centre-Est	5	0	0	0	4	1	0	25	2	2	0	100	4	0	0	0
Centre-Nord	66	74	24	76	0	0	0	-	2	14	12	100	17	8	0	47,1
Centre-Ouest	23	23	0	100	0	0	0	-	18	16	3	72,2	13	11	3	61,5
Centre-Sud	14	14	0	100	0	0	0	-	1	1	0	100	3	3	0	100
Est	0	20	20	-	0	30	30	-	0	20	20	-	0	18	18	-
Hauts-Bassins	24	32	8	100	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Nord	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Plateau Central	0	0	0	-	0	0	0	-	4	3	0	75	6	7	1	100
Sahel	20	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sud-Ouest	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Total national	153	163	52	72,5	4	31	30	25	29	59	36	79,3	43	47	22	58,1

Source : *Rapports bilan régionaux*

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ATPC au niveau national, 155 facilitateurs ont été formés dans 5 régions sur les 13 que compte le Pays. La Région du Centre-Nord tient la tête avec 74 facilitateurs formés en 2023. On dénombre également 31 acteurs formés sur l'AFDH et les stratégies de ciblage des ménages vulnérables dans le cadre de la mise en œuvre de l'ATPC.

59 rencontres de coordination régionales sur la mise en œuvre de l'ATPC ont été tenues. Cependant, les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts Bassins, du Nord, du Sahel et du Sud-Ouest n'ont tenu aucune rencontre de coordination sur la mise en œuvre de l'ATPC courant 2023.

Les régions du Centre-Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, de l'Est et du Plateau Central ont rédigé des rapports de **suivi de l'ATPC soit 47 au total.**

A niveau central, la DGAEUE a organisé en 2023 une rencontre de coordination sur la mise en œuvre de l'ATPC et réalisé des missions de suivi de la mise en œuvre de l'ATPC (déclenchements, suivi de villages, relances des villages, évaluations de déclaration et de certification des villages FDAL) dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Plateau central, du Centre-Ouest, du Centre-Nord et du Sud-Ouest. Des rapports de suivi par axes ont été élaborés et sont disponibles de même que le rapport global de suivi de la mise en œuvre de l'ATPC en 2023.

Produit 1.1.3 : La population en milieu rural adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement

a) Formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les institutions et ménages

Tableau 7 : Formation et coordination

Régions	Nombre d'ateliers sur les outils de sensibilisation tenus					Nombre de campagnes de communication pour le changement social et de comportement sur l'hygiène et de l'assainissement organisées		
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programme (c)	Taux (d) = (b-c) / a * 100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programme (c)	Taux (d) = (b-c) / a * 100
Boucle du Mouhoun	0	0	0	-	63	63	0	100
Cascades	1	8	7	100	0	0	0	-
Centre	1	1	0	100	0	0	0	-
Centre-Est	2	6	4	100	0	2	2	-
Centre-Nord	17	6	1	29,4	74	91	41	67,6
Centre-Ouest	2	2	0	100	4	2	0	50
Centre-Sud	1	1	0	100	0	0	0	-
Est	0	0	0	-	0	9	9	-
Hauts-Bassins	3	3	0	100	0	0	0	-
Nord	8	0	0	0	0	15	15	-

Régions	Nombre d'ateliers sur les outils de sensibilisation tenus					Nombre de campagnes de communication pour le changement social et de comportement sur l'hygiène et de l'assainissement organisées		
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c) /a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c) /a*100
Plateau Central	0	0	0	-	1	1	0	100
Sahel	0	0	0	-	7	5	0	71,4
Sud-Ouest	0	0	0	-	0	0	0	-
DGA/EUE	0	0	0	-	1	0	0	0
Total national	35	27	12	42,8	150	188	67	-

Source : Collecte de données auprès des acteurs

Dans le processus d'éradication de la Défécation à l'Air Libre, il est important que la population en milieu rural adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Cela passe par l'organisation d'activités de formation et de coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les institutions et dans les ménages.

A cet effet, en 2023, on compte au niveau national 27 ateliers tenus sur les outils de sensibilisation et 188 campagnes de communication pour le changement social et de comportement sur l'hygiène et de l'assainissement organisées.

b) Sensibilisation de masse

Tableau 8 : Activités de sensibilisations de masse

Régions	Nombre d'émissions				Thèmes abordés
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	
Boucle du Mouhoun	5	0	0	0	-
Cascades	0	55	55	-	-
Centre	64	64	0	100	La GHM
Centre-Est	35	1	0	3	<i>La GHM en milieu scolaire</i>
Centre-Nord	200	142	5	69	-
Centre-Ouest	60	58	1	95	L'hygiène et l'assainissement dans les écoles, formations sanitaires, les boutiques d'assainissement et l'ATPC
Centre-Sud	12	12	0	100	Les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement
Est	12	32	32	0	Le changement de comportement des populations en hygiène et assainissement
Hauts-Bassins	4	6	4	50	La Nécessité de disposer d'une latrine hygiénique
Nord	2	11	11	0	-
Plateau Central	17	19	2	100	La prévention des maladies hydriques et la GHM
Sahel	4	16	12	100	-
Sud-Ouest	0	0	0	-	-
Total national	415	416	122	70,3	

Source : Rapports-bilans régionaux

Des activités de sensibilisations de masse sont organisées sur des thématiques en lien avec la gestion hygiénique des menstrues en milieu scolaire, l'ATPC, l'hygiène et l'assainissement dans les écoles, formations sanitaires et sur les boutiques d'assainissement, le changement de comportement, la nécessité de disposer d'une latrine hygiénique et la prévention des maladies hydriques. On compte au total 416 émissions réalisées dont 122 en hors programmation, soit un taux de réalisation de 70%.

c) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)

Tableau 9 : Sensibilisation dans les ménages

Régions	Nombre de ménages touchés				Nombre de personnes touchées dans les ménages	Nombre de femmes touchées dans les ménages	Thèmes abordés
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c) /a*100			
Boucle du Mouhoun	11 610	120	120	0	1200	720	-
Cascades	0	780	780	-	8200	4800	Les bienfaits de la latrine familiale, l'entretien et l'utilisation des latrines ; le lavage des mains ; la gestion des eaux usées et excreta ; la bonne gestion du cadre de vie ; la consommation d'eau sure.
Centre	0	0	0	-	28	13	WASH
Centre-Est	322	0	0	0	0	0	-
Centre-Nord	4 861	7428	3857	100	146195	63078	L'entretien des latrines, l'hygiène de l'habitat, la Promotion et l'entretien des latrines, le WASH, le COVID, l'hygiène alimentaire et environnementale, l'utilisation des couvercles pour les latrines , le lavage des bidons, la GHM ,l'assainissement du cadre de vie sur les sites et dans les communautés hôtes, le lavage des mains , ls'hygiène corporelle et vestimentaire ; les voies de contamination et barrière ; la

Régions	Nombre de ménages touchés				Nombre de personnes touchées dans les ménages	Nombre de femmes touchées dans les ménages	Thèmes abordés
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c) /a*100			
							collecte, le transport et le stockage de l'eau ; la réalisation de tippy-tap ; l'importance, l'utilisation et l'entretien des latrines ; les Critère d'évaluation/certification ; les Réalisation/réfection des puisards; les maladies liées au péril fécal, l'ANJE, l'importance de la Fin de la Défécation à l'Air Libre ; la construction de latrines familiales.
Centre-Ouest	17 495	11 003	2 697	47,4	60 276	31 344	L'importance de l'utilisation des latrines, l'entretien des latrines, le lavage des mains au savon, l'entretien, l'hygiène et l'utilisation des latrines dans les écoles et les formations sanitaire.
Centre-Sud	0	67	67	-	2 061	1 283	Les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.
Est	12 853	11 807	2 107	67,7	47 245	32 912	Les sensibilisations pour les changements de comportement, les bonnes pratiques en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement en situation d'urgence, la gestion hygiénique des menstrues, l'hygiène des mains, l'hygiène alimentaire, la chaîne de l'eau, l'autoréalisation des latrines familiales, l'importance, l'utilisation et l'entretien des latrines

Régions	Nombre de ménages touchés				Nombre de personnes touchées dans les ménages	Nombre de femmes touchées dans les ménages	Thèmes abordés
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c) /a*100			
Hauts-Bassins	320	471	196	86	3 256	1 904	Le péril fécal ; l'importance de disposer de latrines, l'utilisation et l'entretien des latrines ; la chaîne de l'eau de boisson ; le lien entre maladie et manque d'hygiène, le lavage des mains, l'hygiène corporelle et vestimentaire, le lavage de main.
Nord	2	4 541	4 540	50	42 448	18 191	L'hygiène des mains, la gestion des excréta, la qualité et l'hygiène de l'eau, les liens entre manque d'hygiène et maladie hydrique, l'entretien des latrines, le lavage des mains, la DAL, l'hygiène corporelle.
Plateau Central	5 061	5 061	0	100	42 610	22 157	L'hygiène (corporelle, des ouvrages et concessions), la gestion et la maintenance des latrines, la bonne pratique en matière d'hygiène et d'assainissement dans les concessions.
Sahel	5 446	9 175	3 729	100	82 370	35 908	Le lavage des mains, la chaîne de l'eau potable, la Défécation sécurisée, la Voie de contamination et la gestion des selles des enfants.
Sud-Ouest	875	410	0	47	6101	2 514	La promotion de l'hygiène et de l'assainissement
Total national	58 845	50 863	18 093	55,7	439 929	214 824	

Source : Rapports-bilans régionaux

Les sensibilisations de proximité dans les ménages à travers les visites à domicile et les causeries débat, ont permis de toucher **439 929** personnes au niveau national dont **214 824** femmes. Les principaux thèmes abordés sont : les maladies liées au péril fécal, l'importance de disposer de latrines, l'utilisation et l'entretien des latrines, le lavage des mains, la gestion des eaux usées et excréta, la gestion du cadre de vie, la consommation d'eau sûre, les voies de contamination, la gestion des selles des enfants, l'autoréalisation des latrines familiales, la COVID, l'hygiène corporelle, alimentaire et environnementale, l'utilisation des couvercles pour les latrines, le lavage des bidons, la GHM, la réalisation de tippy-tap, les critères d'évaluation/certification FDAL, la réalisation/réfection des puits, l'ANJE, l'importance de la Fin de la Défécation à l'Air Libre .

d) Sensibilisation/communication de masse : PHA dans les écoles et centres de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint

Tableau 10 : Sensibilisation de proximité dans les institutions : évaluation

Régions	Nombre d'écoles touchées				Nombre de centres de santé touchés				Nombre de lieux publics			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	31	0	0	0,0	0	0	0	-	15	0	0	0
Cascades	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre	32	33	1	100,0	0	0	0	-	0	1	1	-
Centre-Est	39	0	0	0,0	5	0	0	0,0	3	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	-	0	0	0	-	20	0	0	0
Centre-Ouest	247	159	0	64,4	31	10	0	32,3	0	0	0	-
Centre-Sud	10	36	26	100,0	0	0	0	-	35	35	0	100
Est	27	12	0	44,4	28	0	0	0,0	377	7	7	0
Hauts-Bassins	9	9	0	100,0	0	0	0	-	1	0	0	0
Nord	0	114	114	-	0	0	0	-	2	49	49	0
Plateau Central	64	64	0	100,0	26	26	0	100,0	14	14	0	100

Sahel	42	40	0	95,2	8	2	0	25,0	2	2	0	100
Sud-Ouest	48	6	0	12,5	0	0	0	-	20	0	0	0
Total national	549	473	141	60,5	98	38	0	38,8	489	108	57	10

Source : *Collecte de données auprès des acteurs*

En 2023, des activités de sensibilisation/communication de masse ont été menées dans les écoles, centres de santé, et espaces publics au profit de groupes restreints en milieu rural. Au total, 473 écoles, 38 centres de santé et 108 espaces publics ont été touchés.

Tableau 11: Sensibilisation/communication de masse : synthèse des institutions.

Régions	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (a)	Nombre d'élèves filles touchés (a1)	Nombre de centres de santé touchés	Nombre de personnes touchées dans les centres de santé (b)	Nombre de femmes touchées dans les centres de santé (b1)	Nombre de lieux publics (marché, gares, lieux de cultes, etc)	Nombre de personnes touchées dans les lieux publics (c)	Nombre de femmes touchées dans les lieux publics (c1)	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)	Thèmes abordés
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Centre	33	15636	8 165	0	0	0	1	0	0	15636	8165	—
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Centre-Ouest	159	18849	9960	10	5000	2600	0	-	-	23849	12560	—
Centre-Sud	36	5161	2714	0	0	0	35	3649	1347	5810	2694	—
Est	12	4812	2370	0	0	0	7	2550	1575	7362	3945	La promotion de l'hygiène et de l'assainissement, la gestion hygiénique des menstrues, l'hygiène alimentaire, corporelle et vestimentaire

												la bonne utilisation et l'entretien des latrines, le lavage des mains.
Hauts-Bassins	9	2105	1065	0	0	0	0	0	0	2105	1065	Le lien entre maladie et manque d'hygiène, le lavage des mains, l'hygiène corporelle et vestimentaire, l'utilisation et l'entretien des latrines, la sensibilisation sur la chaîne de l'eau.
Nord	114	15 959	10 272	0	0	0	49	13 938	9 386	29 897	19 658	Le lavage des mains, l'hygiène en milieu scolaire, l'hygiène du cadre de vie, l'entretien des points d'eau, l'entretien des latrines.
Plateau Central	64	13 132	7 200	26	-	-	14	-	-	13 132	7 200	Suivi de l'entretien et de la maintenance des ouvrages d'assainissement

												nt institutionnels et publics
Sahel	40	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	—
Sud- Ouest	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Total national	473	75 654	41 746	38	5 000	2 600	108	20 137	2 922	97 791	55 287	—

Source : *Rapports-bilans régionaux*

La promotion de l'hygiène et l'assainissement dans les institutions au niveau national a permis de toucher **473** écoles. Ces interventions ont pu toucher **75 654** élèves dont **41 746** élèves filles.

Ces activités ont été menées également dans **38** centres de santé et ont permis de toucher **5 000** personnes dont **2 600** femmes.

Dans les **108** lieux publics (marchés, gares, lieux de cultes, etc.) touchés, **20 137** personnes ont été sensibilisées dont **2 922** femmes.

Le nombre total de personnes touchées dans ces lieux institutions est estimé à **97 791** personnes dont **55 287** femmes.

Les thèmes abordés portent essentiellement sur la promotion de l'hygiène et de l'assainissement, la gestion hygiénique des menstrues, l'hygiène alimentaire, corporelle et vestimentaire, la bonne utilisation et entretien des latrines, le lavage des mains, le lien entre maladies et manque d'hygiène, la chaine de l'eau, l'hygiène du cadre de vie, l'entretien des points d'eau, le suivi, l'entretien et la maintenance des ouvrages d'assainissement institutionnels et publics.

4.2 Objectif Opérationnel 2 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

4.2.1. Action 2.1 : Éradication de la Défécation à l'Air Libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

Produit : 2.1.1 : La Défécation à l'Air Libre est abandonnée dans les secteurs urbains

Tableau 12 : Activités de fin de Défécation à l’Air Libre en milieu urbain

Régions	Nombre de secteurs	Nombre annuel de secteurs à déclencher	Nombre annuel de secteurs déclenchés	Taux de réalisation annuel de déclenchement	Nombre annuel de secteurs à déclarer FDAL	Nombre annuel de secteurs déclarés FDAL	Taux de réalisation annuel de déclaration FDAL	Nombre annuel de secteurs à certifier	Nombre annuel de secteurs certifiés	Taux de réalisation annuel de certification	Nombre de déclenchements institutionnels
Boucle du Mouhoun	37										
Cascades	29										
Centre	55										
Centre-Est	33										
Centre-Nord	20										
Centre-Ouest	34										
Centre-Sud	18										
Est	32										
Hauts-Bassins	45										
Nord	34										
Plateau Central	16										
Sahel	27										
Sud-Ouest	27										
Total national	407										

Source : *Rapports-bilans régionaux*

Tableau 13 : Formation et vulgarisation de la stratégie FDAL

Structures	Formation sur la mise en œuvre de la stratégie FDAL			Séances de vulgarisation de la stratégie FDAL
	Intitulés	Total participants	Participants femmes	Nombre
Boucle du Mouhoun				
Cascades				
Centre				
Centre-Est				
Centre-Nord				
Centre-Ouest				
Centre-Sud				
Est				
Hauts-Bassins				
Nord				
Plateau Central				
Sahel				
Sud-Ouest				
Total national				

Source : *Rapports-bilans régionaux*

Produit 2.1.2 : La population en milieu urbain adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.

a) Formation et coordination

Tableau 14 : Formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans institutions et ménages

Régions	Nombre d'ateliers sur les outils de sensibilisation tenus	Nombre de campagne de communication pour le changement social et de comportement sur l'hygiène et de l'assainissement organisées
Boucle du Mouhoun	0	0
Cascades	0	0
Centre	2	1
Centre-Est	0	0
Centre-Nord	0	0
Centre-Ouest	0	0
Centre-Sud	0	0
Est	0	0
Hauts-Bassins	0	0
Nord	0	0
Plateau Central	0	0
Sahel	0	0
Sud-Ouest	0	0
Total national	2	1

Source : *Rapports- bilans régionaux*

En 2023, en lien avec la formation et la coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les institutions et ménages en milieu urbain, la DREA du Centre a tenu 2 ateliers sur les outils de sensibilisation et organisé 1 campagne de communication pour le changement social et de comportement sur l'hygiène et de l'assainissement.

b) Sensibilisation de masse

Tableau 15: Activités de sensibilisations de masse

Régions	Nombre d'émissions	Thèmes abordés
Boucle du Mouhoun	0	-
Cascades	0	-
Centre	1	L'eau, l'hygiène et l'assainissement
Centre-Est	0	-
Centre-Nord	2	La GHM, la gestion rationnelle de l'eau, l'importance des latrines et des puisards
Centre-Ouest	0	-
Centre-Sud	0	-
Est	0	-
Hauts-Bassins	0	-
Nord	0	-
Plateau Central	0	-
Sahel	0	-
Sud-Ouest	0	-
Total national	3	

Source : *Rapports-bilans régionaux*

En termes d'activités de sensibilisation de masse, 3 émissions ont été réalisées. La région du Centre a mené une émission de sensibilisation sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. La DREA Centre-Nord a réalisé 2 émissions sur la GHM, la Gestion rationnelle de l'eau, l'importance des latrines et des puisards.

c)Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)

Tableau 16: Sensibilisation dans les ménages

Régions	Nombre de ménages touchés	Nombre de personnes touchées dans les ménages	Nombre de femmes touchées dans les ménages	Thèmes abordés
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0
Est	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0
Nord	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0
Total national	0	0	0	0

Source : Rapports-bilans régionaux

Aucune activité de sensibilisation de proximité dans les ménages (visites à domicile, causeries débat...) n'a été menée par les DREA en milieu urbain, courant 2023.

d) Sensibilisation de proximité : PHA dans les écoles et centres de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint

Tableau 17 : Sensibilisation/communication de masse dans les institutions

Régions	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (a)	Nombre d'élèves filles touchés (a1)	Nombre de centres de santé touchés	Nombre de personnes touchées dans les centres de santé (b)	Nombre de femmes touchées dans les centres de santé (b1)	Nombre de lieux publics (marchés, gares, lieux de cultes, etc)	Nombre de personnes touchées dans les lieux publics (c)	Nombre de femmes touchées dans les lieux publics (c1)	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)	Thèmes abordés
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre	ND	ND	ND	-	-	-	ND	19 945	8 560	19 945	8560	La sensibilisation communautaire sur l'hygiène et la Sensibilisation scolaire sur l'hygiène
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Centre-Nord	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lavage des mains ; utilisation et entretien des latrines

Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Total national	0	0	0	0	0	0	0	19 945	8 560	19 945	8 560	-

Source : Rapports-bilans régionaux

En termes de sensibilisation/communication de masse dans les institutions, notamment dans les lieux publics en milieu urbain, la DREA-Centre a touché **19 945** personnes dont **8 560** femmes. Ces sensibilisations ont porté sur l'hygiène en milieu communautaire et scolaire.

4.3 Objectif Opérationnel 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu rural conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)

4.3.1. Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

Produit 3.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur.

Tableau 18 : Opérations pré-réalisation de latrines familiales

Régions	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC			
			Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	0	0	54 400	2 136	-	3,9
Cascades	0	0	12 000	12 000	-	100,0
Centre	0	0	0	-	-	#DIV/0!
Centre-Est	0	0	1 200	1 200	-	100,0
Centre-Nord	0	3	0	10 000	10 000	#DIV/0!
Centre-Ouest	2	0	25 000	1 560	1 560	-
Centre-Sud	1	0	0	-	-	#DIV/0!
Est	2	2	5 500	8 503	3 003	100,0
Hauts-Bassins	0	0	372	1 437	1 065	100,0
Nord	0	0	0	2	2	#DIV/0!
Plateau Central	0	0	7 700	3 935	-	51,1
Sahel	0	0	0	1	1	#DIV/0!
Sud-Ouest	0	0	0	3 780	3 780	#DIV/0!
Total national	5	5	106 172	44 554	19 411	23,7

Source : *Rapports-bilans régionaux*

Au cours de l'année 2023, 5 études diagnostiques sur les Connaissances, Attitudes et Pratiques des populations sur l'hygiène et l'assainissement ont été menées. Aussi 5 ateliers/séances de ciblage se sont déroulés dans les régions du Centre-Nord et de l'Est par les DREA et les communes.

Aussi, des activités d'intermédiation sociale et d'Information Education Communication se sont déroulées dans le cadre de l'exécution des travaux de latrines. Ces activités d'IMS ont permis de toucher au total **44 554 personnes** dont **25 143** issues d'une programmation de **106 172** personnes soit un taux de réalisation physique de **23,7%**. Notons que les régions du Centre et du Centre-Sud n'ont fait cas d'aucune opération de pré-réalisation de latrines familiales.

Tableau 19: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu rural

Regions	Latrines						Toilettes		Total latrines		Puisards	Fosses septiques
	Latrines traditionnelles sans dalle en béton (a)	Latrines traditionnelles avec dalle en béton/Latrines SanPlat (b)	Latrines SanPlat améliorées (c)	VIP à une fosse (d)	VIP à double fosse (e)	Ecosan (f)	À chasse d'eau manuelle (g)	À chasse d'eau mécanique (h)	Homologuées (b+c+d+e+f+g+h)	tout type (a+b+c+d+e+f+g+h)		
Boucle du Mouhoun	186	339	793	715	0	0	0	0	1847	2 033	51	0
Cascades	17	105	281	118	56	0	0	0	560	577	1	0
Centre	0	546	79	315	0	0	1	0	941	941	1	0
Centre-Est	0	123	939	61	11	0	0	0	1134	1 134	215	0
Centre-Nord	1	348	320	1503	2	0	2	1	2176	2 176	582	2
Centre-Ouest	2342	3295	1147	1655	0	33	0	1	6131	8 444	3	0
Centre-Sud	1	33	857	1302	0	1	0	0	2193	2 194	48	0
Est	1	64	1949	604	8	0	0	8	2633	2634	57	0
Hauts-Bassins	5	89	482	96	1	1	0	0	669	673	5	0
Nord	3	178	1196	10	1	0	0	0	1385	1388	758	0
Plateau Central	0	656	225	158	15	51	0	0	1105	1105	11	0
Sahel	0	2	565	0	0	0	0	0	567	567	0	0
Sud-Ouest	20	172	24	208	1	0	2	10	417	437	51	17
Total national	2576	5 950	8 857	6 745	95	86	5	20	21 758	24 303	1 783	19

Source : BD INOA 2023

En 2023, l'inventaire national des ouvrages d'assainissement a permis de dénombrer **24 303** latrines tous types confondus, réalisées en milieu rural avec **21 758** ouvrages homologués, soit un taux de 89,5%. Les latrines sanplat améliorées représentent 40,7% des latrines homologuées et les latrines VIP à une fosse 31%. Cela témoigne du fait que les acteurs réalisent de plus en plus d'ouvrages homologués.

Les plus grands nombres de réalisations de latrines Sanplat améliorées s'observent dans les régions de l'Est (1949), du Nord (1196) et du Centre-Ouest (1147).

Par ailleurs **2545** latrines traditionnelles sans dalles en béton ont été réalisées par les ménages grâce à la mise en œuvre de l'ATPC. La grande part de ces réalisations s'observe dans la région du Centre-Ouest (2313). Ce résultat pourrait s'expliquer par l'engagement et la volonté des communautés à arrêter la Défécation à l'Air Libre. On note que ces réalisations ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux d'accès à l'assainissement. Par conséquent les ménages sont encouragés à réaliser des latrines homologuées.

Tableau 20 : Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural

Regions	Latrines traditionnelles avec dalle en béton/Latrines SanPlat (a)	Latrines SanPlat améliorées (b)	VIP à une fosse (c)	VIP à double fosse (d)	Ecosan (e)	à chasse d'eau manuelle (f)	à chasse d'eau mécanique (g)	Total latrines homologuées (a+b+c+d+e+f+g)
Boucle du Mouhoun	2	6	0	0	0	0	0	8
Cascades	3	1	0	0	0	0	0	4
Centre	7	1	1	0	0	0	0	9
Centre-Est	17	13	1	0	0	0	0	31
Centre-Nord	30	50	0	0	0	0	0	80
Centre-Ouest	84	2	2	0	75	0	0	163
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	14	4	0	0	0	0	0	18
Hauts-Bassins	3	0	0	0	0	0	0	3
Nord	2	8	0	0	0	0	0	10
Plateau Central	18	0	0	0	0	0	0	18
Sahel	0	1	0	0	0	0	0	1

Sud-Ouest	0	0	1	0	0	0	0	1
Total national	180	86	5	0	75	0	0	346

Source : *BD INOA 2023*

Au total **346** latrines familiales ont été réhabilitées en milieu rural essentiellement dans les régions du Centre-Ouest et du Centre-Nord. Les réhabilitations ont permis d'améliorer le niveau de service/sécurité de ces latrines.

Tableau 21 : Situation des latrines semi-finies

<i>Régions</i>	<i>Boucle du Mouhoun</i>	<i>Cascades</i>	<i>Centre</i>	<i>Centre-Est</i>	<i>Centre-Nord</i>	<i>Centre-ouest</i>	<i>Centre-Sud</i>	<i>Est</i>	<i>Hauts-Bassins</i>	<i>Nord</i>	<i>Plateau Central</i>	<i>Sahel</i>	<i>Sud-Ouest</i>	<i>Total</i>
Nombre	151	0	0	531	450	886	1401	458	0	300	391	0	375	4943

Source : *BD INOA 2023*

Au cours de l'année, **4943** latrines semi-finies ont été recensées sur le plan national. Comparativement à l'année 2022 où on avait recensé **5 016** latrines semi finies, on constate une baisse du nombre de ces latrines pour l'année 2023. Par conséquent, des efforts doivent toujours être consentis par les ménages pour l'achèvement de ces latrines.

Tableau 22 : Situation de réalisations et de réhabilitations latrines familiales

Régions	Latrines familiales					Réhabilitations				
	Program- mation révisée (a)	Réalisations				Program- mation révisée (a)	Réalisations			
		Issue de la program- - mation (b)	Hors program - mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/ a) en %		Issues de la program- - mation (b)	Hors program - mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	8 959	1998	0	1998	22,3	0	0	8	8	0
Cascades	447	157	403	560	35,1	0	0	4	4	0
Centre	195	0	941	941	0,0	0	0	9	9	0!
Centre-Est	1 046	858	807	1665	82,0	5	5	26	31	100
Centre-Nord	1 012	590	2036	2626	58,3	0	0	80	80	0
Centre-Ouest	4 427	3305	3712	7017	74,7	0	0	163	163	0
Centre-Sud	6 979	2947	647	3594	42,2	0	0	0	0	0
Est	5 312	3091	0	3091	58,2	0	0	18	18	0!
Hauts-Bassins	1 490	478	191	669	32,1	0	0	3	3	0
Nord	1 741	1025	660	1685	58,9	102	0	10	10	0
Plateau Central	820	820	676	1496	100,0	0	0	18	18	0
Sahel	505	505	62	567	100,0	0	0	1	1	0
Sud-Ouest	728	564	228	792	77,5	0	0	1	1	0
Total national	33661	16338	10363	26701	48,5	107	5	341	346	4,7

Source : BD INOA 2023

Sur une programmation révisée de **33 661** latrines familiales en 2023, les réalisations issues de la programmation se chiffrent à **16 338** latrines soit **48,5%** de taux de réalisation. Ce taux est faible par rapport à celui de 2022 qui était de 52,4%.

Aussi, **10 363** latrines ont été réalisées en hors programmation ce qui relève le nombre total des réalisations des latrines familiales à **26 701**. Comparativement au 31 décembre 2022 on note une régression du nombre de réalisation de **5 294** latrines familiales. Ce faible niveau de réalisation

est dû, d'une part, au fait que les activités du PAEA ont été suspendues depuis juillet 2022 ce qui n'a pas permis la poursuite de l'exécution de la réalisation de latrines familiales dans les 4 régions couvertes par le PAEA, et d'autre part, par le début tardif des travaux et la lenteur des entreprises dans l'exécution dans certaines régions. En plus de ces réalisations, des bénéficiaires d'ouvrages n'ont toujours pas achevé les superstructures des latrines semi-finies. L'ensemble des acteurs est donc interpellé à mettre l'accent sur les sensibilisations afin que ces ouvrages puissent être achevés et utilisés par les bénéficiaires.

Les régions du Sahel et du Plateau Central enregistrent un taux d'exécution de 100%. Les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins ont les taux d'exécution physique les plus faibles avec respectivement 22,3% et 32,1%. Ces faibles taux s'expliquent en partie par la situation sécuritaire qui a rendu difficile l'accès aux sites de réalisation et le déplacement des populations.

Quant aux réhabilitations, **346** latrines ont été réhabilitées dont seulement 5 issues de la programmation d'où le faible taux de réalisation physique qui est de 4,7%.

Tableau 23 : Situation de réalisation de puisards et de fosses septiques

Régions	Puisards					Fosses septiques				
	Program- mation révisée (a)	Réalisations				Program- mation révisée (a)	Réalisations			
		Issues de la program - mation (b)	Hors program - mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %		Issues de la program - mation (b)	Hors program - mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	51	51	0	51	100	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Centre	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	215	215	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	441	0	582	582	0	0	0	2	2	0
Centre-Ouest	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	45	45	3	48	100	0	0	0	0	0
Est	13	13	44	57	100	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	1	0	5	5	0	0	0	0	0	0

Nord	0	0	758	758	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	51	51	0	0	0	17	17	0
Total national	551	109	1674	1783	19,8	0	0	19	19	0

Source : BD INOA 2023

En matière de gestion des eaux usées, **109** puisards issus de la programmation de 551 ont été réalisés, soit un taux de réalisation de **19,8%**. Aussi, la réalisation de **1674** puisards en hors programmation a été enregistrée. Cela donne un total de **1783** puisards réalisés au cours de l'année 2023. Notons qu'aucune région n'a programmé la réalisation de fosses septiques, cependant, les régions du Centre-Nord et du Sud-Ouest en ont respectivement réalisé 2 et 17 en hors programmations.

Les efforts fournis dans la réalisation des puisards et des fosses septiques restent insuffisants par rapport aux besoins pour assurer une meilleure gestion des eaux usées. Cela interpelle les acteurs à investir davantage dans la réalisation des ouvrages de gestion des eaux usées.

Produit 3.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Tableau 24 : opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques

Régions	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC			
			Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors- programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	1	1	0	0	0	0
Cascades	3	0	0	0	0	0
Centre	0	0	400	400	0	100
Centre-Est	0	0	500	0		0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0

Régions	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC			
			Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors- programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0
Est	0	99	19 440	25 760	6 320	100
Hauts-Bassins	1	0	72	72	27	62,5
Nord	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	723	723	0	100
Total national	5	100	21 135	26 955	6 347	97,5

Source : *Rapports-bilans régionaux 2023*

En 2023, 5 études diagnostiques ont été menées et 100 ateliers/séances de ciblage tenus dans le cadre de la réalisation des latrines institutionnelles et publiques. Les séances d'ImS/IEC ont permis de toucher 26 955 personnes sur 21 135 personnes prévues. On note aussi que 6 347 personnes ont été touchées par cette activité en hors programmation. Ce niveau de mise en œuvre ne garantit pas une bonne utilisation des latrines institutionnelles et publiques. Par conséquent les acteurs doivent fournir plus d'efforts pour la mise en œuvre des activités d'ImS/IEC pour assurer une bonne durabilité des ouvrages.

Tableau 25 : Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines dans les écoles et centres de formation

Régions	Nombre total de blocs de latrines	Nombre total de blocs de latrines réservées aux filles	Nombre total de blocs de latrines réservées aux enseignants	Nombre de cabines pour gestion des menstrues	Nombre de cabines réservées aux handicapés
Boucle du Mouhoun	117	23	30	6	59
Cascades	26	7	4	11	11

Centre	43	7	4	3	8
Centre-Est	30	4	4	1	2
Centre-Nord	106	29	11	21	62
Centre-Ouest	125	28	25	13	41
Centre-Sud	43	9	12	9	17
Est	68	8	22	9	32
Hauts-Bassins	18	1	3	1	3
Nord	18	3	5	0	4
Plateau Central	46	6	6	12	3
Sahel	17	0	10	0	3
Sud-Ouest	45	5	8	0	1
Total national	702	130	144	86	246

Source : BD INOA 2023

Au cours de l'année, **702** blocs de latrines ont été réalisés au profit des écoles et des centres de formation. Les blocs réservés aux filles sont au nombre de 130 et 86 cabines ont été réservées à la gestion hygiénique des menstrues. Il faut noter que la répartition des latrines par sexe avec des plaques d'indication au niveau des écoles n'est pas souvent systématique et donc difficile à recenser par les points focaux. Sinon, les latrines sont réparties de façon équitable entre filles et garçons dans les écoles.

Ces infrastructures, adaptées aux besoins spécifiques des filles, visent à créer un environnement adéquat leur permettant de gérer les menstrues en toute intimité et en toute sécurité. Aussi, 246 cabines de latrines ont été réservées aux personnes à mobilité réduite et 144 blocs de latrines pour le personnel enseignant. Ces réalisations témoignent de la prise en compte de l'approche fondée sur les droits humains dans la planification des acteurs.

Tableau 26: Situation des réalisations et réhabilitations des latrines dans les écoles

Régions	Latrines neuves					Latrines à réhabiliter				
	Program mation	Réalizations				Program mation	Réhabilitations			
		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (d)	Total e= b+d	Taux (b/a*100)		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (d)	Total e= b+d	Taux (b/a*100)
Boucle du Mouhoun	45	2	110	112	4,4	29	5	0	5	17,2
Cascades	36	22	0	22	61,1	43	4	0	4	9,3
Centre	23	9	23	32	39,1	0	0	11	11	0
Centre-Est	34	18	11	29	52,9	1	0	1	1	0,0
Centre-Nord	32	0	104	104	0,0	0	0	2	2	0
Centre-Ouest	71	66	59	125	93,0	10	0	0	0	0
Centre-Sud	58	34	9	43	58,6	6	0	0	0	0
Est	67	66	2	68	98,5	13	0	0	0	0
Hauts-Bassins	45	9	9	18	20,0	0	0	0	0	0
Nord	24	5	13	18	20,8	0	0	0	0	0
Plateau Central	30	26	4	30	86,6	18	10	6	16	55,5
Sahel	4	2	15	17	50,0	0	0	0	0	0!
Sud-Ouest	45	18	25	43	40,0	3	0	2	2	0
Total national	514	277	384	661	53,9	123	19	22	41	15,4

Source : Rapports-bilans régionaux

Sur une programmation de **514** blocs de latrines scolaires, **277** issus de la programmation ont été réalisés, soit un taux de réalisation de **53,9%**. Le nombre d'ouvrages réalisés en hors programmation est de **384** blocs de latrines portant l'ensemble des réalisations dans les écoles à **661**. On constate que le nombre d'ouvrages réalisés en 2023 a considérablement augmenté par rapport à celui de l'année 2022 qui était de 433 blocs de latrines. Cela pourrait s'expliquer par le nombre important d'ouvrages réalisés par les projets particulièrement dans les régions du Centre-Ouest, du Centre -Nord et de la Boucle du Mouhoun.

Au titre des réhabilitations, **41** blocs de latrines sont réhabilités dont **22** en hors programmation.

L'ensemble des réalisations et des réhabilitations ont permis de mettre à la disposition des écoles **702** blocs de latrines fonctionnelles, ce qui contribuera à accroître le niveau d'équipement des établissements scolaires au Burkina Faso.

Tableau 27 : Situation physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé

Régions	Programmation révisée (a)	Réalizations				Programmation révisée (a)	Réhabilitations			
		Issues de la program - mation (b)	Hors program - mation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*b/a) en %		Issues de la program - mation (b)	Hors program - mation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	46	1	15	16	2,2	0	0	0	0	-
Cascades	17	1	0	1	5,9	35	0	0	0	0
Centre	2	2	8	10	100	0	0	0	0	-
Centre-Est	15	12	0	12	80	10	4	6	10	40,0
Centre-Nord	0	0	44	44	-	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	9	4	15	19	44,4	0	0	0	0	-
Centre-Sud	11	5	0	5	45,5	0	0	0	0	-
Est	23	23	4	27	100	0	0	0	0	-
Hauts-Bassins	21	5	15	20	23,8	0	0	0	0	-
Nord	31	20	13	33	64,5	0	0	0	0	-
Plateau Central	12	12	7	19	100	5	0	0	0	0

Régions	Programmation révisée (a)	Réalisations				Programmation révisée (a)	Réhabilitations			
		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*b/a) en %		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*b/a) en %
Sahel	1	1	4	5	100	2	0	0	0	0
Sud-Ouest	16	2	4	6	12,5	0	0	0	0	-
Total national	204	88	129	217	43,1	52	4	6	10	7,7

Source : *Rapports-bilans régionaux*

Au niveau des centres de santé, le bilan des nouvelles réalisations est de **217** blocs de latrines dont **88** issus de la programmation soit un taux de réalisation **43,1%** et **129** blocs en hors programmations. Quatre régions (Centre, Est, Plateau Central, Sahel) ont atteint un taux de réalisation de 100%. Les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et du Sud-Ouest enregistrent les plus faibles taux de réalisation avec respectivement **2,2%**, **5,9%** et **12,5%** ; cela s'expliquerait par la situation sécuritaire qui rend inaccessibles certains sites.

Concernant les réhabilitations, **10** blocs de latrines ont été réhabilités dont **04** issus de la programmation sur **52** prévus, soit un taux de **7,7%**.

Tableau 28 : Situation des réalisations et réhabilitations physiques des latrines dans les lieux publics

Régions	Programmation révisée (a)	Réalizations				Programmation révisée (a)	Réhabilitations			
		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*b/a) en %		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	47	3	4	7	6,4	0	0	0	0	-
Cascades	0	0	12	12	-	0	0	0	0	-
Centre	6	4	7	11	66,7	0	0	0	0	-
Centre-Est	8	3	19	22	37,5	1	1	3	4	100
Centre-Nord	0	0	35	35	-	15	0	2	2	0,00
Centre-Ouest	9	3	27	30	33,3	0	0	0	0	-
Centre-Sud	9	7	12	19	77,8	0	0	0	0	-
Est	17	15	0	15	88,2	0	0	0	0	-
Hauts-Bassins	8	0	5	5	0,0	21	0	0	0	0,00
Nord	9	0	7	7	0,0	0	0	0	0	-
Plateau Central	8	8	11	19	100,0	0	0	1	1	-
Sahel	27	27	6	33	100,0	0	0	0	0	-
Sud-Ouest	18	2	5	7	11,1	0	0	0	0	-
Total national	166	72	150	222	43,4	37	1	6	7	2,7

Source : *Rapports-bilans régionaux*

Dans les lieux publics (lieux de culte, gares routières, marchés, yaars, etc.), **222** blocs de latrines ont été réalisés dont **72** blocs issus de la programmation avec un taux de réalisation de **43,4%** qui est relativement faible par rapport à celui de 2022 qui était de **57,5%**.

De même, **7** blocs de latrines ont été réhabilités dans les lieux publics dont **6** blocs en hors-programmation.

BILAN DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE WASH URGENCE (GESTION DES URGENCES HUMANITAIRE)

Tableau 29 : Situation des réalisations des ouvrages d'AEUE dans les ménages à cause des PDI

Régions	Boucle du Mouhoun	Cascades	Centre	Centre-Est	Centre-Nord	Centre-Ouest	Centre-Sud	Est	Hauts-Bassins	Nord	Plateau Central	Sahel	Sud-Ouest	Total national
Latrines	100	10	106	1	1428	13	0	826	4	381	3	286	0	3158
Puisards	17	0	0	0	432	0	0	21	0	97	0	0	1	568
Fosses septiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : INO 2023, DGAEUE

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités Wash urgence (gestion des urgences humanitaire), les efforts consentis par les acteurs sur le terrain ont permis de réaliser **3158** latrines et **568** puisards dans les ménages qui accueillent des PDI. Toutefois ces réalisations demeurent insuffisantes au regard de la forte demande.

Tableau 30 : Situation des réalisations des latrines dans les sites d'accueil des PDI

Régions	Nombre total de blocs-latrines	Nombre total de cabines-latrines	Nombre de cabines-latrines pour handicapé	Nombre total de cabines-douches	Nombre de cabines-douches pour handicapé
Boucle du Mouhoun	2	12	1	0	0
Cascades	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	0
Centre-Est	100	100	0	100	0
Centre-Nord	96	1536	0	120	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0

Régions	Nombre total de blocs-latrines	Nombre total de cabines-latrines	Nombre de cabines-latrines pour handicapé	Nombre total de cabines-douches	Nombre de cabines-douches pour handicapé
Est	1	6	0	2	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0
Nord	180	207	17	62	0
Plateau Central	15	39	0	11	0
Sahel	79	130	0	63	1
Sud-Ouest	0	0	0	0	0
Total national	473	2030	18	358	1

Source : *Rapports-bilans régionaux*

Sur les sites d'accueils des PDI, **2030** cabines- latrines et **358** cabines de douches ont été réalisées au profit des PDI. En plus de ces ouvrages, **1** cabine-douche et **18** cabines-latrines ont été réalisées au profit des personnes à mobilités réduites.

Produit 3.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu rural

a) Actualisation de documents de gestion de l'assainissement

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PAEA, un guide de gestion des latrines communautaires a été élaboré et validé en 2023.

b) Formation et suivi de la gestion de l'assainissement dans les institutions

Tableau 31 : Formation et suivi

Régions	Nombre d'acteurs formés sur les modèles de contrat en matière de gestion de services d'assainissement	Nombre d'acteurs formés sur le suivi, l'entretien et la maintenance des ouvrages d'assainissement	Nombre d'acteurs formés sur les autres formations entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement	Nombre total d'acteurs formés	Nombre total de femmes formées	Nombre de centres de santé dont l'entretien et la maintenance des latrines sont confiés à un gestionnaire
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0
Centre	0	20	0	20	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	3	0	3	0	0
Centre-Ouest	0	30	0	30	0	0
Centre-Sud	0	48	56	104	0	0
Est	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0
Nord	0	15	0	15	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0
Total national	0	129	56	172	0	0

Source : *Rapports-bilans régionaux*

En 2023, les activités de formation et de suivi de la gestion des latrines se sont concentrées sur 5 régions et ont permis de former **172** acteurs. On retient que les plus grands nombres d'acteurs formés ont été enregistrés dans trois régions. Ainsi, dans la région du Centre-Sud, 104 acteurs ont été formés par l'association Wéog La Viim dans le cadre de projet PHA-3R dont **48** personnes sur le suivi, l'entretien et la maintenance des ouvrages d'assainissement et **56** sur la gestion des ouvrages d'assainissement. Le PEPA-MR a renforcé les capacités de 30 acteurs sur le suivi, l'entretien et la

maintenance des ouvrages d'assainissement dans la région du Centre-Ouest. L'ONG EDUCO a formé 15 acteurs dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement dans la région du Nord.

c) Les autres activités entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement

Aucune autre activité entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages n'a été enregistrée.

d) Suivre l'entretien et la gestion des latrines publiques

Tableau 32 : latrines suivies dans le cadre de leur gestion

Régions	Nombre de latrines confiées à un gestionnaire				Institutions abritant les latrines	Types de latrines	Mode de gestion	Acteurs responsables du suivi	Observations
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100					
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Cascades	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Centre	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Centre-Est	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Centre-Nord	50	50	0	100%	Site PDI	Semi durable	Gratuit	ACD-Mairie	Il s'agit de latrines semi durables réalisées dans les sites PDI qui se chargent de la gestion
Centre-Ouest	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Centre-Sud	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Est	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Régions	Nombre de latrines confiées à un gestionnaire				Institutions abritant les latrines	Types de latrines	Mode de gestion	Acteurs responsables du suivi	Observations
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c) /a*100					
Hauts-Bassins	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Nord	0	0	30	0	Ecole	VIP	COGES	Président COGES	-
Plateau Central	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Sahel	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Sud-Ouest	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Total national	50	50	30	100	-	-	-	-	-

Source : *Rapports-bilans régionaux*

Dans le cadre du suivi de la gestion des latrines, 1 seule région (Nord) sur 13 a programmé des activités. En termes de réalisation les régions du Centre-Nord et du Nord ont mené des activités. Ainsi dans le Centre-Nord les PDI se chargent de la gestion de 50 latrines semi durables réalisées sur leurs sites d'accueils. Aussi, l'ONG EDUCO a mis en place un système de gestion dans 30 écoles dans la région du Nord.

e) L'intercommunalité

Tableau 33 : Actions menées dans le cadre de l'intercommunalité

Régions	Nombre de campagnes d'informations	Nombre de communes accompagnées dans le cadre de la MOC	Observations
Boucle du Mouhoun	0	0	-
Cascades	0	0	-
Centre	0	0	-
Centre-Est	0	0	-
Centre-Nord	0	0	-
Centre-Ouest	0	0	-
Centre-Sud	0	0	-
Est	0	0	-
Hauts-Bassins	0	0	-
Nord	0	0	-
Plateau Central	0	0	-
Sahel	0	0	-
Sud-Ouest	0	0	-
Total national	0	0	-

Source : *Rapports-bilans régionaux*

f) Suivi de la mise en œuvre du guide ImS AEUE en milieu rural

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet PHEPA 8P, il a été réalisé la supervision de la formation des animateurs, superviseurs et agents des DPEA de les régions du plateau Central et du Centre-Ouest sur la réalisation des activités de l'intermédiation sociale relatives audit projet. Au total 23 participants ont vu leurs capacités être renforcées sur la réalisation de l'état des lieux en assainissement, la conduite des activités de sensibilisation, la promotion de l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire, la prévention de l'exploitation et des abus sexuels et sureté et sécurité des actions de développement et humanitaire.

g) Autres activités non énumérées

Dans la région de la boucle du Mouhoun, des formations ont été réalisées sur diverses thématiques. Ce sont :

- la formation de 50 filles sur la gestion hygiénique des menstrues par CRBF ;
- la formation sur la Gestion Hygiénique des Menstrues (GHM) au profit de 5 écoles par SNV dans la commune de Dédougou ;
- La formation sur ATPE au profit des services techniques déconcentrés de la région par WATER AID à Boromo ;

- La formation de 12 enseignants sur la PHA et la GHM et mise en place, formation de 10 clubs d'hygiène, organisation de campagnes de sensibilisation par INTERSOS ECHO à Nouna ;
- La formation de 20 enseignants sur la PHA et la GHM, mise en place de 6 clubs d'hygiène, organisation de campagne de sensibilisation par INTERSOS ECHO à Tougan ;
- PLAN International et la DREA Centre-Ouest ont doté 95 Ecoles du Boulkiemdé de 227 dispositifs de lavage de mains et 253 poubelles dans le cadre de la mise en œuvre des projets ATPC dans la province.

4.4 Objectif Opérationnel 4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu urbain conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)

4.4.1. Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

1) Directions régionales de l'Eau et de l'Assainissement

Produit 4.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Tableau 34 : Opérations pré-réalisation de latrines familiales

Régions	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC			
			Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d) = $\frac{(b-c)}{a} \times 100$
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0
Nord	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0

Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0
Total national	1	0	0	0	0	0

Source : *Rapports-bilans régionaux*

Pour le développement du service de l'assainissement familial en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur, 1 étude diagnostique (études CAP) a été menée par la région du Centre-Nord.

Tableau 35 : Réalisations de latrines familiales en milieu urbain

Régions	Latrines familiales réalisées				Latrines familiales réhabilitées			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100 *100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100 *100
Boucle du Mouhoun	0	0	0	-	0	0	0	-
Cascades	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre	400	450	50	100	0	0	0	-
Centre-Est	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Nord	723	1677	954	100	0	0	0	-
Centre-Ouest	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Sud	0	0	0	-	0	0	0	-
Est	0	0	0	-	0	0	0	-
Hauts-Bassins	0	0	0	-	0	0	0	-
Nord	0	0	0	-	0	0	0	-
Plateau Central	0	0	0	-	0	0	0	-
Sahel	488	0	0	0	0	0	0	-
Sud-Ouest	0	0	0	-	0	0	0	-
Total national	1 611	2 127	1 004	100	0	0	0	-

Source : *Rapports-bilans régionaux*

En milieu urbain, les régions du Centre et du Centre-Nord ont réalisé respectivement **450** et **1 677** latrines familiales, soit au total **2 127** latrines familiales réalisées. Aucune réhabilitation n'a été enregistrée

Produit 4.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Tableau 36 : Opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques

Régions	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC			
			Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0
Nord	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0
Total national	1	0	0	0	0	0

Source : *Rapports-bilans régionaux*

1 étude diagnostique (études CAP) a été réalisée par la DREA Centre-Nord en prélude aux réalisations de latrines institutionnelles et publiques en milieu urbain.

Tableau 37 : Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles et centres de formation

Régions	Réalisations						Réhabilitations					
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservées aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservées aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Cascades	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Centre	6	8	0	0	2	100	3	3	3	0	0	100
Centre-Est	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Centre-Nord	4	11	7	7	7	100	0	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Centre-Sud	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Est	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Hauts-Bassins	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Nord	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Plateau Central	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Sahel	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-

Régions	Réalizations						Réhabilitations					
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservées aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservées aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Total national	11	19	7	7	9	90,9	3	3	3	0	0	100

Source : *Rapports-bilans régionaux*

En 2023, sur les 13 régions, ce sont celles du Centre et du Centre- Nord qui ont réalisé au total 19 blocs de latrines dans les écoles et centres de formation dont 9 en hors programmation et réhabilité 3 blocs de latrines.

Tableau 38 : Réalisations de latrines dans les centres de santé

Régions	Réalizations				Réhabilitations			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	0	0	0	-	0	0	0	-
Cascades	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Nord	0	3	3	-	0	0	0	-
Centre-Ouest	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Sud	0	0	0	-	0	0	0	-
Est	0	0	0	-	0	0	0	-

Régions	Réalizations				Réhabilitations			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Hauts-Bassins	2	0	0	0	0	0	0	-
Nord	0	0	0	-	0	0	0	-
Plateau Central	0	0	0	-	0	0	0	-
Sahel	2	0	0	0	1	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	-	0	0	0	-
Total national	4	3	3	0	1	0	0	0

Source : *Rapports bilan régionaux*

En 2023, c'est la région du Centre Nord qui a réalisé 3 blocs latrines dans des centres de santé tandis que celle du sahel a réhabilité 1 bloc de latrines.

Tableau 39 : Réalisations de latrines dans les lieux publics

Régions	Réalizations				Réhabilitations			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	0	0	0	-	0	0	0	-
Cascades	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre	0	1	1	-	0	0	0	-
Centre-Est	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Nord	0	14	14	-	0	0	0	-

Régions	Réalizations				Réhabilitations			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c) /a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c) /a*100*100
Centre-Ouest	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Sud	0	0	0	-	0	0	0	-
Est	0	0	0	-	0	0	0	-
Hauts-Bassins	0	0	0	-	0	0	0	-
Nord	0	0	0	-	0	0	0	-
Plateau Central	0	0	0	-	0	0	0	-
Sahel	140	0	0	0	0	0	0	-
Sud-Ouest	0	0	0	-	0	0	0	-
Total national	140	15	15	0	0	0	0	-

Source : *Rapports-bilans régionaux*

Pour l'année 2023, la mairie centrale de Ouagadougou dans la région du Centre a réalisé 1 latrine mobile et la région du Centre-Nord 14 latrines.

Produit 4.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

a) Autres activités non énumérées

L'ONG MORIJA a fait une dotation en savon dans la région du Centre pour un coût de 330 000 FCFA.

II) ONEA

Tableau 40 : Réalisations de latrines familiales en milieu urbain

Régions	Latrines familiales réalisées				Latrines familiales réhabilitées			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	1 100	401	0	36,4				
Cascades	800	432	0	54,0				
Centre	11 200	2 126	0	19,0				
Centre-Est	1 625	484	0	29,8				
Centre-Nord	800	560	0	70,0				
Centre-Ouest	1000	666	0	66,6				
Centre-Sud	700	0	0	0,0				
Est	400	354	0	88,5				
Hauts-Bassins	6 350	1 410	0	22,2				
Nord	900	626	0	69,6				
Plateau Central	625	81	0	13,0				
Sahel	0	0	0	0,0				
Sud-Ouest	700	0	0	0,0				
Total national	26 000	7 063	0	27,2				

Source : Rapports-bilans régionaux

Les résultats annuels sont dans l'ensemble très faibles. Les régions du Centre-Sud, du sahel, et du Sud-Ouest n'ont pas enregistré de réalisation de latrines familiales. Le Plateau Central (13,0%), les Hauts Bassins (22,2%), le Centre-Est (29,8%), le Centre (19,0%) et la Boucle du Mouhoun (36,4%)

se retrouvent avec des taux de réalisation de latrines particulièrement bas. Par contre, les régions de l'Est, du Centre-Nord, du Nord, du Centre-Ouest et des cascades ont enregistré des taux de réalisations au-dessus de la moyenne avec respectivement 88,5%, 70,0%, 69,6%, 66,6% et 54,0%.

Pour l'année 2023, 7063 latrines familiales ont été réalisées sur une prévision de 26 000 attendues soit 27,2% de taux de réalisation. Cette contre-performance s'explique par :

- la suspension des activités dans les villes couvertes par le PAEA de juin 2022 à mars 2023 et de juin 2023 à Octobre 2023 ;
- l'échéance des contrats de prestataires dans 8 villes couvertes par le PAEA en juin 2023, ce qui a entraîné une baisse dans la dynamique de construction des ouvrages ;
- le retard dans le processus de passation des marchés pour la sélection de nouveaux prestataires notamment dans 8 villes de la zone d'intervention du PAEA ;
- les retards de paiement des factures de certains artisans préfabricants entraînant l'arrêt de la préfabrication dans ces zones ;
- la suspension ou le ralentissement des activités dans certaines villes (Nouna, Tougan, Dédougou, Dori, Titao, Gourcy, etc.) en raison de la situation sécuritaire ;
- la diminution du pouvoir d'achat des ménages en raison de la situation sécuritaire, ce qui fait que l'assainissement n'est plus au rang des priorités.

Tableau 41 : Réalisations de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu urbain

Régions	Puisards domestiques				Fosses septiques			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c) /a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c) /a*100*100
Boucle du Mouhoun	770	395	0	51,3				
Cascades	560	383	0	68,4				
Centre	7 840	974	0	12,4				
Centre-Est	1 138	343	0	30,1				
Centre-Nord	419	383	0	91,4				
Centre-Ouest	700	621	0	88,7				
Centre-Sud	490	0	0	0,0				
Est	280	168	0	60,0				
Hauts-Bassins	4 445	326	0	7,3				
Nord	630	595	0	94,4				
Plateau Central	438	89	0	20,3				
Sahel	0	0	0	0,0				
Sud-Ouest	490	0	0	0,0				
Total national	18 200	4 277	0	23,5				

Source : *Rapports-bilans régionaux*

Les résultats annuels sont dans l'ensemble très faibles. Les régions du Centre-Sud, du Sahel et du Sud-Ouest n'ont pas enregistré de réalisation de puisards domestiques. Le Plateau Central (20,3%), les Hauts-Bassins (7,3%), le Centre-Est (30,1%) et le Centre (12,4%) se retrouvent avec des taux

de réalisation de latrines particulièrement bas. Les régions du Nord, du Centre-Nord, du Centre-Ouest, des cascades, de l'Est et de la Boucle du Mouhoun sont au-dessus de la moyenne avec respectivement 94,4%, 91,4%, 88,7%, 68,4%, 60,0% et 51,3%.

Au 31/12/2023, l'ONEA a réalisé 4 277 puisards sur une prévision de 18 200 soit 23,5% de taux de réalisation. Ce faible taux s'explique par les mêmes raisons que celles évoquées au commentaire du tableau 36.

Produit 4.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Tableau 42 : Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles et centres de formation

Régions	Réalisations						Réhabilitations					
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservées aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c) /a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservées aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c) /a*100*100
Boucle du Mouhoun	13	00	0	0	0	0,0						
Cascades	14	00	0	0	0	0,0						
Centre	24	35	0	0	11	100,0						
Centre-Est	17	00	0	0	0	0,0						
Centre-Nord	15	00	0	0	0	0,0						
Centre-Ouest	21	00	0	0	0	0,0						
Centre-Sud	10	00	0	0	0	0,0						
Est	04	00	0	0	0	0,0						
Hauts-Bassins	13	09	0	0	0	69,2						

Régions	Réalizations						Réhabilitations					
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservées aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c) /a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservées aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c) /a*100*100
Nord	13	00	0	0	0	0,0						
Plateau Central	02	15	0	0	13	100						
Sahel	00	00	0	0	0	0,						
Sud-Ouest	18	12	0	0	0	66,7						
Total national	164	73	0	0	24	29,9						

Source : *Rapports-bilans régionaux*

Les résultats annuels dans l'ensemble ne sont pas satisfaisants. 9 régions sur 13 n'ont enregistré aucune réalisation de latrines dans les écoles et centres de formation. Néanmoins les régions du Centre (100,0%), du Nord (63,3%), du Plateau Central (100%) et du Sud-Ouest (66,7%) enregistrent des taux satisfaisants.

Au 31/12/2023, un total de 73 latrines a été réalisé dans les écoles et centres de formation sur une prévision de 164 soit un taux de réalisation de 29,9%. L'insuffisance des résultats s'explique par :

- les coûts des réalisations des ouvrages d'assainissement scolaires et communautaires jugés faibles constituant ainsi un facteur démotivant pour les artisans. Cependant des actions sont en cours pour la révision desdits coûts ;
- le retard accusé par les entreprises SOGEDAF et OH-VS dans la réalisation de 77 blocs de latrines scolaires et communautaires dans 6 villes couvertes par le projet AAB/KFW ;
- la suspension des cotations concernant la conception et la validation de nouveaux plans en tenant compte des personnes à mobilité réduite et des cabines GHM exigées par les normes nationales.

Tableau 43 : Réalisations de latrines dans les lieux publics et centres de santé

Régions	Réalisations				Réhabilitations			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c) /a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c) /a*100*100
Boucle du Mouhoun	12	06	0	50,0				
Cascades	09	00	0	0,0				
Centre	20	32	12	100,0				
Centre-Est	24	05	0	20,8				
Centre-Nord	24	02	0	8,3				
Centre-Ouest	19	15	0	79,0				
Centre-Sud	20	05	0	25,0				
Est	08	00	0	0,0				
Hauts-Bassins	24	22	0	91,7				
Nord	20	02	0	10,0				
Plateau Central	11	00	0	0,0				
Sahel	00	00	0	0,0				
Sud-Ouest	12	00	0	0,0				
Total national	203	89	12	37,9				

Source : *Rapports-bilans régionaux*

Les résultats annuels dans l'ensemble ne sont pas satisfaisants. 5 régions (les Cascades, l'Est, le Plateau-Central, le Sahel et le Sud-Ouest) n'ont enregistré aucune réalisation de latrines dans les lieux publics et centres de santé. Les régions du Centre-Ouest (79,0%), du Centre (100,0%), des Hauts-Bassins (91,7%) et de la Boucle du Mouhoun (50,0%) ont un taux supérieur ou égale à la moyenne.

Au 31/12/2023, l'ONEA a réalisé au total 89 latrines dans les lieux publics et centres de santé sur une prévision de 203 soit un taux de réalisation de 37,9%.

Ce faible taux s'explique par les mêmes raisons que celles évoquées au commentaire du tableau 40.

Produit 4.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

a) Actualisation de documents de gestion de l'assainissement

Aucune activité n'a été réalisée pour ce point. Cependant l'ONEA est en attente de la disponibilité du document sur le guide de gestion des latrines communautaires.

b) Formation et suivi de la gestion de l'assainissement dans les institutions

Au cours de l'année 2023, aucun acteur n'a été formé sur le suivi de la gestion de l'assainissement dans les institutions.

c) Autres activités entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement

d) Suivre l'entretien et la gestion des latrines publiques

Au cours l'année 2023, les latrines publiques réalisées dans les villes du PAEA ont été suivies par des animateurs communautaires recrutés à cet effet. Un plan de gestion a été élaboré par le bureau d'études et les acteurs puis validé par l'ONEA. Ce document a permis aux animateurs communautaires des villes de Gourcy, Yako, Bousé et Kaya de suivre la gestion des latrines publiques réalisées dans ces localités.

e) L'intercommunalité

Tableau 44 : Actions menées dans le cadre de l'intercommunalité

Régions	Nombre de campagnes d'informations	Nombre de communes accompagnées dans le cadre de la MOC	Observations
Boucle du Mouhoun		1	
Cascades			
Centre			
Centre-Est		4	
Centre-Nord		3	
Centre-Ouest			
Centre-Sud		2	
Est			
Hauts-Bassins			
Nord			
Plateau Central			
Sahel			
Sud-Ouest			

Régions	Nombre de campagnes d'informations	Nombre de communes accompagnées dans le cadre de la MOC	Observations
Total national		10	

Source : *Rapports-bilans régionaux*

Dans le cadre de l'intercommunalité, aucune campagne d'information n'a été envisagée par l'ONEA.

Cependant 10 communes de 4 régions ont bénéficié de dotations de matériels informatiques et de moyens roulants sous le financement de la Banque Mondiale afin de permettre aux points focaux desdites communes de suivre les activités de réalisations.

4.5 Objectif Opérationnel 5 : Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

4.5.1 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

Produit 5.1.1 : La chaîne de valeur de l'assainissement est structurée et développée

1) Rencontres de concertation avec les acteurs de la filière de l'assainissement

La DGAEUE a organisé des rencontres de concertations avec les acteurs de l'assainissement notamment les chercheurs, l'association des vidangeurs, les ONG et les PTF afin de mieux coordonner la mise en œuvre des activités menées, d'échanger sur les difficultés rencontrées et de proposer des solutions/recommandations pour une meilleure mise en œuvre du processus. Une rencontre de concertation avec les services de la Police de l'Eau, de l'hygiène, des Mairies sur la prise en compte du cadre législatif et réglementaire en matière d'AEUE dans leurs actions a également été organisée.

Pour accélérer l'atteinte des objectifs en matière d'assainissement en milieu urbain conformément à la cible 6.2 de l'objectif 6 des ODD qui vise l'accès des populations à des services d'assainissement gérés en toute sécurité sur toute la chaîne, l'ONEA avec l'accompagnement de la GIZ s'est engagé dans l'élaboration d'un concept pour le développement à grande échelle de l'assainissement autonome. Ce concept a pour objectif d'améliorer les services urbains d'assainissement à travers la prise en compte de tous les maillons (chaîne des valeurs) de la Filière de l'Assainissement Autonome. Le concept de la FAA est en cours de validation et permettra à l'ONEA de disposer d'un document de gestion précisant les normes techniques et opérationnelles pour la mise en œuvre de la chaîne de valeurs de l'assainissement autonome.

2) L'état des lieux des acteurs et analyse des pratiques sur les différents maillons de la chaîne de l'assainissement

Une enquête a été entreprise par la DGAEUE afin d'établir une cartographie des acteurs de l'assainissement. Cette cartographie permettra de disposer d'une situation exhaustive de l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l'assainissement. Des fiches de collectes ont été élaborées et les acteurs en charge de la collecte ont été formés. Une formation sur des logiciels SIG a été organisée au bénéfice des acteurs en charge du rapportage de l'enquête.

3) Collecte, traitement et valorisation des boues de vidanges

Tableau 45 : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges

Régions	Vidangeurs manuels recensés		Vidangeurs mécaniques recensés		Vidangeurs professionnels recensés		Existence d'associations de vidangeurs (1=oui ; 2=non) recensées	Associations de vidangeurs organisés		Quantité de boues collectées (m³)	Quantité de boues traitées (m³)	Quantité de boues valorisées
	Nouveaux	Total existant	Nouveaux	Total existant	Nouveaux	Total existant		Nouvelles	Total existant			
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre	0	241	0	0	0	0	1	0	0	435 566	435 566	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	144	0	0	0	0	1	0	0	65 477	65 477	0
Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total national	0	385	13	0	0	0	2	0	0	501 043	501 043	0

Source : ONEA, Rapports-bilans régionaux 2023

Au cours de l'année 2023, 501 043 m³ de boues de vidange ont été collectés et traités contre 407 122 en 2022 soit une hausse de 23%. Les stations de traitement des boues de vidange de Zagtoui et Kossodo dans la commune de Ouagadougou et de Dogona dans la commune de Bobo-Dioulasso sont surexploitées par rapport à leur capacité nominale.

Aucune quantité de boue n'est valorisée en 2023, car l'ONEA est en attente des résultats des études réalisées par l'Université Nazi Boni. En rappel, une convention a été signée avec l'Université Nazi BONI de Bobo-Dioulasso pour un accompagnement à la valorisation des boues de vidanges traitées. Il s'agissait pour l'université de poursuivre les analyses dans la durée sur les boues hygiénisées et de proposer des formulations pour la valorisation. Deux rapports d'étapes ont été produits à cet effet par l'Université et un atelier est en préparation pour la présentation des résultats à l'ensemble des acteurs. A l'issue de cet atelier, le rapport final sera produit par l'Université.

Il existe 2 associations de vidangeurs à Ouaga et 1 à Bobo-Dioulasso. Toutefois l'ONEA n'a pas enregistré de nouveaux vidangeurs au cours de l'année 2023.

Au regard de la problématique de la gestion des boues de vidange, il importe d'augmenter les capacités des stations de Ouaga, Bobo, des autres villes moyennes et des chefs-lieux de communes. Pour ce faire, les collectivités territoriales doivent prévoir des espaces pour la réalisation des infrastructures de gestion de boues de vidange.

Dans la région du Centre-Sud, 13 vidangeurs manuels ont été recensés dans les communes de Ipélcé, Guiaro, Bindé, Guiba et Kombissiri et formés dans le cadre du projet PHA-3R. Hormis cela, aucune situation du traitement, ni de valorisation des boues de vidanges n'a été enregistrée au cours de l'année 2023 dans les régions.

Produit 5.1.2 : Le développement du service de l'assainissement collectif et semi-collectif est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Tableau 46 : Développement du service d'assainissement collectif et semi-collectif

Régions	Etudes diagnostiques	Nouvelles STBV réalisées	Nouvelles STEP réalisées	Nombre de nouveau site de dépotage des boues de vidange identifiés		Nombre de nouveaux sites de dépotage des boues de vidange aménagés	
				Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations
Boucle du Mouhoun						1	1
Cascades							
Centre	1						
Centre-Est							
Centre-Nord							
Centre-Ouest							
Centre-Sud	1						
Est							
Hauts-Bassins	1					1	1
Nord					3		0
Plateau Central	1						
Sahel							
Sud-Ouest						02	02
DGAUE	10						
Total national	13				03	04	04

Source : ONEA, DGAUE, Rapports-bilans régionaux 2023

Au cours de l'année 2023, dans la région du Nord, 3 sites ont été identifiés dans la commune de Ouahigouya pour être aménagés pour le dépotage de boue de vidange par l'ONG Solidarité International et la commune.

La DREA Centre-Sud a identifié un site pour la réalisation d'une station de dépotage de boues de vidange.

Dans la région du Plateau Central, une notice d'impact environnemental a été élaborée par l'ONG Eau Vive international pour la construction d'une STBV.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet PHEPA-8P, la DGAEUE a lancé 5 études en 2023 pour la réalisation de 5 STBV et leurs modalités de mise en œuvre et de gestion dans les régions du Centre-Ouest et du Centre-Sud.

L'ONEA a lancé 2 études diagnostiques en 2023 pour le développement de l'assainissement collectif sous le financement de l'AFD dont l'une dans les régions du Centre et des Hauts-Bassin et l'autre dans celles du Centre-Ouest, du Nord et des Cascades.

Au 31 décembre 2023, les études sont achevées dans les villes de Koudougou, Ouahigouya et Banfora mais restent en cours à Bobo et Ouaga alors que l'AFD a suspendu ses financements. Des financements complémentaires sont donc à rechercher pour l'achèvement de ces études.

Aucune nouvelle STBV et STEP n'a été réalisée au cours de l'année 2023 par l'ONEA. Par contre, au nombre des travaux des STBV des villes de Dano, Diébougou, Houndé et Toma, seuls ceux de la ville Dano sont à un stade avancé avec un taux d'exécution de 75,6%. Pour les villes de Houndé et Toma, les bureaux d'études ont été recrutés alors que pour la ville de Diébougou, le recrutement d'un prestataire est en cours.

Tableau 47 : Extension du réseau collectif

Villes	Réseau d'assainissement collectif (Km)			Raccordés au Réseau collectif (Nbre)		
	Prévisions (a)	Réalisations (b)	Taux (100*b/a) en %	Prévisions (a)	Réalisations (b)	Taux (100*b/a) en %
Ouagadougou	0	0	0	100	16	16,0
Bobo-Dioulasso	0	0	0	-	-	-
Total	0	0	0	100	16	16,0

Source : ONEA 2023

Aucune prévision sur l'extension du réseau collectif n'a été envisagée à Ouaga et à Bobo par manque de financement.

Cependant 16 ménages sur une prévision de 100, ont été raccordés au réseau collectif au cours de l'année 2023 soit un taux de 16,0%. Ces raccordements concernent majoritairement la zone ZACA. Il n'y a pas eu de raccordement dans la ville de Bobo-Dioulasso. Ce faible résultat est lié au coût de raccordement jugé élevé par certains ménages. Des réflexions sont en cours pour proposer un mécanisme d'accompagnement desdits ménages.

Produit 5.1.3 : Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal

- 1) Former des acteurs sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement

Aucune formation des acteurs sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement n'a été enregistrée au cours de l'année 2023.

4.6 Objectif Opérationnel 6 : Améliorer les connaissances dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta

4.6.1 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta

Produit 6.1.1 : La recherche orientée et appliquée à l'assainissement est promue à travers des thématiques pertinentes

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat entre l'ONEA et l'Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso pour la recherche appliquée pour la caractérisation et la valorisation des boues de vidange dans les stations de traitement situées à Zagtoui, Kossodo, Bassinko dans la commune de Ouagadougou et à Dogona dans la commune de Bobo-Dioulasso au profit de l'ONEA, une étude de caractérisation des boues a été menée et est en attente de validation. Cependant, les résultats de l'étude sont disponibles et le produit a été testé sur deux spéculations (coton et maïs) sur des sites pilotes et les résultats sont satisfaisants. Un atelier de présentation des résultats de ladite étude aux acteurs impliqués est en préparation.

Le taux de réalisation de l'étude est estimé à 80%.

Produit 6.1.2 : Les produits de la recherche améliorent les technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et excréta

Faire le point des activités entrant dans le cadre de la recherche orientée à l'amélioration des technologies.

Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et les comportements en matière d'assainissement

Faire le point des activités entrant dans le cadre de l'amélioration des approches et des pratiques.

Au cours de l'année 2023, on note, dans la région du sahel, la poursuite des activités de mise en œuvre de l'ATPC en situation d'urgence dans les périphéries de la ville de Dori par deux acteurs sous le financement de l'UNICEF, et de la commune de Arbinda par SERACOM. Aussi l'approche ATPE qui sera réalisée dans les écoles de Dori et de Gorom-Gorom est en perspective.

4.7 Objectif Opérationnel 7 : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

4.7.1 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Produit 7.1.1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées

1) Organisation d'activités de mobilisation de ressources financières

Tableau 48 : Sanithons et nuits de l'assainissement

Régions	Nombre de sanithons tenus		Nombre de nuits de l'assainissement tenues		Nombre de table-rondes		Observations
	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	-
Cascades	0	0	0	0	0	0	-
Centre	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	-
Est	0	0	0	0	0	0	-
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	-
Nord	0	0	0	0	0	0	-
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	-
Sahel	0	0	0	0	0	0	-
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	-
Total national	0	0	0	0	0	0	-

Source : *Rapports-bilans régionaux*

Au cours de l'année 2023, aucune activité de sanithon ou nuit de l'assainissement n'a été réalisée.

2) Organisation de la Journée Mondiale des Toilettes (faire un résumé des activités déroulées)

La Journée Mondiale des Toilettes (JMT) a été célébrée en différé le 21 novembre 2023 à Ipelcé dans la région du Centre-Sud sous la présidence du Ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement et de la co-présidence du Ministre en charge de l'Action Humanitaire avec la participation des autorités administratives, politiques, coutumières, religieuses, des PTF et des communautés. Le thème retenu pour cette édition au niveau national était « Assainissement

et cohésion sociale ». Cette cérémonie a été l'occasion de faire les plaidoyers auprès des PTF, la remise des certificats FDAL aux communautés.

La commémoration de ladite JMT a été marquée par une série d'activités dont les principales sont :

- Une campagne de communication :

Cette campagne de communication a consisté à informer et sensibiliser l'ensemble des acteurs sur les questions relatives à l'accès aux toilettes et à l'hygiène des mains ;

- L'organisation d'un match de gala entre les FDS et la population civile :

Le match a opposé les FDS et la population civile et s'est tenu le lundi 20 Novembre à partir de 15 heures ;

- Organisation de jeux Wash United :

Les jeux se sont déroulés dans trois écoles de la commune de Ipelcé avec pour objectif de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement à travers la mise en œuvre des activités WASH dans les écoles ;

- Le lancement des travaux de réalisation d'ouvrages d'Eau et d'Assainissement dans le cadre de la mise en œuvre de deux projets à savoir : le Projet de Promotion de l'Hygiène, de l'Eau Potable, de l'Assainissement et de Renforcement de la Résilience de la population à la COVID 19 et au changement climatique en milieu rural dans 8 provinces au Burkina Faso (PHEPA-8P) et le Projet d'Amélioration des Services d'Eau Potable et d'Assainissement pour le renforcement de la résilience (PASEP-2R).

3) Mobilisation de ressources financières

Tableau 49 : Ressources financières mobilisées

Régions	Mécanismes endogènes de financement				Stratégie de mobilisation de ressources extérieures				Autres stratégies (à préciser) (i)	Montant total mobilisé (Millions) A+b+c+d+e+f+g+h+i
	Sanithons (a)	Nuits d'assainissement (b)	Fonds propres des communes (c)	Ménages (d)	Diaspora (e)	Coopération décentralisée (jumelage) (f)	PTF (g)	Tableaux-rondes (h)		
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total national	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : Rapports-bilans régionaux

Produit 7.1.3 : Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages

Tableau 50 : Efforts des ménages

Régions	Nombre total de latrines homologuées réalisées	Nombre de latrines subventionnées homologuées	Nombre de latrines homologuées entièrement réalisées par les ménages	Nombre de latrines traditionnelles sans dalle à béton	Part des latrines homologuées entièrement réalisées par les ménages	Observations
Boucle du Mouhoun	1 855	1 490	365	186	19,7	
Cascades	564	509	55	17	9,8	
Centre	950	481	469	0	49,4	
Centre-Est	1 165	1 001	164	0	14,1	
Centre-Nord	2 256	2 015	241	1	10,7	
Centre-Ouest	6 294	2 790	3 504	2 342	55,7	
Centre-Sud	2 193	2 153	40	1	1,8	
Est	2 651	2 583	68	1	2,6	
Hauts-Bassins	672	579	93	5	13,8	
Nord	1 395	1 193	202	3	14,5	
Plateau Central	1 123	819	304	0	27,1	
Sahel	568	564	4	0	0,7	
Sud-Ouest	418	197	221	20	52,9	

Régions	Nombre total de latrines homologuées réalisées	Nombre de latrines subventionnées homologuées	Nombre de latrines homologuées entièrement réalisées par les ménages	Nombre de latrines traditionnelles sans dalle à béton	Part des latrines homologuées entièrement réalisées par les ménages	Observations
Total national	22 104	16 374	5 730	2 576	25,9	

Source : INO 2023

Dans le cadre de l'atteinte des objectifs du PN-AEUE, les acteurs intervenant dans le domaine de l'assainissement familial utilisent des approches distinctes telles que la subvention partielle ou totale des ouvrages dans la mise en œuvre des activités. En effet, la subvention partielle consiste à apporter une contribution à travers la prise en charge soit de la superstructure de la latrine et/ou du creusage de la fosse, soit en apportant de la main d'œuvre et/ou des agrégats nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Par conséquent, le complément de la réalisation de l'ouvrage est apporté par le ménage. Par ailleurs, des ménages réalisent entièrement des ouvrages eux-mêmes. L'ensemble des efforts des ménages a permis de réaliser **16 374** latrines subventionnées homologuées et de construire **2 576** latrines traditionnelles sans dalle en béton. L'effort des ménages s'est traduit par la réalisation de **5 730** latrines homologuées entièrement réalisées par eux-mêmes.

Produit 7.1.4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance

1) Situation de l'exécution des fonds transférés aux communes

Dans le cadre du transfert des compétences de l'Etat aux collectivités, le Ministère en charge de l'Eau et de l'Assainissement octroie des financements aux communes pour la réalisation d'ouvrages d'assainissement. C'est dans ce cadre que pour l'année 2023, la région du Centre-Nord a bénéficié d'un transfert de fonds à hauteur de 100 millions de FCFA pour la réalisation de 425 latrines familiales dans les provinces du Bam, du Namentaga et du Sanmatenga.

Le tableau ci-dessous présente l'état d'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural.

Tableau 51 : Exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural

Régions	Nombre communes bénéficiaires	Année de transfert	Nouvelles réalisations de latrines							
			Nombre			Montants				
			Prévu	Réalisé	Taux %	Prévu (millions)	Réalisé (engagé)	Réalisé (liquidé)	Taux (engagé)%	Taux (liquidé)%
Boucle du Mouhoun	3	2022	582	146	25,1	80,08	34,96	17,26	43,7	21,6
Cascades	1	2022	290	0	0,0	39,977	37,782	0	94,5	0,0
Centre	2	2022	292	0	0,0	40,103 16	20,0515 8	0	50,0	0,0

Régions	Nombre communes bénéficiaires	Année de transfert	Nouvelles réalisations de latrines							
			Nombre			Montants				
			Prévu	Réalisé	Taux %	Prévu (millions)	Réalisé (engagé)	Réalisé (liquidé)	Taux (engagé)%	Taux (liquidé)%
Centre-Est	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Nord	4	2023	708	363	51,3	109,4	70,6	40	64,5	36,6
Centre-Ouest	5	2022	1167	607	52,0	140,01	106,83	77,19	76,3	55,1
Centre-Sud	1	2022	142	142	100,0	17	17	17	100,0	100,0
Est	1	2022	290	290	100,0	40	40	40	100,0	100,0
Hauts-Bassins	2	2022	580	264	45,5	80	80	40	100,0	50,0
Nord	4	2022	1232	0	0,0	142,755	0	0	0,0	0,0
Plateau Central	3	2022	520	378	72,7	62,1	38,48	38,48	62,0	62,0
Sahel	1	2023	183	0	0,0	40	0	0	0,0	0,0
Sud-Ouest	2	2022	378	378	100,0	52,049	52,049	52,049	100,0	100,0
Total national	29	-	6364	2568	40,4	843,474	497,753	321,979	59,0	38,2

Source : Rapports-bilans régionaux

Pour une prévision de **6 364** latrines familiales à réaliser en 2023 sur les fonds transférés aux collectivités, **2 568** latrines ont été réalisées pour un montant engagé de **497,753** millions et un montant liquidé de **321,979** millions de FCFA soit un taux d'exécution physique de **40,4**%.

Les régions des Cascades, Centre, Nord, Sahel n'ont pas effectué de réalisation sur les fonds transférés.

Tableau 52 : Situation de l'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu urbain par l'ONEA

Régions	Nombre communes bénéficiaires	Année de transfert	Nouvelles réalisations de latrines							
			Nombre			Montants				
			Prévu	Réalisé	Taux	Prévu (millions)	Réalisé (engagé)	Réalisé (liquidé)	Taux (engagé)	Taux (liquidé)
Boucle du Mouhoun	3	2021	187	7	3,7					
Cascades	0	0	0	0	-					
Centre	0	0	0	0	-					
Centre-Est	0	0	0	0	-					

Régions	Nombre communes bénéficiaires	Année de transfert	Nouvelles réalisations de latrines							
			Nombre			Montants				
			Prévu	Réalisé	Taux	Prévu (millions)	Réalisé (engagé)	Réalisé (liquidé)	Taux (engagé)	Taux (liquidé)
Centre-Nord	0	0	0	0	-					
Centre-Ouest	2	2021	234	0	0,0					
Centre-Sud	0	0	0	0	-					
Est	0	0	0	0	-					
Hauts-Bassins	2	2021	164	0	0,0					
Nord	0	0	0	0	-					
Plateau Central	0	0	0	0	-					
Sahel	0	0	0	0	-					
Sud-Ouest	0	0	0	0	-					
Total national	07		585	07	1,2 %					

Source : ONEA 2023

L'ONEA a transféré depuis 2021, des fonds partiels pour la mise en œuvre des plans stratégiques d'assainissement pour le volet renforcement des capacités dans les villes de Léo, Réo, Boromo, Poura, Fara, Diébougou et Houndé.

Au 31/12/2023, aucun fond n'a été transféré, à cause du non épuisement des fonds et aussi de la non atteinte des résultats prévus dans les plans opérationnels (PO). Sept (07) ouvrages ont été réalisés sur 585 attendus. Cette contre-performance est due à /au :

- retard dans la réunification des documents administratifs pour le virement des fonds aux communes ;
- la dissolution des conseils municipaux ayant occasionné un retard dans le déroulement du processus ;
- la suspension du processus de transfert partiel par l'ONEA de la forme classique dont le financement était suspendu par le bailleur KFW ;
- l'arrêt de la préfabrication des éléments de construction par les artisans pour manque de financement.

2) Elaboration du rapport de mise en œuvre des fonds transférés aux communes

Aucun rapport n'a été élaboré par manque de ressources financières.

Produit 7.1.5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance

1) Etudes réalisées dans le cadre de l'exécution des activités terrain

Tableau 53 : Voyages d'études et partage d'expérience réalisés

Régions	Voyage d'étude et partage d'expérience			Public cible ou bénéficiaires	Nombre de participants			Nombre d'activités réalisées dans le cadre de l'AMOC	Préciser les activités de l'AMOC réalisées
	Prévisions	Réalisations	Thèmes		Nombre d'hommes	Nombre de femmes	Nombre total		
Boucle du Mouhoun	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Centre	1	1	ND	ND	18	3	21	ND	ND
Centre-Est	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	5	5	-	Leaders communautaires	250	208	458	-	-
Centre-Sud	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Nord	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Total national	6	6	0	-	268	211	479	0	0

Source : *Rapports-bilans régionaux*

06 Voyages d'étude et partage d'expériences ont été programmés et réalisés dont 01 au Centre et 05 dans le Centre-Ouest avec 479 participants dont 211 femmes.

2) Autres formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur

Tableau 54 : Autres formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur

Régions	Thèmes des formations réalisées	Public cible (nombre)										Nombre total de participants			Acteurs
		Agents du MEA	Autres agents de l'Etat	Agents des collectivités (maire, SG, ATC..)	ONG/association	Enseignants	Vidangeurs	Maçons	Hygiénistes et ASBC	Animateurs et prestataires	Autres acteurs	Hommes	Femmes	Total	
Boucle du Mouhoun		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Casca des	Formation des maçons y compris la gestion des boues de vidanges	0	0	0	0	0	0	14	0	2	0	34	10	44	JI SANIYANI
Centre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Centre-Est		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Centre-Nord		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Centre-Ouest	Formation des enseignants sur le WASH in school Formation des APE/AME sur l'ATPE,											433	443	960	

Régions	Thèmes des formations réalisées	Public cible (nombre)										Nombre total de participants			Acteurs
		Agents du MEA	Autres agents de l'Etat	Agents des collectivités (maire, SG, ATC..)	ONG/association	Enseignants	Vidangeurs	Maçons	Hygiénistes et ASBC	Animateurs et prestataires	Autres acteurs	Hommes	Femmes	Total	
	Formation des femmes sur la GHM														
Centre-Sud	Formation des enseignants sur le wash/ATPE ; Formation en GHM	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0			48	
Est		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hauts-Bassins	Formation des maçons locaux	-	-	-	-	-	-	8	22					30	
Nord	Formation la gestion et la réalisation des ouvrages d'assainissement	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	
Plateau Central	Wash en milieu scolaire, Mise en œuvre des actions d'hygiène	6	0	4	2	40	0	12	0	12	0	40	36	76	

Régions	Thèmes des formations réalisées	Public cible (nombre)										Nombre total de participants			Acteurs
		Agents du MEA	Autres agents de l'Etat	Agents des collectivités (maire, SG, ATC..)	ONG/association	Enseignants	Vidangeurs	Maçons	Hygiénistes et ASBC	Animateurs et prestataires	Autres acteurs	Hommes	Femmes	Total	
	GMH en milieu scolaire														
Sahel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sud-Ouest		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ONEA		07		16				40		78	07				
DGAE UE	Renforcer les capacités des médias ruraux de six régions sur l'AEUE										30				
	Organiser le concours des meilleures productions journalistiques sur l'assainissement (SANYA VIE)														Acteurs de médias
Total national		13	0	20	2	88	0	84	22	92	37	517	489	1168	

Source : *Rapports-bilans régionaux*

Plusieurs acteurs ont été formés dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur. On dénombre 489 femmes formées sur un total de 1 168. Ces formations ont porté sur plusieurs thèmes dont :

- la gestion des boues de vidanges ;
- le WASH in school ;
- l'ATPE ;
- la GHM ;
- la gestion et la réalisation des ouvrages d'assainissement.

Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs du sous-secteur, l'ONEA a formé 16 Points focaux des communes, 40 artisans composés de maçons et de préfabriquants et 78 animateurs, superviseurs et coordinateurs.

Produit 7.1.6: La Coordination et le suivi-évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires sont assurés par le Ministère en charge de l'Assainissement à travers le comité de revue du programme

1) Elaborer les rapports bilans et programmations

Au cours de l'année 2023 plusieurs rapports ont été rédigés en vue du suivi de leurs activités et de celles des autres acteurs. Il s'agit entre autres de :

- rapport bilan annuel 2022 du PN-AEUE ;
- rapport de programmation 2023 du PN-AEUE ;
- rapport semestriel 2023 du PN-AEUE ;
- rapport de programmation révisée 2023 ;
- rapports trimestriels 2023 ;
- rapport bilan annuel de la DGAEUE ;
- rapport de programmation de la DGAEUE.

2) Cadres de concertation communale en matière d'assainissement

Tableau 55 : Cadres de concertation communale

Régions	Type de cadre	Public-cible ou bénéficiaires	Nombre de participants		
			Nombre d'hommes	Nombre de femmes	Nombre total
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0
Nord	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0

Régions	Type de cadre	Public-cible ou bénéficiaires	Nombre de participants		
			Nombre d'hommes	Nombre de femmes	Nombre total
Sud-Ouest	0	0	0	0	0
Total national	0	0	0	0	0

Source : Rapports-bilans régionaux

Dans le cadre de la coordination et du suivi-évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires, aucun cadre de concertation communal n'a été tenu par les DREA.

La DGAEUE a organisé 2 rencontres de concertations avec les DREA d'une part et d'autre part, avec les chercheurs, l'association des vidangeurs, les ONG et les PTF.

3) Tenir les sessions des groupes thématiques régionaux du PN-AEUE

26 sessions de groupe thématique régional ont été tenues. Il s'agit d'une part de la session annuelle pour faire le bilan des activités au 31 décembre de l'année 2022 et la programmation des activités de 2023 et d'autre part de la session à mi-parcours 2023 pour faire le bilan au premier semestre et réviser la programmation annuelle 2023 des activités.

4) Tenir les sessions du comité de revue

Au cours de l'année 2023, deux sessions ont été tenues. Il s'agit de la session consacrée à l'examen des rapports-bilans annuel 2022 et de programmation 2023 et de la session consacrée à l'examen du rapport-bilan semestriel et du rapport de programmation révisée.

5) Élaborer le rapport annuel de performance et le plan annuel de performance

2 rapports ont été élaborés : le rapport annuel de performance 2022 et le plan annuel de performance 2024.

6) Autres activités de l'action

5 BILAN FINANCIER

5.1 Action 1.1 : Éradication de la Défection à l'Air Libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

Tableau 56 : Taux d'exécution financier des activités d'éradication de la DAL en milieu rural (produit1+2)

Régions	Programme révisé (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
		Issu de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issu de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
Boucle du Mouhoun	111,722	75,92	-	75,92	68,0	75,92	-	75,92	68,0
Casca des	3,657	3,302	-	3,302	90,3	1,313	-	1,313	35,9
Centre	-	-	8,501	8,501	-	-	8,501	8,501	-
Centre-Est	10,200	3	-	3	29,4	3	-	3	29,4
Centre-Nord	37,603	16,128	69,595	85,723	42,9	15,53	6,568	22,098	41,3
Centre-Ouest	25,250	18,08	8,91	26,99	71,6	18,08	8,91	26,99	71,6
Centre-Sud	15,557	15,557	-	15,557	100,0	15,557	-	15,557	100,0
Est	-	-	9,28	9,28	-	-	9,28	9,28	-
Hauts-Bassins	6,526	3,219	3,8	7,019	49,3	2,719	3,8	6,519	41,7
Nord	24,550	11,38	45	56,38	46,4	11,38	45	56,38	46,4
Plateau Central	94,849	87,04	44,85	131,89	91,8	87,04	44,85	131,89	91,8
Sahel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sud-Ouest	6,613	6,613	-	6,613	100,0	6,613	-	6,613	100,0
DGAEU	38,580	38,58	113,883	152,463	100,0	38,58	113,883	152,463	100,0
Total national	375,107	278,819	303,819	582,638	74,3	275,732	240,792	516,524	73,5

Source : Rapports-bilans régionaux

En matière d'éradication de la défécation à l'air libre en milieu rural, 582,638 millions de F CFA ont été engagés dont 303,819 millions en hors programmation. La programmation effectuée par l'ensemble des régions et la DGAEUE s'élève à 375,107 millions de F CFA. Le montant engagé issu de la programmation s'élève à 278,819 millions de F CFA contre un montant de 235,347 millions de FCFA pour l'année 2022. Le montant liquidé s'élève à 516,524 millions de F CFA soit 73,8 %.

Tableau 57 : Taux d'exécution financier des activités de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural (produit3)

Régions	Programme révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
		Issu de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issu de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
Boucle du Mouhoun	65,281	47,030	0,000	47,030	72,0	47,030	0,000	47,030	72,0
Casca des	1,614	1,541	2,351	3,892	95,5	1,541	2,351	3,892	95,5
Centre	14,967	13,717	17,306	31,023	91,6	13,717	17,306	31,023	91,6
Centre-Est	84,963	0,000	72,463	72,463	0,0	0,000	72,463	72,463	0,0
Centre-Nord	84,011	25,260	31,126	56,386	30,1	25,260	31,126	56,386	30,1
Centre-Ouest	59,908	26,950	0,000	26,950	45,0	26,950	0,000	26,950	45,0
Centre-Sud	10,196	10,196	13,361	23,557	100,0	10,196	10,196	20,392	100,0
Est	23,502	23,500	16,920	40,420	100,0	23,500	16,920	40,420	100,0
Hauts-Bassins	11,614	6,195	1,800	7,995	53,3	6,195	1,800	7,995	53,3
Nord	29,265	1,125	8,062	9,187	3,8	1,125	8,062	9,187	3,8
Plateau Central	80,314	62,450	24,290	86,740	77,8	62,450	24,290	86,740	77,8
Sahel	24,775	24,775	21,965	46,740	100,0	24,775	21,965	46,740	100,0
Sud-Ouest	10,640	6,140	0,000	6,140	57,7	6,140	0,000	6,140	57,7
DGAEUE	38,000	38,000	0,939	38,939	100,0	38,000	0,939	38,939	100,0
Total national	539,050	286,879	210,583	497,462	53,2	286,879	207,418	494,297	53,2

Source : Rapports-bilans régionaux

En matière d'adoption de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement, des sensibilisations de masse et de proximité ont été réalisées. A la date du 31 décembre 2023, un montant de 497,462 millions de F CFA a été engagé sur une programmation 539,050 millions F CFA soit un taux d'engagement de 53,2%. Ce taux est nettement supérieur à celui de 2022 qui était de 22,9%.

Le montant liquidé s'élève à **494,297** millions de F CFA avec 286,879 millions de F CFA issus de la programmation de 539,050 millions de F CFA d'où un taux d'exécution financier de 53,2%.

Tableau 58 : Taux d'exécution financier global de l'Action 1

Régions	Program mation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
		Issu de la program mation révisée (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issu de la program mation révisée (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
Boucl e du Mouh oun	177,003	122,95	0	122,9 5	69,5	122,95	0	122,9 5	69,5
Casca des	5,271	4,843	2,351	7,194	91,9	2,854	2,351	5,205	54,1
Centr e	14,967	13,717	25,807	39,52 4	91,6	13,717	25,807	39,52 4	91,6
Centr e-Est	95,163	3	72,463	75,46 3	3,2	3	72,463	75,46 3	3,2
Centr e- Nord	121,614	51,738	100,721	152,4 59	42,5	51,738	100,721	152,4 59	42,5
Centr e- Ouest	85,158	45,03	8,91	53,94	52,9	45,03	8,91	53,94	52,9
Centr e-Sud	25,753	25,753	13,361	39,11 4	100,0	25,753	10,196	28,91 8	100,0
Est	23,502	23,5	28,05	51,55	100,0	23,5	28,05	51,55	100,0
Hauts - Bassi ns	18,140	12,552	1,659	14,21 2	69,2	12,552	4,24	16,79 2	69,2
Nord	53,815	12,505	53,062	65,56 7	23,2	12,505	53,062	65,56 7	23,2
Platea u Centr al	175,163	149,49	69,14	218,6 3	85,3	149,49	69,14	218,6 3	85,3
Sahel	24,775	24,775	21,965	46,74	100,0	24,775	21,965	46,74	100,0
Sud- Ouest	17,253	12,753	0	12,75 3	73,9	12,753	0	12,75 3	73,9
DGA EUE	76,580	76,58	114,822	191,4 02	100,0	76,58	114,822	191,4 02	100,0
Total natio nal	914,157	579,186	512,311	1091, 498	63,4	577,197	511,727	1081, 893	63,1

Source : Rapports-bilans régionaux

Dans le cadre de l'éradication de la Défécation à l'Air Libre de la promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural, **1 091,498** millions de F CFA ont été engagés dont **579,186** millions de F CFA issus de la programmation de 914,157 millions de F CFA. Le taux d'exécution financier global base engagement de l'action 1 est de **63,4 %**. Ce taux est nettement supérieur à celui de 2022 qui était de 33,2%.

Le montant liquide s'élève à **1 81,893** millions de F CFA avec **577,197** millions de F CFA issus de la programmation d'où un taux d'exécution financier de **63,1 %**.

5.2 Action 2.1 : Éradication de la Défécation à l'Air Libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

Tableau 59 : Taux d'exécution financier de l'Action 2

Régions	Programme révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
		Issu de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issu de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
Boucle du Mouhoun									
Casca des									
Centre	8,6008	8,5558	10,836	19,3918	100	8,5558	10,836	19,3918	100
Centre-Est									
Centre-Nord	0,792	0,792	0,105	0,897	1	0,792	0,105	0,897	1
Centre-Ouest									
Centre-Sud									
Est									
Hauts-Bassins									
Nord									
Plateau Central									
Sahel									
Sud-Ouest									
DGAEU									
Total national	9,3928	9,3478	10,941	20,2888	99,5	9,3478	10,941	20,2888	99,5

Source : Rapports-bilans régionaux, ONEA

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités d'éradication de la Défécation à l'Air Libre et de la promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain, 2 régions ont mené des activités. Le montant total liquidé s'élève à 20,2888 millions de FCFA dont 9,3478 millions de FCFA issus de la programmation de 9,3928 millions de FCFA soit le taux d'exécution global base liquidation de **99,5%**.

5.3 Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

Tableau 60 : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblage, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 en **milieu rural (en millions de FCFA)**

Régions	Ateliers de ciblage, études diagnostiques, séances d'ImS et actions softs								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Program mation révisée (a)	Issu de la program mation (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issu de la program mation (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
Boucl e du Mouh oun	25,200	13,800	0,000	13,800	54,8	13,800	0,000	13,800	54,8
Casca des	11,719	5,994	0,000	5,994	51,1	5,994	0,000	5,994	51,1
Centr e	4,496	4,496	0,000	4,496	100,0	4,496	0,000	4,496	100,0
Centr e-Est	13,225	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Centr e- Nord	5,000	0,000	10,940	10,940	0,0	0,000	10,940	10,940	0,0
Centr e- Ouest	5,540	0,500	13,740	14,240	9,0	0,500	13,740	14,240	9,0
Centr e-Sud	2,000	2,000	0,000	2,000	100,0	2,000	0,000	2,000	100,0
Est	13,231	13,231	2,129	15,360	100,0	13,231	2,129	15,360	100,0
Hauts- Bassin s	7,162	7,162	0,560	7,722	100,0	7,162	0,560	7,722	100,0
Nord	16,270	16,270	0,000	16,270	100,0	16,270	0,000	16,270	100,0
Platea u Centr al	12,162	4,960	0,000	4,960	40,8	4,960	0,000	4,960	40,8
Sahel	0,000	0,000	2,200	2,200	0,0	0,000	2,200	2,200	0,0
Sud- Ouest	5,757	4,557	0,000	4,557	79,2	4,557	0,000	4,557	79,2
Total natio nal	121,762	72,970	29,569	102,539	59,9	72,970	29,569	102,539	59,9

Source : *Rapports-bilans régionaux*

Sur une programmation financière de **121,762** millions de FCFA pour des ateliers de ciblage, des études diagnostiques, des séances d'ImS et des actions soft, le montant total engagé est de 102,539 millions de FCFA avec **72,970** millions de FCFA issus de la programmation soit un taux d'engagement de **59,9 %**. Le taux de liquidation est le même que celui engagé.

Tableau 61 : Situation de l'exécution financier des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)

Régions	Réalisation de latrines familiales									Réhabilitation de latrines familiales								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %	Programmation révisée (a)	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %
Boucle du Mouhoun	1 262,512	152,500	22,000	174,500	12,1	152,500	22,000	174,500	12,1	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Cascades	75,677	29,700	12,484	42,184	39,2	29,700	12,484	42,184	39,2	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Centre	23,000	23,000	0,000	23,000	100,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Centre-Est	86,932	48,357	148,590	196,947	55,6	48,357	148,590	196,947	55,6	2,500	2,500	3,500	6,000	100	2,500	3,500	6,000	100
Centre-Nord	141,410	133,800	126,208	260,008	94,6	133,800	97,650	231,450	94,6	0,000	0,000	5,400	5,400	0	0,000	5,400	5,400	0
Centre-Ouest	591,854	446,530	0,000	446,530	75,4	446,530	0,000	446,530	75,4	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Centre-Sud	501,050	79,500	0,000	79,500	15,9	79,500	0,000	79,500	15,9	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Est	329,548	329,548	146,202	475,750	100,0	329,548	146,202	475,750	100,0	4,200	4,200	0,000	4,200	100	4,200	0,000	4,200	100
Hauts-	128,800	48,960	71,000	119,960	38,0	48,960	71,000	119,960	38,0	0,000	0,000	0,300	0,300	0	0,000	0,300	0,300	0

Bass ins																		
Nor d	365,600	201,050	39,235	240, 285	55,0	202,050	47,985	250, 035	55,3	0,000	0,000	0,000	0,0 00	0	0,000	0,000	0,0 00	0
Plate au Cent ral	100,173	100,173	2,117	102, 290	100, 0	85,250	0,000	85,2 50	85,1	0,000	0,000	0,000	0,0 00	0	0,000	0,000	0,0 00	0
Sahe l	106,750	106,750	163,740	270, 490	100, 0	106,750	163,740	270, 490	100, 0	0,000	0,000	0,000	0,0 00	0	0,000	0,000	0,0 00	0
Sud- Oue st	137,580	72,180	0,000	72,1 80	52,5	72,180	0,000	72,1 80	52,5	1,200	0,000	0,000	0,0 00	0	0,000	0,000	0,0 00	0
Tota l nati onal	3 850,886	1 772,048	731,576	2 503, 624	46,0	1735,12 5	709,651	244 4,77 6	45,1	7,900	6,700	9,200	15, 90 0	84,8	6,700	9,200	15, 90 0	84,8

Source : Rapports- bilans régionaux

Pour les réalisations des ouvrages, sur une programmation financière de **3 850,886** millions de F CFA, le montant total engagé est de **2 503,624** millions de F CFA avec **1 772,048** issus de la programmation soit un taux d'engagement de **46 %**. Ce taux est largement inférieur à celui de 2022 qui était de **81,8%**.

Le montant total liquidé pour la réalisation des ouvrages s'élève à **2444,776 millions de FCFA avec 1735,125** issus de la programmation d'où un le taux d'exécution base liquidation de **45,1%**.

Pour les réhabilitations, un montant de **6,700** issu d'une programmation de **7,900** millions de F CFA a été liquidé soit un taux de liquidation de **84,8%**.

Tableau 62 : Situation financière de la réalisation des puisards et fosses septiques

Régions	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programma tion révisée (a)	Issu de la programmat ion (b)	Hors programmat ion (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issu de la Programmat ion (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	8,8	8,8	48,6	57,4	100	8,8	48,6	57,4	100
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	3,6	3,6	0	3,6	100	3,6	0	3,6	100
Est	1,3	1,3	1,3	2,6	100	1,3	1,3	2,6	100
Hauts-Bassins	0,064	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total national	13,764	13,700	49,900	63,600	99,5	13,700	49,900	63,600	99,5

Source : *Rapports-bilans régionaux*

Sur une prévision de **13,764** millions de FCFA pour la réalisation des puisards et fosses septiques, le taux d'exécution base engagement est de **99,5%** et est le même que celui liquidé

Tableau 63 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles

Régions	Réalisation de latrines dans les écoles									Réhabilitation de latrines dans les écoles								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programme révisée (a)	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %	Issu de la	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %	Programme révisée (a)	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %	Issu de la	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %
						Programme (b)									Programme (b)			
Boucle du Mouhoun	682,500	9	27,085	36,085	1,3	9	27,085	36,085	1,3	35,75	35,75	0	35,75	100	35,75	0	35,75	100,0
Cascades	199,073	125,291	4,65	129,941	62,9	125,291	4,65	129,941	62,9	32	18,5	0	18,5	57,8125	18,5	0	18,5	57,8
Centre	72,801	26,539	3,092	29,631	36,5	26,539	3,092	29,631	36,5	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	127,804	68,38	32,378	100,758	53,5	67,732	31,83	99,562	53,0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Centre-Nord	24,000	24	113,625	137,625	100,0	24	102,85	126,85	100,0	0	0	14,881	14,881	-	0	10,867	10,867	-
Centre-Ouest	224,990	215,51	8,25	223,76	95,8	215,51	8,25	223,76	95,8	21	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Centre-Sud	134,041	98,772	16,56	115,332	73,7	98,772	16,56	115,332	73,7	5	5	3,7	8,7	100	5	3,7	8,7	100,0
Est	276,600	269,98	30,75	300,73	97,6	269,98	30,75	300,73	97,6	15,4	15,4	0	15,4	100	15,4	0	15,4	100,0
Hauts-Bassins	202,816	38,516	28	66,516	19,0	38,516	28	66,516	19,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Nord	79,875	45,081	48,3	93,381	56,4	42,312	48,3	90,612	53,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Plateau	94,333	68,91	13,1	82,01	73,0	60,37	10,22	70,59	64,0	22,9	22,9	8,9	31,8	100	22,9	8,9	31,8	100,0

Régions	Réalisation de latrines dans les écoles									Réhabilitation de latrines dans les écoles								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programme révisée (a)	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %	Programme révisée (a)	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %
Central																		
Sahel	11,000	3	33	36	27,3	3	33	36	27,3	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sud-Ouest	137,469	57,809	52,735	110,544	42,1	57,809	52,735	110,544	42,1	1,2	1,2	0	1,2	100	1,2	0	1,2	100,0
Total national	2267,302	1050,788	411,525	1462,313	46,3	1038,831	397,322	1436,153	45,8	135,25	98,75	27,481	126,231	73,012939	98,75	23,467	122,217	73,0

Source : Rapports-bilans régionaux

Sur une programmation de **2267,302** millions de F CFA pour la réalisation de latrines, on note un engagement financier de **1050,788** millions de F CFA issus de la programmation soit un taux d'engagement de **46,3 %**. Le montant liquidé s'élève à **1038,831** millions de F CFA issu de la programmation soit un taux de **45,8%**.

Sur une programmation de **135,250** millions de F CFA pour les réhabilitations, le taux d'exécution financier base liquidation est de **73 %** pour un montant liquidé de **98,750** millions de F CFA issus de la programmation.

Tableau 64: Situation de l'exécution financière des latrines dans les centres de santé

Régions	Réalisation de latrines dans les centres de santé									Réhabilitation de latrines dans les centres de santé								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %	Programmation révisée (a)	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %
Boucle du Mouhoun	572,780	0,000	39,081	39,081	0,0	0,000	39,081	39,081	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	97,632	34,946	0,000	34,946	35,8	34,946	0,000	34,946	35,8	17,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre	13,240	5,741	0,000	5,741	43,4	5,741	0,000	5,741	43,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	40,130	37,975	1,500	39,475	94,6	37,975	1,500	39,475	94,6	5,9	1,84	0,46	2,3	31,2	1,84	0,46	2,3	31,2
Centre-Nord	0,000	0,000	11,205	11,205	0,0	0,000	11,205	11,205	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	46,240	26,000	0,000	26,000	56,2	26,000	0,000	26,000	56,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	27,918	10,917	0,000	10,917	39,1	10,917	0,000	10,917	39,1	0	0	1,1	1,1	0	0	1,1	1,1	0
Est	120,170	120,170	65,570	185,740	100,0	120,170	65,570	185,740	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	100,080	66,234	48,000	114,234	66,2	32,399	48,000	80,399	32,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	121,518	0,000	21,740	21,740	0,0	0,000	21,740	21,740	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau	31,867	30,790	3,900	34,690	96,6	24,000	0,000	24,000	75,3	5	5	0	5	100	5	0	5	100

Régions	Réalisation de latrines dans les centres de santé									Réhabilitation de latrines dans les centres de santé								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %	Programmation révisée (a)	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %
Central																		
Sahel	1,500	1,500	15,000	16,500	100,0	1,500	15,000	16,500	100,0	2,5	2,5		2,5	100	2,5		2,5	100
Sud-Ouest	31,914	11,154	18,336	29,490	35,0	11,154	18,336	29,490	35,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DGA EUE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total national	1204,989	345,427	224,332	569,759	28,7	304,802	220,432	525,234	25,3	30,9	9,34	1,56	10,9	30,2	9,34	1,56	10,9	30,2

Source : *Rapports-bilans régionaux*

La programmation financière s'élève à **1 204,989** millions de F CFA pour les réalisations. Au 31 décembre 2023, un montant de **345,427** millions de F CFA issus de la programmation a été engagé soit un taux de **28,7%**. Le montant liquidé est de **304,802** millions de F CFA issus de la programmation soit un taux de **25,3%**.

Sur une prévision financière de **30,9 millions** de F CFA pour les réhabilitations, **9,34** millions de F CFA issus de la programmation ont été engagés et liquidés soit un taux de **30,2 %**.

Tableau 65 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les lieux publics

Régions	Réalisation de latrines dans les dans les lieux publics									Réhabilitation de latrines dans les lieux publics								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Progr mmatio n révisée (a)	Issu de la progr mmatio n (b)	Hors progr mmatio n (c)	Tot al (b+ c)	Tau x (100 *b/a) en %	Issu de la progr mmatio n (b)	Hors progr mmatio n (c)	Tot al (b+ c)	Tau x (100 *b/a) en %	Progr mmatio n révisée (a)	Issu de la progr mmatio n (b)	Hors progr mmatio n (c)	To tal (b +c)	Tau x (100 *b/a) en %	Issu de la progr mmatio n (b)	Hors progr mmatio n (c)	To tal (b +c)	Tau x (100 *b/a) en %
Boucle du Mouhoun	639,060	11,260	6,000	17,260	1,8	11,260	0,000	11,260	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	0,000	0,000	11,123	11,123	0,0	0,000	10,424	10,424	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre	35,250	20,754	24,089	44,843	58,9	20,754	24,089	44,843	58,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	26,132	10,055	0,000	10,055	38,5	10,055	0,000	10,055	38,5	0,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0,000	0,000	14,600	14,600	0,0	0,000	14,600	14,600	0,0	7,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	31,550	2,500	4,500	7,000	7,9	2,500	4,500	7,000	7,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	21,000	9,400	20,263	29,663	44,8	9,400	20,263	29,663	44,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	30,103	27,100	12,590	39,690	90,0	27,100	12,590	39,690	90,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	16,000	0,000	5,000	5,000	0,0	0,000	5,000	5,000	0,0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	26,058	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau	25,514	25,514	41,736	67,250	100,0	25,514	41,736	67,250	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Régions	Réalisation de latrines dans les dans les lieux publics									Réhabilitation de latrines dans les lieux publics								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Progr mmatio n révisée (a)	Issu de la progra mmatio n (b)	Hors progra mmatio n (c)	Tot al (b+ c)	Tau x (100 *b/a) en %	Issu de la progra mmatio n (b)	Hors progra mmatio n (c)	Tot al (b+ c)	Tau x (100 *b/a) en %	Progr mmatio n révisée (a)	Issu de la progra mmatio n (b)	Hors progra mmatio n (c)	To tal (b +c)	Tau x (100 *b/a) en %	Issu de la progra mmatio n (b)	Hors progra mmatio n (c)	To tal (b +c)	Tau x (100 *b/a) en %
Cent ral																		
Sahe l	54,000	54,000	161,000	215,000	100,0	54,000	161,000	215,000	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud- Oue st	27,553	0,000	18,000	18,000	0,0	25,353	0,000	25,353	92,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DGA EUE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tota l nati onal	932,220	160,583	318,901	479,484	17,2	185,936	294,202	480,138	19,9	22,490	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : *Rapports bilans régionaux*

Sur une programmation de **932,220** millions de F CFA, le montant engagé est de **160,583** millions de FCFA issus de la programmation soit un taux de **17,2%**. Ce taux a connu une baisse par rapport à celui de 2022 qui était de **44,3%**. Le montant liquidé est de **185,936** millions de FCFA issus de la programmation soit un taux de 19,9%.

Pour les réhabilitations de latrines aucun montant n'a été programmé ni exécuté.

Tableau 66 : Taux d'exécution financier des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines, puisards et fosses septique)

Régions	Programmation révisée (a)	OUVRAGES							
		Montant engagé en millions				Montant liquidé en millions			
		Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issu de la Programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	3 192,602	208,51	94,166	302,676	6,5	208,51	88,166	296,676	6,5
Cascades	421,882	208,437	28,257	236,694	49,4	208,437	27,558	235,995	49,4
Centre	144,291	76,035	27,181	103,216	52,7	53,035	27,181	80,216	36,8
Centre-Est	292,388	169,107	186,428	355,535	57,8	168,459	185,88	354,339	57,6
Centre-Nord	181,710	178,6	321,989	500,589	98,3	178,6	282,672	461,272	98,3
Centre-Ouest	915,634	690,54	12,75	703,29	75,4	690,54	12,75	703,29	75,4
Centre-Sud	692,609	207,189	41,623	248,812	29,9	207,189	41,623	248,812	29,9
Est	777,321	767,698	256,412	1 024,11	98,8	767,698	256,412	1 024,11	98,8
Hauts-Bassins	461,760	169,71	147,428	317,138	36,8	169,71	147,428	317,138	36,8
Nord	593,051	246,131	109,275	355,406	41,5	244,362	118,025	362,387	41,2
Plateau Central	279,787	279,787	62,453	342,24	100,0	238,34	28,01	266,35	85,2
Sahel	175,750	167,75	372,74	540,49	95,4	167,75	372,74	540,49	95,4
Sud-Ouest	336,916	148,6	89,071	237,671	44,1	148,6	89,071	237,671	44,1
Total national	8 465,701	3 518,094	1 749,773	5 267,867	41,6	3 451,23	1 677,516	5 128,746	40,8

Source : *Rapports-bilans régionaux*

Sur un montant total de **8 465,701** millions de F CFA programmé pour l'ensemble des ouvrages c'est-à-dire les nouvelles réalisations de latrines, de puisards et les réhabilitations de latrines, 3518,094 millions de FCFA ont été engagés au titre des investissements donnant ainsi un taux d'exécution financier de **41,6%**. Le montant liquidé est de **3 393,185** millions de FCFA soit un taux de **40,8%**.

Tableau 67 : Situation de l'exécution financière du produits 3 (en millions de FCFA)

Régions	Ateliers de ciblage, études diagnostiques, séances d'IMS, actions softs et autres								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0,000	0,000	13,200	13,200	0	0,000	13,200	13,200	0
Cascades	5,719	5,719	0	5,719	100	5,719	0,000	5,719	100
Centre	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Centre-Est	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Centre-Nord	0,000	0,000	10,940	10,940	0	0,000	10,940	10,940	0
Centre-Ouest	0,500	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Centre-Sud	4,700	4,700	1,450	6,150	100	4,700	1,450	6,150	100
Est	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Hauts-Bassins	0,000	0,000	7,722	7,722	0	0,000	7,722	7,722	0
Nord	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
Plateau Central	0,000	0,000	6,920	6,920	0	0,000	5,170	5,170	0
Sahel	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Sud-Ouest	0,000	0,000	5,757	5,757	0	0,000	5,757	5,757	0
DGAUE	13,000	5,000	0,000	5,000	38,5	5,000	0,000	5,000	38,5
Total national	23,919	15,419	52,909	68,328	64,5	15,419	49,409	64,828	64,5

Source : *rapport bilan régionaux*

Sur une programmation de **23,919** millions de FCFA on enregistre un montant liquidé issus de la programmation de 15,419 millions de F CFA soit un taux de **64,5%**.

Tableau 68: Taux d'exécution financier de l'action 3

Régions	ACTION 3								
	Programmation révisée (a)	Montant engagé (en millions de FCFA)				Montant liquidé (en millions de FCFA)			
		Issu de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	3 217,802	222,31	107,37	329,68	6,9	222,31	101,37	323,68	6,9
Cascades	433,601	220,15	28,26	248,41	50,1	220,15	27,56	247,71	50,1
Centre	148,787	80,53	27,18	107,71	54,1	57,53	27,18	84,71	38,7
Centre-Est	305,613	169,11	186,43	355,54	55,3	168,46	185,88	354,34	55,1
Centre-Nord	186,710	178,60	343,87	522,47	95,7	178,60	304,55	483,15	95,7
Centre-Ouest	921,674	691,04	26,49	717,53	75,0	691,04	26,49	717,53	75,0
Centre-Sud	699,309	213,89	43,07	256,96	30,6	213,89	43,07	256,96	30,6
Est	790,552	780,93	258,54	1 039,47	98,8	780,93	258,54	1 039,47	98,8
Hauts-Bassins	468,922	176,87	155,71	332,58	37,7	176,87	155,71	332,58	37,7
Nord	609,321	262,40	109,28	371,68	43,1	260,63	118,03	378,66	42,8
Plateau Central	291,949	284,75	69,37	354,12	97,5	243,30	33,18	276,48	83,3
Sahel	175,750	167,75	374,94	542,69	95,4	167,75	374,94	542,69	95,4
Sud-Ouest	342,673	153,16	94,83	247,99	44,7	153,16	94,83	247,99	44,7
DGAEEUE	13,000	5,00	0,00	5,00	38,5	5,00	0,00	5,00	38,5
Total national	8 605,663	3 606,48	1 832,25	5 438,73	41,9	3 539,62	1 756,49	5 296,11	41,1

Source : *Rapport-bilans régionaux*

La programmation globale de l'action 3 est de **8 605,663** millions de F CFA en 2023. Le montant engagé est de **3 606,48** millions de F CFA issus de la programmation et **3 539,62** millions de F CFA ont été liquidés soit un taux de **41,1%**. Ce taux est largement inférieur à celui de 2022 qui était de **72,3%**.

5.4 Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

Tableau 69 : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblage, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 (en millions de FCFA)

Régions	Ateliers ciblage, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun									
Cascades									
Centre									
Centre-Est									
Centre-Nord	1,235								
Centre-Ouest									
Centre-Sud									
Est									
Hauts-Bassins									
Nord									
Plateau Central									
Sahel									
Sud-Ouest									
ONEA	86,85	86,85		86,85	100,0	47,329		47,329	54,5
Total national	88,085	86,85	0	86,85	98,6	47,329	0	47,329	48,0

Source : *Rapports-bilans régionaux*

Tableau 70 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales (réalisations et réhabilitations), puisards et fosses septiques

Régions	Latrines familiales, puisards et fosses septiques								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Program mation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun									
Cascades									
Centre	55,9000	55,9000	3,9050	59,8050	100	55,900	3,905	59,805	100
Centre-Est									
Centre-Nord									
Centre-Ouest									
Centre-Sud									
Est									
Hauts-Bassins									
Nord									
Plateau Central									
Sahel									
Sud-Ouest									
ONEA	3700,85	2709,18		2709,18	73,2	695,289		695,289	18,8
Total national	3756,75	2765,08	3,905	2768,985	73,6	751,189	3,905	755,094	20,0

***Source** : Rapports-bilans régionaux*

Tableau 71 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles, centre de santé et lieux publics en milieu urbain

Régions	Latrines institutionnelles et publiques								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Program mation révisée (a)	Issu de la programmatio n (b)	Hors programmatio n (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issu de la programmatio n (b)	Hors programmatio n (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun									
Cascades									
Centre	24,564	24,564	7,600	32,164	100	24,564	7,600	32,164	100
Centre-Est									
Centre-Nord	24,000	24,000	30,037	54,037	1	24,000	30,037	54,037	1
Centre-Ouest									
Centre-Sud									
Est									
Hauts-Bassins									
Nord									
Plateau Central									
Sahel									
Sud-Ouest									
ONEA	734	240,15		240,15	32,7	130,1		130,1	17,7
Total national	782,564	288,714	37,637	326,351	36,9	178,664	37,637	216,301	22,8

Source : Rapports-bilans régionaux

Tableau 72: Exécutions financières de l'action 4

Régions	Action 4								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun									
Cascades									
Centre	80,464	80,464	11,505	91,969	100	80,464	11,505	91,969	100,000
Centre-Est									
Centre-Nord	25,235	24,000	30,037	54,037	1	24,000	30,037	54,037	1,000
Centre-Ouest									
Centre-Sud									
Est									
Hauts-Bassins									
Nord									
Plateau Central									
Sahel	0	0	15	15	0	0	15	15	0
Sud-Ouest									
ONEA	4434,85	2949,33		2949,33	66,5	825,389		825,389	18,6
Total national	4540,549	3053,794	56,542	3110,336	67,3	929,853	45,037	986,395	20,5

***Source :** rapport bilan régionaux*

5.5 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

Tableau 73: Exécutions financières de l'action 5

Régions	Action5								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	6,092	6,092	0	0	6,092	6,092	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	75	9	0	9	12	4,310	0	4,310	5,7
Plateau Central	10,620	10,620	0	10,620	100	10,620	0	10,620	100
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DGAEEUE	0	4,392	3,104	7,496	0	4,392	3,104	7,496	0
ONEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total national	85,620	24,012	9,196	33,208	28,0	19,322	9,196	28,518	22,6

Source : Rapports-bilans régionaux

Sur une programmation de **85,620** millions de FCFA, le montant engagé issu de la programmation est de **24,012** millions de FCFA soit un taux de **28 %**.

Le montant liquidé s'élève à un montant de **19,322** millions de FCFA issus de la programmation soit un taux de **22,6%**.

5.6 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta

Tableau 74: Exécution financière des actions de la recherche

Régions	Action6								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun									
Cascades									
Centre									
Centre-Est									
Centre-Nord									
Centre-Ouest									
Centre-Sud									
Est									
Hauts-Bassins									
Nord									
Plateau Central									
Sahel									
Sud-Ouest									
ONEA		19		19	-	15,200		15,200	-
Total national		19		19	-	15,200		15,200	-

Source : *Rapport-bilans régionaux*

5.7 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Tableau 75 : Exécution financière de l'action

Région	Action7								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issu de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	7,690	7,690	0	7,69	100	7,690	0	7,690	100
Centre	0,559	0,559	0	0,559	100	0,559	0	0,559	100
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	30,250	27,750	3,740	31,490	91,7	27,750	3,740	31,490	91,7
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0,245	0,245	3,615	3,86	100	0,245	3,615	3,860	100
Nord	0,370	0,370	0	0,370	100	0,37	0	0,37	100
Plateau Central	10,995	10,995	0	10,995	100	10,995	0	10,995	100
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DGAUEUE				0	0			0	0
Total national	50,109	47,609	7,355	54,964	95,0	47,609	7,355	54,964	95,0

Source : rapport bilan régionaux

Sur une programmation de **50,109** millions de FCFA, un montant de **47,609** millions de F CFA a été liquidé soit un taux de **95%**.

Tableau 76 : Exécution financière globale du PN-AEUE

Milieu	Prévision (en millions de FCFA)	Exécution (montants engagés en millions francs CFA)				Exécution (montants liquidés en millions francs CFA)			
		Issu de la programmation	Hors-programmations	Total	Taux engagé (%)	Issu de la programmation	Hors-programmations	Total	Taux liquidé (%)
Rural	9 993,365	4 793,710	1 473,814	6 267,525	48,0	4 591,869	1 386,184	5 978,053	45,9
Urbain	5 250,997	3 423,872	114,079	3 537,951	65,2	1 261,581	114,079	1 375,660	24,0
Régional	15 244,361	8 217,582	1 587,893	9 805,475	53,9	5 853,450	1 500,263	7 353,713	38,4

Source : Rapports-bilans régionaux

La programmation financière du PN-AEUE en 2023 était de **15 244,361** millions de FCFA. La mise en œuvre des activités a occasionné un engagement financier de **9 805,475** millions de FCFA avec **8 217,582** millions de FCFA issus de la programmation.

Le montant total liquidé est de **7 353,713** millions de FCFA avec un montant de **5 853,450** millions de FCFA issus de la programmation, ce qui donne un taux d'exécution financier base liquidation de **38,4%**.

6 SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES

Tableau 77 : Suivi des procédures de dévolution des marchés publics : mode de passation des marchés

Régions	Marchés	Mode de passation des marchés								Etat d'exécution					
		Nbre Appels d'offres	Nbre Demandes de prix	Nbre Manifestations d'intérêt +Demande de propositions	Nbre Demandes de cotation	Nbre Ententes directes	Nbre Demandes de proposition allégées	Nbre Consultations de consultants	Nbre Total de marchés	Engagés	Non engagés	Liquidés	Payés	Taux d'exécution base paiement (%)	En souffrance
Boucle du Mouhoun	Acquisitions, fournitures, biens et service	0	0	0	4	1	0	0	5	5	0	5	3	60	
	Travaux	0	1	0	1		0	0	2	2	0	2	1	50	
	Etudes	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	4	-	-	
Cascades	Acquisitions, fournitures, biens et service	0	0	0	1	2	0	0	3	3	0	3	3	100	0
	Travaux	0	1	0	1	0	0	1	3	3	0	3	3	100	0
	Etudes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Centre	Acquisitions, fournitures, biens et service	0	0	0	8	2	0	1	11	11	0	11	11	100	0
	Travaux	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	100	0
	Etudes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Centre-Est	Acquisitions, fournitures, biens et service				4				4						
	Travaux			2					2	2		2	2	100	
	Etudes						2		2	2		2	2	100	

Régions	Marchés	Mode de passation des marchés								Etat d'exécution					
		Nbre Appels d'offres	Nbre Demandes de prix	Nbre Manifestations d'intérêt +Demande de propositions	Nbre Demandes de cotation	Nbre Ententes directes	Nbre Demandes de proposition allégées	Nbre Consultations de consultants	Nbre Total de marchés	Engagés	Non engagés	Liquidés	Payés	Taux d'exécution base paiement (%)	En souffrance
Centre-Nord	Acquisitions, fournitures, biens et service	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	2	2	100	
	Travaux	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	2	2	100	
	Etudes	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	2	100	
Centre-Ouest	Acquisitions, fournitures, biens et services	0	0	0	5	1	1		7	7	0	7	7	100	0
	Travaux	0	1	0	2	0	0		3	3	0	3	3	100	0
	Etudes	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-	0
Centre-Sud	Acquisitions, fournitures, biens et services	0	0	0	4	0	0	0	4	4	0	4	4	100	-
	Travaux	1	2	3	1	0	0	0	7	7	0	7	7	100	-
	Etudes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Est	Acquisitions, fournitures, biens et services	0	0	0	3	1	0	0	4	4	0	4	4	100	0
	Travaux	0	3	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3	100	0
	Etudes	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	100	0
Hauts-Bassins	Acquisitions, fournitures, biens et services	0	0	0	10	0	1	0	11	11	0	11	10	90,9	0
	Travaux	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	100	0

Régions	Marchés	Mode de passation des marchés								Etat d'exécution					
		Nbre Appels d'offres	Nbre Demandes de prix	Nbre Manifestations d'intérêt + Demande de propositions	Nbre Demandes de cotation	Nbre Ententes directes	Nbre Demandes de proposition allégées	Nbre Consultations de consultants	Nbre Total de marchés	Engagés	Non engagés	Liquidés	Payés	Taux d'exécution base paiement (%)	En souffrance
	Etudes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Nord	Acquisitions, fournitures, biens et services	-	-	-	2	-	-	-	2	2	0	2	-	-	-
	Travaux	-	1	-	1	-	-	-	2	2	0	2	-	-	-
	Etudes	-	-	-	-	-	-	4	4	4	0	4	-	-	-
Plateau Central	Acquisitions, fournitures, biens et services	0	0	0	0	1	0		1	1	0	1	1	100	0
	Travaux	2	0	0	0	0	0		2	2	0	0	0	0	0
	Etudes	0	0	0	0	0	1		1	1	0	0	0	0	0
Sahel	Acquisitions, fournitures, biens et services	0	0	0	6	1	0	1	8	6	2	6	6	75	0
	Travaux	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	100	1
	Etudes	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	100	0
Sud-Ouest	Acquisitions, fournitures, biens et services	0	0	0	4	3	0	2	9	9	0	9	9	100	0
	Travaux	0	1	0	1	0	0	0	2	2	0	2	2	100	0
	Etudes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
DGAEUE	Acquisitions, fournitures, biens et services	0	1	0	11	1	0	0	13	11	2	11	11	84,6	

Régions	Marchés	Mode de passation des marchés								Etat d'exécution					
		Nbre Appels d'offres	Nbre Demandes de prix	Nbre Manifestations d'intérêt +Demande de propositions	Nbre Demandes de cotation	Nbre Ententes directes	Nbre Demandes de propositions allégées	Nbre Consultations de consultants	Nbre Total de marchés	Engagés	Non engagés	Liquidés	Payés	Taux d'exécution base paiement (%)	En souffrance
	Travaux	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
	Etudes	0	0	0	0	0	1	5	6	5	1	5	5	83,3	
ONEA	Acquisitions, fournitures, biens et services	0	3	0	14	0	0	0	17	17	0	17		0	
	Travaux	0	4	0	92	0	0	0	106	106	0	106		0	
	Etudes	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	2		0	
Total		3	23	7	177	17	6	22	263	254	6	251	109	41,4	1


Source : DGAEUE, DREA

En 2023, **263** marchés étaient inscrits dans le plan de passation dont **3** appels d'offres, **23** demandes de prix, **7** manifestations d'intérêt, **177** demandes de cotation, **17** ententes directes, **6** demandes de propositions allégées et **22** consultations de consultants. **254** ont été engagés soit un taux d'engagement global de **96,6%**. Au total **109** marchés ont été liquidés et payés soit un taux d'exécution global base paiement de **41,4%**.

7 ANALYSE DES PERFORMANCES ET EVOLUTION DES INDICATEURS

7.1 Assainissement en milieu rural

Figure 1 : Taux d'accès à l'assainissement familial en 2023 par région

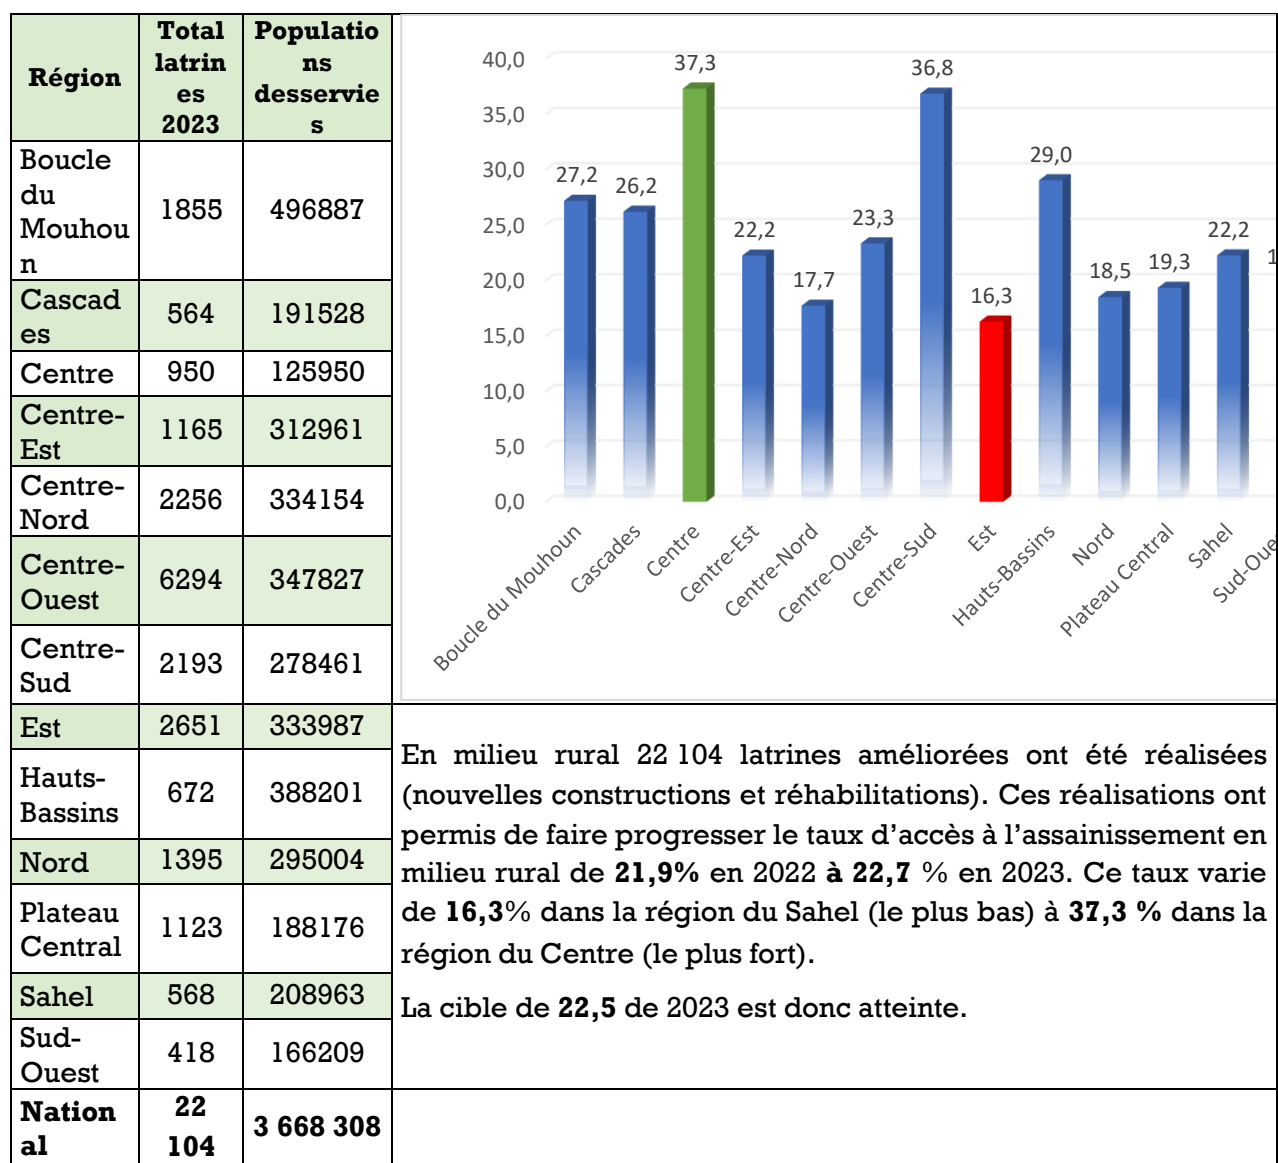

Source : BD AEUE, DGAEUE 2023


Tableau 78: Evolution du taux d'accès à l'assainissement familial en milieu rural par région

Année	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Boucle du Mouhoun	5,4	10,3	13,9	16,4	18,2	20,6	24,0	24,6	26,7	27,2
Cascades	6,1	9,4	10,0	10,3	11,6	14,3	18,3	19,0	26,2	26,2
Centre	19,3	22,8	31,4	34,0	35,6	37,5	43,7	50,7	36,0	37,3
Centre-Est	14,9	16,2	19,1	20,3	20,5	21,0	21,8	22,2	22,0	22,2
Centre-Nord	10,3	12,7	13,3	13,8	14,5	14,8	17,9	18,8	17,1	17,7
Centre-Ouest	7,7	12,3	13,0	14,0	14,7	15,7	16,9	19,5	19,6	23,3
Centre-Sud	3,6	5,7	7,0	8,7	10,1	12,4	23,3	26,4	34,5	36,8
Est	7,6	9,7	10,9	13,7	13,9	14,2	14,1	15,1	15,5	16,3
Hauts-Bassins	9,8	12,1	13,3	15,2	19,4	22,6	25,5	25,7	29,5	29,0
Nord	12,1	14,2	16,2	17,4	19,1	20,1	22,1	23,4	18,1	18,5
Plateau Central	17,4	19,7	20,0	20,2	20,7	20,9	21,3	21,7	18,7	19,3
Sahel	4,8	8,0	11,7	12,4	13,1	13,9	14,0	14,3	21,8	22,2
Sud-Ouest	7,5	12,0	13,6	14,3	16,2	16,6	17,0	18,6	19,8	19,8
National rural	9,1	12,1	13,8	15,1	16,4	17,6	19,9	21,0	21,9	22,7

Source : BD INOA 2023

L'évolution du taux d'accès par région montre que trois régions (Centre-Ouest, Centre-Sud, et Centre) enregistrent les meilleures progressions annuelles par rapport à 2022 avec respectivement **3,7** points pourcentage, **2,4** points pourcentage et **1,3** points pourcentage. Par contre la région des Hauts-Bassins enregistre une régression de **0,5** points de pourcentage.


Au regard de cette situation, des efforts supplémentaires doivent être consentis par l'ensemble des acteurs pour résorber ces gaps et améliorer les taux d'accès à l'assainissement afin de favoriser l'atteinte des cibles ODD.

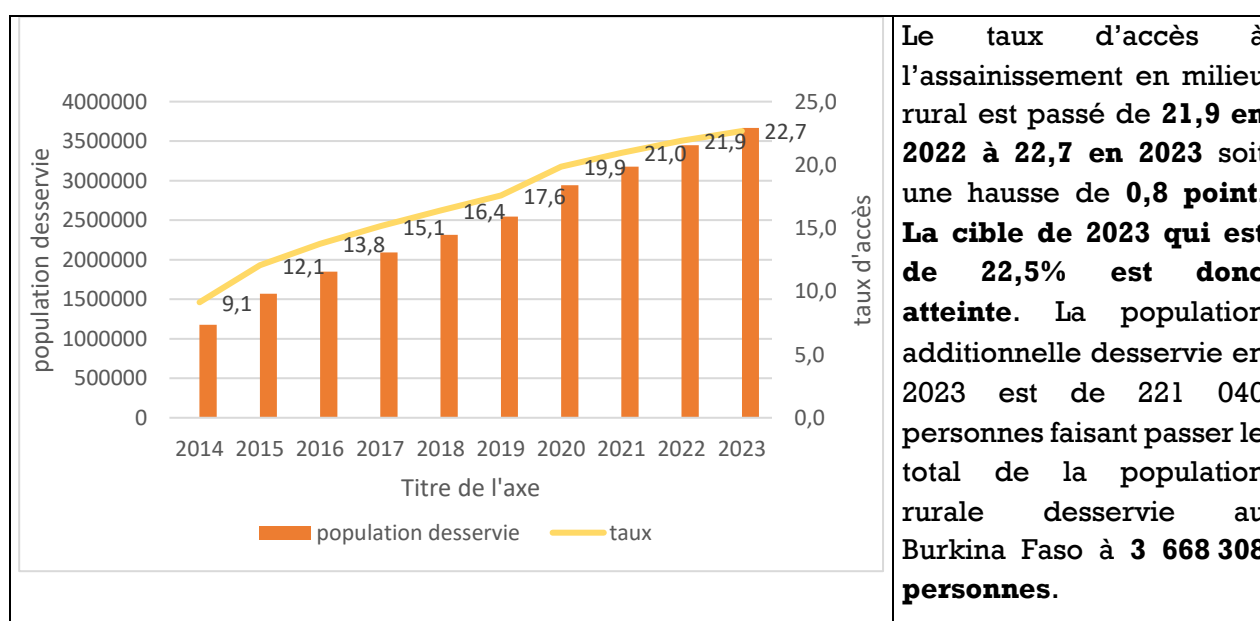Figure 2 : évolution du taux d'accès et population additionnelle desservie

Ce taux est passé de **9,1%** en 2014 à **22,7%** en 2023 soit une hausse de 13,6 point pourcentage en 10 ans


Source : BD INOA, DGAEUE 2023

Figure 3 : Situation de disponibilité de dispositif de lavage des mains (DLM)

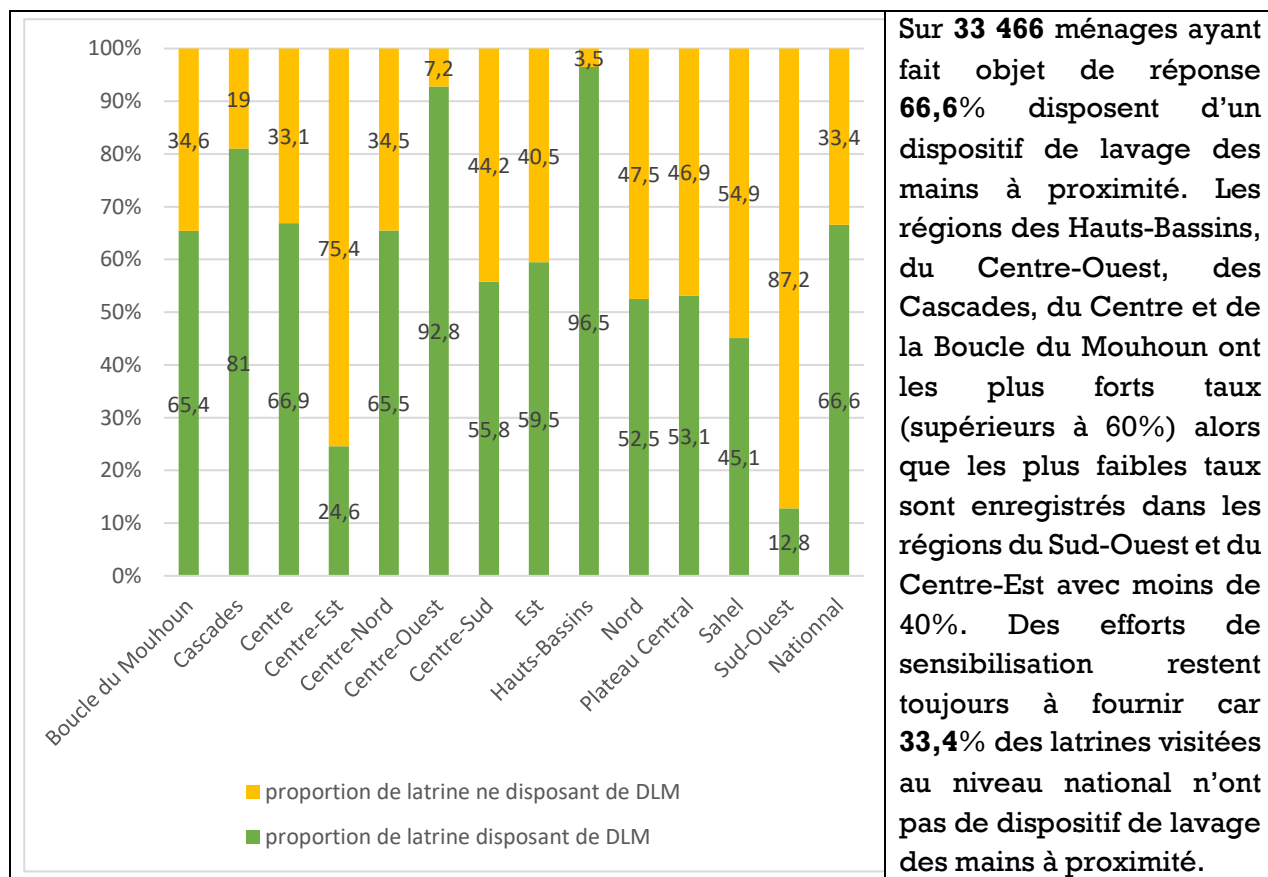


Source : BD INOA, DGAEUE 2023

Figure 4 : Situation de la pratique de lavage des mains par les ménages

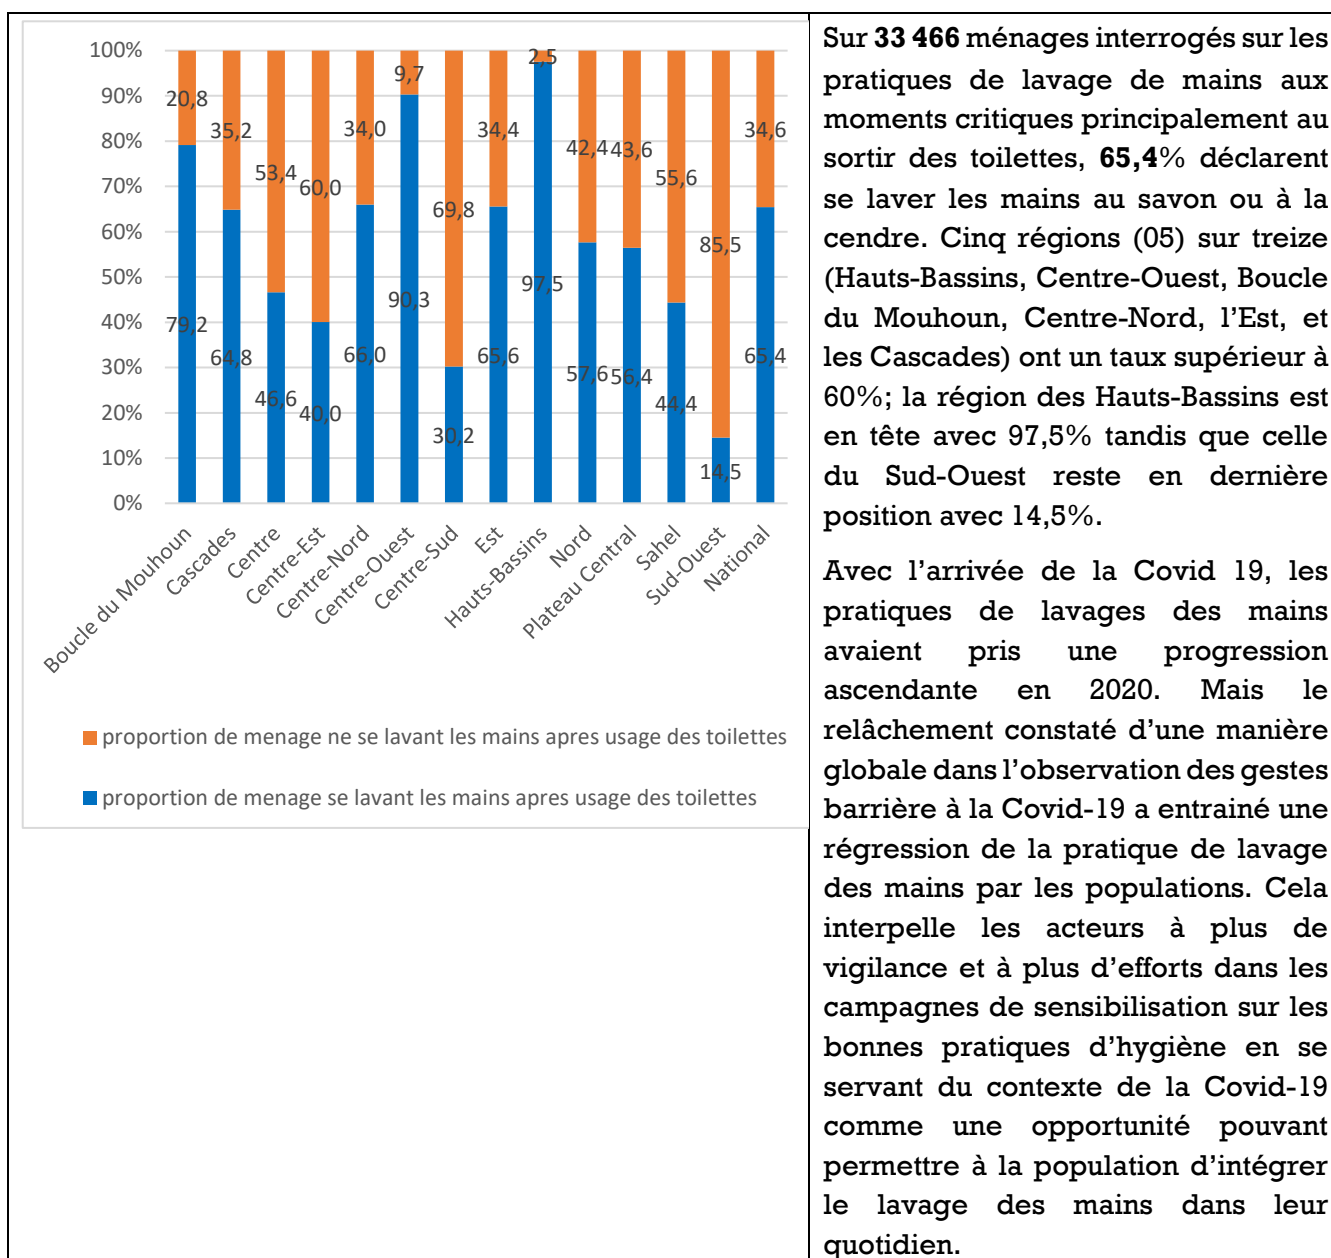

Source : BD INOA, DGAEUE 2023

Figure 5 : situation de l'entretien des latrines dans les ménages

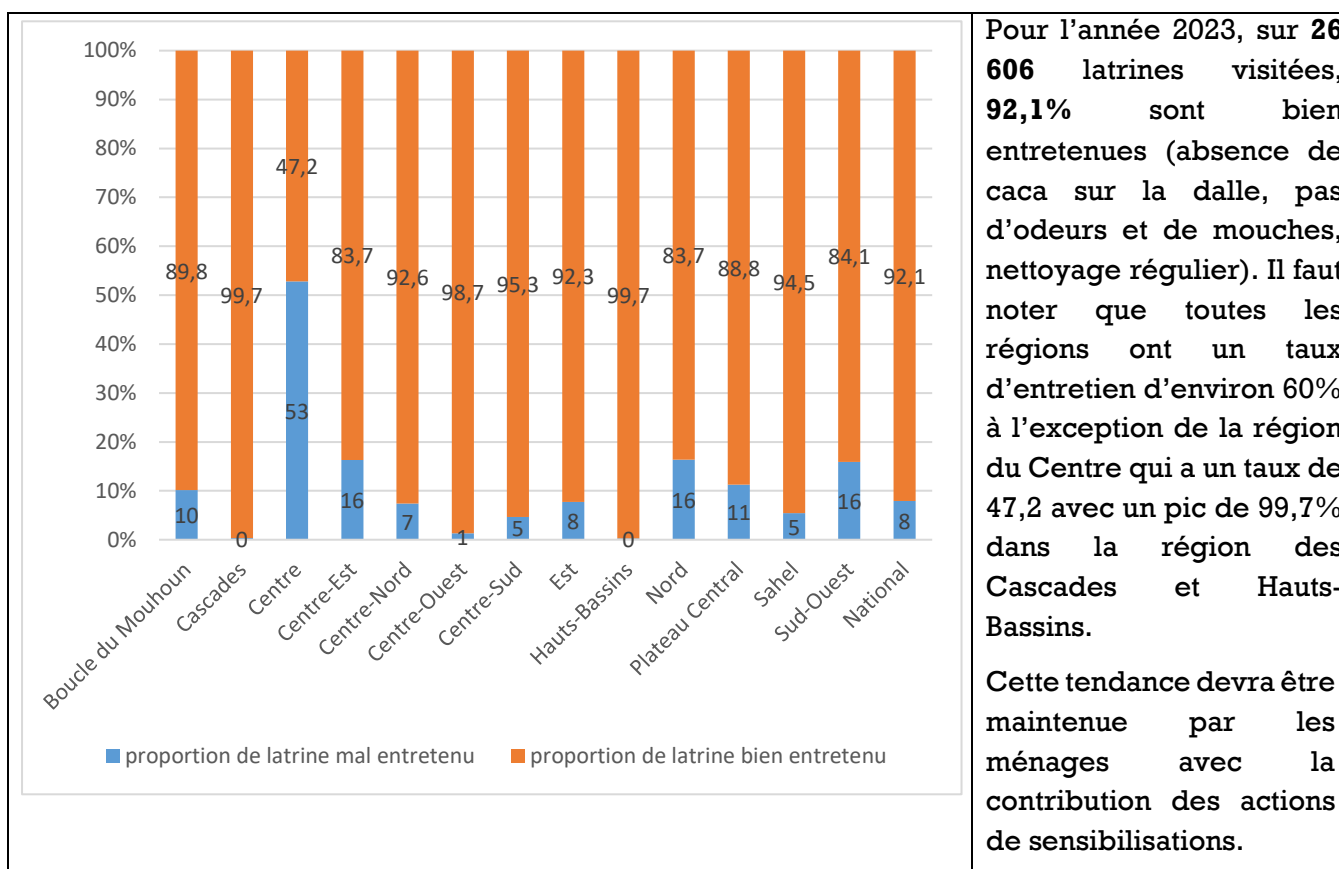

Source : BD INOA, DGAUE 2023

Tableau 79 : Proportion des latrines par acteur

Régions	Total (nombre de latrines réalisées)	Etat	Part Etat (%)	Autres acteurs (collectivités +ONG/AD)	Part autres acteurs (%)	Ménages	Part ménages (%)
Boucle du Mouhoun	1 855	382	20,6	1 108	59,7	365	19,7
Cascades	564	393	69,7	116	20,6	55	9,8
Centre	950	138	14,5	343	36,1	469	49,4
Centre-Est	1 165	651	55,9	350	30,0	164	14,1
Centre-Nord	2 256	80	3,5	1935	85,8	241	10,7
Centre-Ouest	6 294	2 381	37,8	409	6,5	3 504	55,7
Centre-Sud	2 193	1 898	86,5	255	11,6	40	1,8
Est	2 651	698	26,3	1885	71,1	68	2,6
Hauts-Bassins	672	378	56,3	201	29,9	93	13,8
Nord	1 395	467	33,5	726	52,0	202	14,5
Plateau Central	1 123	346	30,8	473	42,1	304	27,1
Sahel	568	259	45,6	305	53,7	4	0,7
Sud-Ouest	418	195	46,7	2	0,5	221	52,9
Total national	22 104	8 266	37,4	8 108	36,7	5 730	25,9

Source : BD INOA 2023

Sur un total de **22 104** latrines familiales réalisées (réhabilitations y compris), l'effort de l'Etat est de **37,4%** soit **8 266** latrines, un nombre inférieure à celui de 2022 qui était de **50,3%**. En ce qui concerne les autres acteurs (collectivités et ONG/AD), leur part de réalisations s'élève à **8 108** latrines soit **36,7%** du total annuel. Ce nombre est légèrement inférieur à celui de 2022 qui était de **9 493** latrines. Cela pourrait s'expliquer, d'une part par la situation sécuritaire qui a limité l'accès à certains sites de travaux et, d'autre part, par l'intervention de plusieurs acteurs uniquement dans l'humanitaire.

Les latrines non subventionnées (autoréalisations par les ménages) qui traduisent l'effort de la population sont au nombre de **5 730** soit **25,9%**. Ce taux est supérieur à celui de 2022 qui était de **14,5%**.

Dans un contexte d'amenuisement des financements, l'Etat et les ménages devront redoubler d'effort dans la mise en œuvre du programme en vue de déresponsabiliser progressivement les partenaires au développement dans l'optique de la pérennité et de la durabilité des interventions.

Pour ce qui est des ménages, des efforts doivent toujours être consentis dans la communication pour le changement de comportement des populations afin de susciter davantage les autoréalisations.

Tableau 80 : Situation de l'état de Fin de Défécation à l'Air Libre

Régions	Nombre de villages de la région (a)	Nombre de villages déclenchés	Nombre de villages déclarés FDAL (b)	Nombre de villages certifiés FDAL (c)	Taux de villages déclarés FDAL (b/a*100)	Taux de villages certifiés FDAL (c/a*100)
Boucle du Mouhoun	985	313	29	10	2,9	1,0
Cascades	291	169	4	1	1,4	0,3
Centre	188	44	0		0,0	0,0
Centre-Est	753	556	18	4	2,4	0,5
Centre-Nord	965	308	55	8	5,7	0,8
Centre-Ouest	595	378	320	237	53,8	39,8
Centre-Sud	541	198	29	22	5,4	4,1
Est	846	498	295	176	34,9	20,8
Hauts-Bassins	483	224	0		0,0	0,0
Nord	914	235	67	15	7,3	1,6
Plateau Central	581	171	53	1	9,1	0,2
Sahel	701	201	115	39	16,4	5,6
Sud-Ouest	1 066	86	8	5	0,8	0,5
Total national	8 909	3 381	992	517	11,1	5,8

Source : BD INOA, DGAUE 2023

Le taux de déclaration est passé de **8,6%** en 2022 à **11,1%** en 2023 soit une progression de 2,3 points pourcentage. Nonobstant cette légère hausse, la cible de déclaration FDAL fixée à **9%** est donc atteinte. Cependant, le taux de déclaration FDAL reste toujours faible au regard du nombre élevé de villages déclenchés (3381).

Quant à la certification, le taux est passé de **4,7%** en 2022 à **5,8%** en 2023 soit une progression de **1,1** point. La cible de **5%** est donc atteinte.

Les régions du Centre-Ouest, de l'Est et du Sahel ont les plus forts taux de déclaration et de certification FDAL.

Par ailleurs, les régions des Hauts-Bassins, et du Centre, n'ont toujours pas enregistré de villages ayant mis fin à la Défécation à l'Air Libre. Dans ces régions, plusieurs acteurs ont entamé le processus de l'abandon de la Défécation à l'Air Libre sans pour autant l'achever. Aussi, les acteurs ont plus mis l'accent ces dernières années sur la relance des villages abandonnés avant la certification. Il est nécessaire de poursuivre les sensibilisations et le suivi des communautés afin d'atteindre le statut FDAL des villages touchés par l'ATPC.

La province de la Sissili dans la région du Centre-Ouest a atteint le statut FDAL pour ce qui est du milieu rural. Cela démontre une avancée en termes de réussite de l'ATPC au Burina Faso et interpelle les autres acteurs à concentrer leurs efforts dans une zone d'intervention bien définie pour l'atteinte de meilleurs résultats et ceci à travers la mise en œuvre de l'approche commune définie dans le Plan d'Action 2021-2025 du PN-AEUE.

Tableau 81 : Taux d'équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural

Regions	Ecoles			Centre de santé		
	Nombre d'écoles (a)	Nombre d'écoles équipées de latrines fonctionnelles (b)	Taux (%) (b/a)	Nombre de CSPS (c)	Nombre de CSPS équipés de latrines fonctionnelles (d)	Taux (%) (d/c)
Boucle du Mouhoun	504	426	84,5	172	105	61
Cascades	495	427	86,3	103	99	96,1
Centre	526	473	89,9	56	54	96,4
Centre-Est	873	755	86,5	202	197	90
Centre-Nord	653	554	84,8	105	105	100,0
Centre-Ouest	1 147	1 008	87,9	233	231	99,14
Centre-Sud	645	559	86,7	152	152	100
Est	328	275	83,8	154	134	87,0
Hauts-Bassins	826	669	81	180	170	94,4
Nord	725	546	75,3	207	178	86,2
Plateau Central	750	704	93,9	164	141	85,9
Sahel	75	62	82,7	386	296	76,7
Sud-Ouest	772	603	78,1	139	124	89,2
Total national	8 319	7 061	84,9	2 253	1 986	88,1

Source : Rapports-bilans régionaux 2023

Le taux d'équipement des écoles a connu une légère baisse de 0,2 points pourcentage, passant de **85,1%** en 2022 à **84,9%** en 2023 pour une cible de **85,9%** ; la cible n'est donc pas atteinte. Des efforts doivent donc être fournis par les acteurs pour améliorer le taux. Les taux varient de 75,3% dans la région du Nord à 93,9% dans la région du Plateau-Central et comporte d'énormes disparités à cause de la fermeture dans certaines localités d'écoles pour raisons d'insécurité.

Quant aux CSPS, le taux d'équipement a régressé de 6,4 points pourcentage, passant de **94,5%** en 2022 à **88,1%** en 2023. La cible de 2023 fixée à **91%** n'est donc pas atteinte. Cela pourrait s'expliquer par les différentes pannes dues à la mauvaise gestion des latrines.

Des efforts sont à fournir par les acteurs pour accompagner le développement et la mise en place de mécanismes de gestion adéquats des latrines dans les institutions (écoles et centres de santé) et les lieux publics.

Tableau 82 : Situation de l'accessibilité des latrines aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

	Latrines institutionnelles et publiques en 2021			Latrines institutionnelles et publiques en 2022			Latrines institutionnelles et publiques en 2023		
Régions	Nombre total de blocs	Nombre total de cabines pour handicapés	Taux d'équipement de blocs en cabines pour handicapés (%)	Nombre total de blocs	Nombre total de cabines pour handicapés	Taux d'équipement de blocs en cabines pour handicapés (%)	Nombre total de blocs	Nombre total de cabines pour handicapés	Taux d'équipement de blocs en cabines pour handicapés (%)
Boucle du Mouhoun	149	10	6,7	102	19	18,6	140	70	50,0
Cascades	52	4	7,7	31	11	35,5	39	11	28,2
Centre	99	32	32,3	106	27	25,5	64	8	12,5
Centre-Est	86	8	9,3	47	10	21,3	78	11	14,1
Centre-Nord	190	37	19,5	55	10	18,2	187	98	52,4
Centre-Ouest	108	5	4,6	121	12	9,9	174	46	26,4
Centre-Sud	72	11	15,3	61	12	19,7	67	17	25,4
Est	161	49	30,4	21	3	14,3	110	51	46,4
Hauts-Bassins	83	1	1,2	50	6	12,0	43	3	7,0
Nord	108	26	24,1	46	4	8,7	58	6	10,3
Plateau Central	79	5	6,3	58	7	12,1	85	5	5,9
Sahel	23	8	34,8	20	6	30,0	55	21	38,2
Sud-Ouest	74	4	5,4	44	11	25,0	58	1	1,7
Total national	1 284	200	15,6	762	138	18,1	1 158	348	30,1

Source : DGA/EUE, 2023

Ceci est un aperçu de la situation de l'équipement des blocs de latrines institutionnelles et publiques en cabines pour PMR de 2021 à 2023 donc non exhaustive si on considère l'assainissement institutionnel et public dans son ensemble. Cette situation nous donne une idée sur la prise en compte des PMR dans la réalisation des ouvrages d'assainissement institutionnel et public. On constate une évolution croissante des ouvrages accordés au PMR de 2021 à 2023. Cela témoigne de l'intégration continue des PMR dans la réalisation des ouvrages d'assainissement.

Tableau 83: synthèse des réalisations en milieu rural

Régions	Latrines institutionnelles et publiques		Latrines familiales		Puisards domestiques	
	Realisations 2023	Cumul des réalisations 2021-2022	Realisations 2023	Cumul des réalisations 2021-2022	Realisations 2023	Cumul des réalisations 2021-2022
Boucle du Mouhoun	140	251	1 855	6 260	51	603
Cascades	39	83	564	3 693	1	17
Centre	64	205	950	2 588	1	293
Centre-Est	78	133	1 165	3 789	215	5
Centre-Nord	187	245	2 256	3 223	582	492
Centre-Ouest	174	229	6 294	6 350	3	2 106
Centre-Sud	67	133	2 193	5 315	48	755
Est	110	182	2 651	4 831	57	831
Hauts-Bassins	43	133	672	4 321	5	30
Nord	58	154	1 395	2 211	758	102
Plateau Central	85	137	1 123	1 401	11	79
Sahel	55	43	568	1 897	0	0
Sud-Ouest	58	118	418	4 658	51	386
Total national	1 158	2 046	22 104	50 537	1 783	5 699

Source : BD INOA 2023

En milieu rural, on enregistre une réalisation de **22 104** latrines familiales pour l'année 2023 et **50 537** sur la période 2021-2022.

Pour ce qui est des puisards on a **1 783** réalisés en 2023 et **5 699** pour la période 2021-2022.

En ce qui concerne les latrines dans les institutions et lieux publics ce sont **1 158** réalisations en 2023 et **2 046** durant la période 2021-2022.

7.2 Assainissement en milieu urbain

Tableau 84 : Taux d'accès 2023 par région en milieu urbain

Région	Communes concernés	Réalisations 2023	Cumul des réalisations 2021-2022	Population totale desservie 2023	Taux (%)
Boucle du Mouhoun	Dédougou, Toma, Tougan, Boromo, Nouna, Solenzo	401	1 321	91 731	38,8
Cascades	Banfara, Bérégadou, Niangoloko, Sindou	432	315	55 867	29,0
Centre	Ouagadougou, Saaba, Pabré	2 126	15 492	1 551 824	47,3
Centre-Est	Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga	484	1 449	95 758	26,9
Centre-Nord	Kaya, Kongoussi, Boulsa	560	1 418	82 844	33,1
Centre-Ouest	Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Fara, Poura	666	856	138 867	38,0
Centre-Sud	Manga, Kombissiri, Pô	0	-	29 665	32,3
Est	Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama	354	623	65 615	37,5
Hauts-Bassins	Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé	1 410	5 168	470 331	38,4
Nord	Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy	626	1 461	116 955	38,6
Plateau-Central	Ziniare, Lombila, Boussé, Zorgho	81	413	26 913	23,2
Sahel	Dori, Djibo, Gorom-Gorom (+ Arbinda), Sebba	0	-	41 325	19,5
Sud-Ouest	Diébougou, Gaoua	0	120	41 446	30,9
Total national		7 063	28 636	2 814 038	40,5

Source : ONEA 2023

En 2023, on a pu enregistrer un taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain de **40,5%**, légèrement inférieur à celui de 2022 qui était de **40,8%** et la cible de 2023 fixé à 41% n'est pas atteinte. Cette contre-performance s'explique entre autres par les retards de paiement des factures de certains artisans préfabricants, la suspension ou le ralentissement des activités dans certaines villes en raison de la situation sécuritaire, la suspension des activités dans les villes couvertes par le PAEA de juin 2022 à mars 2023 et de juin 2023 à Octobre 2023, la diminution du pouvoir

d'achat des ménages en raison de la situation sécuritaire.

Figure 6 : Evolution du taux d'accès en milieu urbain

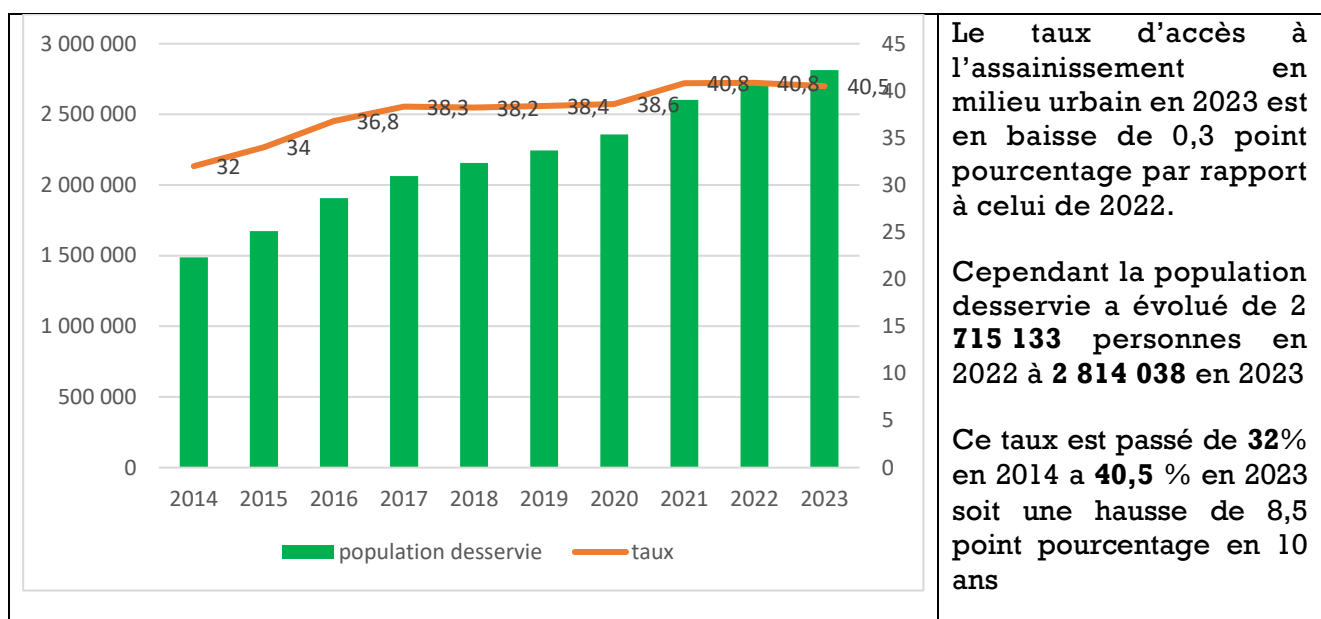


Tableau 85: Récapitulatif des réalisations physiques en assainissement en milieu urbain

Intitulés	PSA (Nombre)	Latrines familiales (Nombre)	Puisards (Nbre)	Latrines institutionnelles et publiques (Nombre)	STEP (Nbre)	STBV (Nbre)	Extension réseau collectif (Km)	Raccordement réseau collectif (Nbre)
Realisations 2023	01	7 063	4 277	162	0	0	0	16
Cumul des réalisations 2021-2022	04	28 636	20 173	550	0	0	0	34

Source : ONEA 2023

En 2023, l'ONEA a réalisé au total 1 Plan Stratégique d'Assainissement (PSA), 7 063 latrines familiales, 4 277 puisards, 162 latrines institutionnelle et publiques et 16 raccordements au réseau collectif. Il n'y a pas eu de réalisation de STBV ni de STEP et d'extension de réseau collectif.

7.3 Assainissement national


Tableau 86 : Récapitulatif des réalisations sur le plan national

Ouvrages	Réalisation 2023			Cumul réalisations (2021-2022)		
	Milieu rural	Milieu urbain	National	Milieu rural	Milieu urbain	National
Latrines familiales	22 104	7 063	29 167	49 083	28636	77 719
Latrines institutionnelles et publiques	1 158	162	1 320	2046	477	2 523
Puisards	1 783	4 277	6 060	5 699	20173	25 872
Site de dépotage et de traitement des boues de vidange (STBV)	0	0	0	0	0	0
STEP	0	0	0	0	0	0
Quantité de boues traitées (m³)	0	501 043	501 043	0	850 023	850 023

Source : BD INOA 2023, ONEA 2023

Sur le plan national la réalisation de **29 167** latrines familiales en 2023 a fait augmenter le nombre total de latrines familiales réalisées à **106 886** sur la période 2021-2023. Le nombre total de latrines institutionnelles et publiques sur la période 2021-2023 donne au total **3 843** blocs de latrines tandis que celui des puisards a atteint **31 932**.


Figure 7: Taux globaux de l'assainissement

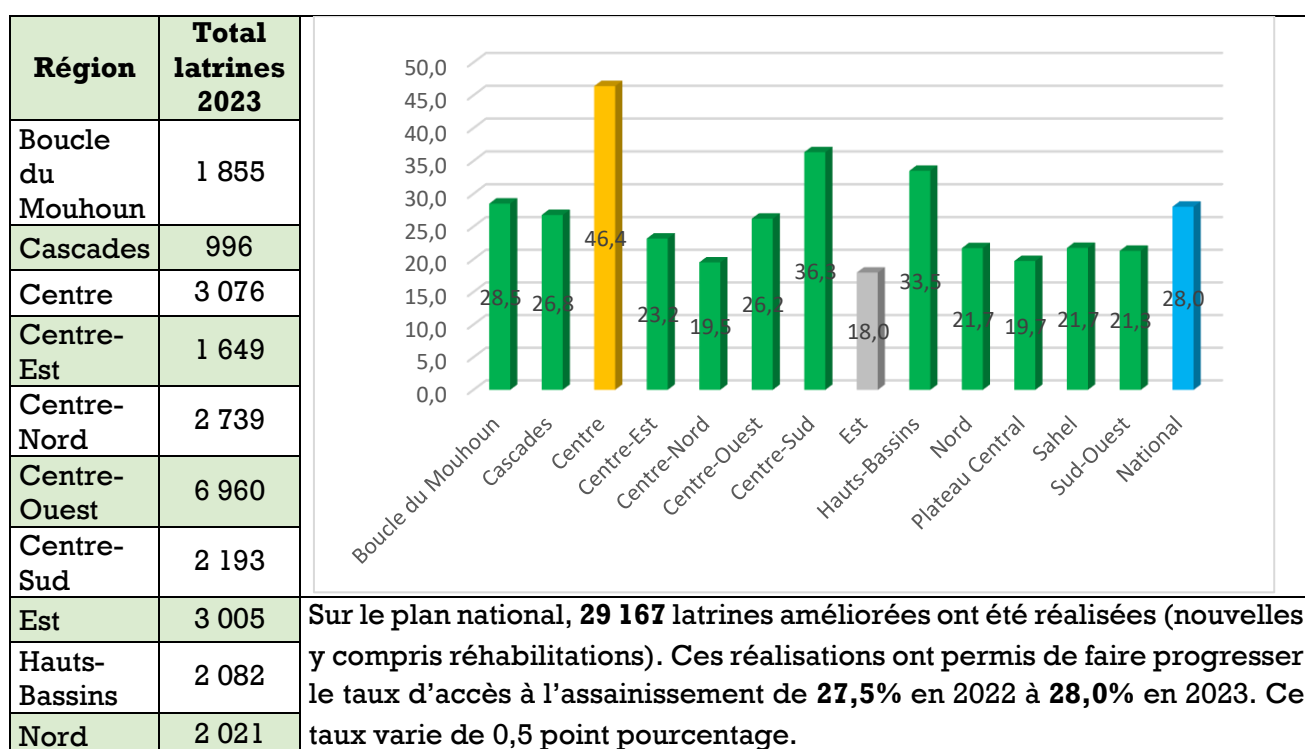

Plateau Central	1 204	Les régions du Centre, du centre-sud, des Hauts-bassin et de la Boucle du Mouhoun ont les taux les plus élevés. Le plus faible taux a été enregistré dans la région de l'Est (18%)
Sahel	568	
Sud-Ouest	418	
Total National	29 167	

Source : BD INOA 2023, ONEA 2023

Figure 8: Evolution du taux d'accès national

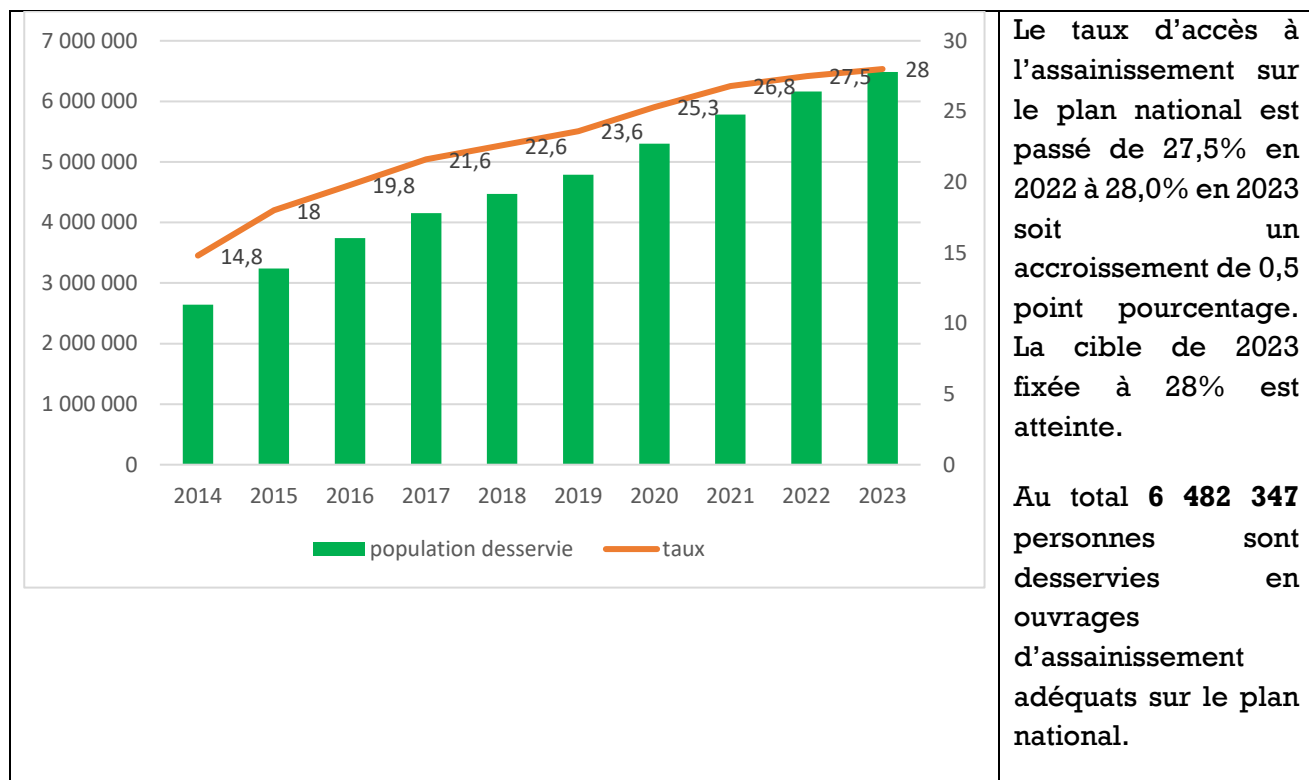

Source : DGAEUE 2023

7.4 Situation des indicateurs de performance du PN-AEUE

Tableau 87 : Indicateurs de performance du PN-AEUE

Indicateur	Unité	Réalisation 2022	Cible 2023	Réalisation 2023	Commentaire
Taux d'accès national à l'assainissement	%	27,5	28	28	Atteint
Taux d'accès à l'assainissement en milieu rural	%	21,9	22,5	22,7	Atteint
Taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain	%	40,8	41	40,5	Non atteint
Nombre de villages touchés par le	Nombre	239	150	198	Atteint

Indicateur	Unité	Réalisation 2022	Cible 2023	Réalisation 2023	Commentaire
déclenchement (annuellement)					
Proportion de villages déclarés FDAL à partir de 2021	%	8,6	9	11,1	Atteint
Proportion de villages certifiés FDAL	%	85,1	5	5,8	Atteint
Taux d'équipement des écoles en latrine	%	94,5	85,5	84,9	Non Atteint
Taux d'équipement des centres de santé en latrine	%	0	91	88,1	Non atteint
Nombre de sites de dépotages réalisés	Nombre	0	2	0	Non atteint

Source : DGAUE 2023

8 PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS

8.1 Principaux freins

Tableau 88 : Difficultés et propositions de solutions

Difficultés	Propositions de solutions	Responsables
Insuffisance de ressources humaines qualifiées dans les communes	Renforcer les compétences et le personnel du service en charge du volet assainissement de certaines communes.	Partenaires ; DREA, communes
Difficultés d'accès à certaines localités des régions liées au contexte sécuritaire	• Orienter les réalisations/ réhabilitations des ouvrages d'assainissement vers les sites plus accessibles et dans les familles d'accueil des déplacés internes • Utilisation de mécanismes de suivi à distance • Utilisation des relais communautaires et associations locales	DREA ; Partenaires, DGAEUE
La défaillance et le manque de professionnalisme de certains prestataires	Sanctionner les entreprises défaillantes	MEEA
La faible mobilisation de la part contributive des ménages pour la réalisation des infrastructures d'assainissement	Poursuivre les actions de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement au niveau des ménages	La DREA, les collectivités et les Partenaires (ONG, associations de mise en œuvre, projets et programmes...).
Baisse des financements alloués aux acteurs pour la mise en œuvre du PN-AEUE	Effectuer un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour accroître les financements dans le secteur	MEEA
La multiplicité des approches non coordonnées liées à la subvention des latrines familiales	Harmoniser les approches	DGAEUE, DREA et les partenaires.
Non-respect des documents stratégiques en matière d'assainissement dans l'intervention de certains acteurs	• Organiser des ateliers de coordination ; • Vulgariser les différents documents méthodologiques	DGAEUE

Difficultés	Propositions de solutions	Responsables
Faible responsabilité des bénéficiaires d'ouvrages d'assainissement institutionnel dans la gestion des infrastructures	Mettre l'accent sur le rôle des bénéficiaires dans la gestion des ouvrages	Communes, services techniques déconcentrés concernés, structures de mise en œuvre, DGAEUE
Difficultés de mobilisation des ressources financières par les collectivités en faveur de l'assainissement	Former et accompagner les collectivités en matière de stratégies de mobilisation des ressources financières et travailler en intercommunalité.	MEEA, DREA, DGAEUE et Communes
Faible synergie d'action entre les acteurs du domaine de l'Assainissement des Eaux Usées et Excreta	Exhorter les différents acteurs du domaine au partage de l'information pour une meilleure prise en charge du secteur de l'AEUE	Parties prenantes
Faible implication des DREA pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage communale par les communes (fonds transférés)	Impliquer les DREA dans toute la procédure d'exécution des fonds	Mairies
Retard dans l'exécution des travaux	Anticiper la passation des marchés ; Renforcer le suivi ; Reprogrammer l'ensemble des travaux concernés en 2024 et diligenter leur exécution.	Toute structure Concernée
Lourdeur/lenteur dans les procédures de passation des marchés occasionnant la non atteinte des résultats attendus en matière de réalisation des ouvrages	Accélérer le traitement des dossiers	Contrôle financier, DMP

Source : DGAEUE, DREA

9 RECOMMANDATIONS

Les propositions de recommandations sont les suivantes :

- **A l'endroit du Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement :**
 - Organiser des journées de programmation avec les acteurs de l'AEUE au niveau Communal ;
 - Inviter à poursuivre/instaurer l'organisation de cadres de concertation régionaux sur la mise en œuvre de l'ATPC ;
 - Renforcer les capacités des collectivités territoriales pour la mobilisation des ressources financières en faveur de l'assainissement ;
- **A l'endroit des communes :**
 - Impliquer davantage les DREA dans l'exécution des fonds transférés ;
 - Mettre en place un mécanisme de gestion des ouvrages d'assainissement dans chaque institution ou lieu public en vue d'assurer leur durabilité ;
 - S'investir davantage dans l'achèvement des latrines semi-finies.
- **A l'endroit des partenaires techniques et financiers (PTF) :**
 - Impliquer les services techniques dans tout le processus de montage des projets ;
 - Travailler en synergie d'action avec les services techniques dans la mise en œuvre et le suivi des activités pour permettre un meilleur suivi et une bonne capitalisation des données.

10 CONCLUSION

En milieu rural, pour l'année 2023, le bilan physique des réalisations des ouvrages d'assainissement est assez satisfaisant. On note la réalisation de 22 104 latrines familiales (nouvelles réalisations et réhabilitations), 1 158 latrines institutionnelles et publiques ainsi que la réalisation de 1 783 puisards. Ces réalisations ont permis de desservir 221 040 personnes supplémentaires portant le taux d'accès à l'assainissement à 22,7% pour une cible de 22,5%.

Quant à l'éradication de la Défécation à l'Air Libre, 181 villages supplémentaires ont été déclarés FDAL dont 3 hors programmation, portant ainsi le nombre de villages déclaré FDAL à **992** soit un taux de déclaration FDAL de **11,1%** pour une cible de 9%. En outre, 103 nouveaux villages ont été certifiés FDAL dont 21 en hors programmation, augmentant le nombre total de villages certifiés à **517** soit un taux de certification de **5,8%** pour une cible de 5%.

Plusieurs actions de sensibilisations de proximité ont permis de toucher **439 929** personnes dans les ménages dont **48,8 % (214 824)** dont **414 918** de femmes et filles, 473 écoles, 38 centres de santé et 108 lieux publics.

En milieu urbain, le nombre de latrines familiales réalisées est de **7 063**, celui des latrines institutionnelles et publiques est de 162 et **4277** puisards. Ces réalisations ont permis de desservir **70 630** personnes additionnelles. Le taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain est de **40,5%**, légèrement inférieur à celui de 2022 qui était de 40,8% et la cible de 2023 fixé à 41% n'est donc pas atteinte.

Sur le plan national, au total **29 167** latrines familiales ont été réalisées, **1320** latrines institutionnelles et publiques et **6 060** puisards. Ces réalisations ont permis de porter le taux d'accès national à l'assainissement à **28%** contre un taux de **27,5%** en 2022. La cible de 2023 fixée à **28%** est donc atteinte.

La population totale desservie en assainissement au plan national est de **6 482 347** personnes sur une population totale de **22 384 167**.

Il faut noter que la mise en œuvre des activités s'est déroulée dans un contexte national particulièrement difficile marqué par la situation sécuritaire du pays notamment l'intensification des efforts dans la lutte pour la reconquête du territoire ayant occasionné des restrictions et/ou des régulations budgétaires de l'Etat

ANNEXES

Tableau 89 : Evolution du taux d'accès par province

Régions	Provinces	Population urbaine projetée	Population rurale projetée	Population totale projetée	Population desservie urbaine	Population desservie rurale	Population totale desservie	Taux d'accès urbain	Taux d'accès rural	Taux d'accès national
BOUCLE DU MOUHOUN	BALE	57 708	269 708	327 415	25 745	174 780	200 525	44,6	64,8	61,2
BOUCLE DU MOUHOUN	BANWA	27 907	347 371	375 278	4 616	72 795	77 411	16,5	21,0	20,6
BOUCLE DU MOUHOUN	KOSSI	36 455	349 989	386 445	16 845	68 727	85 572	46,2	19,6	22,1
BOUCLE DU MOUHOUN	MOUHOUN	74 034	355 145	429 179	28 304	88 643	116 947	38,2	25,0	27,2
BOUCLE DU MOUHOUN	NAYALA	17 095	227 812	244 906	3 691	31 299	34 990	21,6	13,7	14,3
BOUCLE DU MOUHOUN	SOUROU	30 122	278 890	309 012	17 425	60 643	78 068	57,8	21,7	25,3
BOUCLE DU MOUHOUN		236 151	1 828 915	2 065 066	91 731	496 887	588 618	38,8	27,2	28,5
CASCADES	COMOE	184 301	538 060	722 361	54 455	118 639	173 094	29,5	22,0	24,0
CASCADES	LERABA	8 282	193 540	201 822	1 412	72 889	74 301	17,1	37,7	36,8
CASCADES		192 583	731 600	924 183	55 867	191 528	247 395	29,0	26,2	26,8
CENTRE	KADIOGO	3 278 006	337 877	3 615 883	1 551 824	125 950	1 677 774	47,3	37,3	46,4
CENTRE-EST	BOULGOU	170 926	641 816	812 742	73 081	103 097	176 178	42,8	16,1	21,7
CENTRE-EST	KOULPELOGO	14 661	397 313	411 974	1 759	96 984	98 743	12,0	24,4	24,0
CENTRE-EST	KOURITTENGA	169 984	368 986	538 969	20 918	112 880	133 798	12,3	30,6	24,8
CENTRE-EST		355 570	1 408 115	1 763 685	95 758	312 961	408 720	26,9	22,2	23,2
CENTRE-NORD	BAM	67 678	492 068	559 746	8 121	102 508	110 630	12,0	20,8	19,8
CENTRE-NORD	NAMENTENGA	26 541	561 459	588 000	18 625	108 337	126 962	70,2	19,3	21,6
CENTRE-NORD	SANMATENGA	156 399	832 750	989 149	56 098	123 309	179 407	35,9	14,8	18,1
CENTRE-NORD		250 618	1 886 277	2 136 895	82 844	334 154	416 998	33,1	17,7	19,5
CENTRE-OUEST	BOULKIEMDE	210 181	557 762	767 944	74 132	140 159	214 291	35,3	25,1	27,9

Régions	Provinces	Population urbaine projetée	Population rurale projetée	Population totale projetée	Population desservie urbaine	Population desservie rurale	Population totale desservie	Taux d'accès urbain	Taux d'accès rural	Taux d'accès national
CENTRE-OUEST	SANGUIE	59 073	370 712	429 785	23 599	81 492	105 091	39,9	22,0	24,5
CENTRE-OUEST	SISSILI	63 368	326 909	390 277	36 484	64 343	100 827	57,6	19,7	25,8
CENTRE-OUEST	ZIRO	33 189	235 553	268 742	4 653	61 833	66 485	14,0	26,2	24,7
CENTRE-OUEST		365 811	1 490 936	1 856 748	138 867	347 827	486 694	38,0	23,3	26,2
CENTRE-SUD	BAZEGA	30 421	265 903	296 325	12 841	117 641	130 481	42,2	44,2	44,0
CENTRE-SUD	NAHOURI	29 349	189 485	218 834	3 702	45 415	49 117	12,6	24,0	22,4
CENTRE-SUD	ZOUNDWEOGO	32 018	300 955	332 974	13 122	115 405	128 527	41,0	38,3	38,6
CENTRE-SUD		91 788	756 344	848 132	29 665	278 461	308 126	32,3	36,8	36,3
EST	GNAGNA	23 970	757 475	781 445	2 876	177 704	180 580	12,0	23,5	23,1
EST	GOURMA	86 982	401 351	488 333	55 068	74 560	129 628	63,3	18,6	26,5
EST	KOMANDJARI	20 119	98 390	118 509	2 414	11 557	13 971	12,0	11,7	11,8
EST	KOMPIENGA	25 068	116 854	141 923	3 008	24 566	27 574	12,0	21,0	19,4
EST	TAPOA	18 739	677 082	695 821	2 249	45 600	47 849	12,0	6,7	6,9
EST		174 879	2 051 153	2 226 032	65 615	333 987	399 603	37,5	16,3	18,0
HAUTS-BASSINS	HOUET	1 076 141	664 800	1 740 941	421 501	160 538	582 039	39,2	24,1	33,4
HAUTS-BASSINS	KENEDOUGOU	37 318	408 897	446 215	7 038	130 953	137 990	18,9	32,0	30,9
HAUTS-BASSINS	TUY	111 214	264 187	375 401	41 792	96 711	138 503	37,6	36,6	36,9
HAUTS-BASSINS		1 224 673	1 337 884	2 562 557	470 331	388 201	858 532	38,4	29,0	33,5
NORD	LOROUM	64 122	150 581	214 703	16 925	21 816	38 741	26,4	14,5	18,0
NORD	PASSORÉ	45 580	456 394	501 974	23 460	82 553	106 012	51,5	18,1	21,1
NORD	YATENGA	146 765	767 315	914 081	51 302	145 363	196 665	35,0	18,9	21,5
NORD	ZONDOMA	46 659	221 049	267 707	25 269	45 272	70 541	54,2	20,5	26,3
NORD		303 127	1 595 339	1 898 466	116 955	295 004	411 959	38,6	18,5	21,7
PLATEAU-CENTRAL	GANZOURGOU	41 900	503 995	545 896	5 438	74 955	80 393	13,0	14,9	14,7

Régions	Provinces	Population urbaine projetée	Population rurale projetée	Population totale projetée	Population desservie urbaine	Population desservie rurale	Population totale desservie	Taux d'accès urbain	Taux d'accès rural	Taux d'accès national
PLATEAU-CENTRAL	KOURWEOGO	28 786	169 651	198 437	8 634	37 069	45 703	30,0	21,8	23,0
PLATEAU-CENTRAL	OUBRITENGA	45 363	300 236	345 599	12 841	76 153	88 994	28,3	25,4	25,8
PLATEAU-CENTRAL		116 050	973 882	1 089 932	26 913	188 176	215 090	23,2	19,3	19,7
SAHEL	OUDALAN	10 036	147 309	157 346	1 204	26 012	27 216	12,0	17,7	17,3
SAHEL	SENO	59 338	390 179	449 517	22 991	63 721	86 711	38,7	16,3	19,3
SAHEL	SOUM	128 959	238 710	367 669	15 475	85 762	101 237	12,0	35,9	27,5
SAHEL	YAGHA	13 794	163 272	177 065	1 655	33 470	35 125	12,0	20,5	19,8
SAHEL		212 127	939 470	1 151 597	41 325	208 963	250 289	19,5	22,2	21,7
SUD-OUEST	BOUGOURIBA	28 690	144 980	173 670	12 213	43 101	55 314	42,6	29,7	31,9
SUD-OUEST	IOBA	29 624	265 039	294 662	6 894	43 515	50 409	23,3	16,4	17,1
SUD-OUEST	NOUMBIEL	21 495	89 056	110 551	3 844	31 316	35 160	17,9	35,2	31,8
SUD-OUEST	PONI	54 297	342 255	396 552	18 495	48 277	66 772	34,1	14,1	16,8
SUD-OUEST		134 105	841 330	975 435	41 446	166 209	207 655	30,9	19,8	21,3
BURKINA FASO		6 942 659	16 179 123	23 121 782	2 814 038	3 668 308	6 482 347	40,5	22,7	28,0

Tableau 90: liste indicative des structures intervenants dans la mise en œuvre du PN-AEUE

Directions	Unités de Gestion de Projets	Opérateurs étatiques	Opérateurs non étatiques
Direction Générale de l'Assainissement des Eaux Usées et Excreta (DGAEUE) Directions Régionales de l'Eau et de l'Assainissement (DREA) Directions Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement (DPEA)	Projet de Promotion de l' Hygiène, de l'Eau Potable, de l'Assainissement et de renforcement de résilience de la population à la covid 19 et au changement climatique en milieu rural dans 08 provinces (PHEPA-8P)	ONEA, communes	WaterAid ; Eau vive ; APS ; SNV ; IRC ; IRC (rescue) Helen Keller International (HKI) ; Plan Burkina; CADES; CRS; SOS-SAHEL; Helvetas; Croix Rouge; WHH Action Contre la Faim (ACF) ; OXFAM ; Conseil Danois pour les réfugiés (DRC); Solidarité International (SI) ; ACTED ; IEDA Relief ; SOLIDEV ; Winrock Terre des Hommes AVIF Etc.
